

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分
土地新增工程填地料源環境影響差異分析」

施工期間環境監測報告

102年第2季(期間：102年4月~102年6月)

開發單位：經濟部工業局

執行監測單位：創迅科技股份有限公司

提送日期：中華民國102年6月6日

目 錄

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告

102年第2季(期間：102年4月~102年6月)

目錄

頁次

前言

第一章、監測內容概述-----	1-1
1.1 工程進度-----	1-1
1.2 監測情形概述-----	1-3
1.3 監測計畫概述-----	1-3
1.4 監測位置-----	1-5
1.5 品保/品管作業措施概要-----	1-6
1.5.1 現場採樣之品保/品管-----	1-6
1.5.2 分析工作之品保/品管-----	1-8
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率-----	1-8
1.5.4 分析項目之檢測方法-----	1-13
1.5.5 數據處理原則-----	1-14
第二章、監測結果數據分析-----	2-1
2.1 氣象及空氣品質-----	2-1
2.2 海域水質-----	2-6
第三章、檢討與建議-----	3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策-----	3-1
3.2 建議事項-----	3-6
附錄一、檢測執行單位之認證資料	
附錄二、採樣與分析方法	
附錄三、品保/品管查核記錄及原始數據	
附錄四、監測照片	
附錄五、歷次環保機關審查意見及辦理情形說明對照表	
A5.1 101 年第 2~4 季彰化縣環境保護局審查意見暨回覆辦理情說明(102.03.27)	
A5.2 102 年第 1 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理情說明(102.06.05)	

表目錄

頁次

表 1.1-1	輸排灰設備工程預定工程進度表-----	1-1
表 1.1-2	土建工程預定工程進度表-----	1-2
表 1.2-1	監測結果概述-----	1-3
表 1.3-1	彰濱工業區線西西 3 區施工期間環境監測計畫-----	1-4
表 1.5.1-1	採樣作業準則-----	1-7
表 1.5.1-2	空氣品質採樣至運輸過程中注意事項-----	1-7
表 1.5.1-3	海域水質採樣至運輸過程中注意事項-----	1-7
表 1.5.3-1	儀器維修校正情形(1/4)-----	1-9
表 1.5.3-1	儀器維修校正情形(2/4)-----	1-10
表 1.5.3-1	儀器維修校正情形(3/4)-----	1-11
表 1.5.3-1	儀器維修校正情形(4/4)-----	1-12
表 1.5.4-1	空氣品質檢測方法儀器偵測極限表-----	1-13
表 1.5.4-2	海域水質檢測方法儀器偵測極限表-----	1-13
表 2.1-1	空氣品質監測調查綜合成果-----	2-2
表 2.2-1	海域水質監測成果-----	2-7
表 3.1-1	空氣品質本季與上季監測成果比較-----	3-2
表 3.1-2	海域水質各測站本季、上季與彰濱工業區監測成果比較-----	3-4
表 3.1-3	上次之異常狀況及處理情形-----	3-5
表 3.1-4	本次監測之異常狀況及處理情形-----	3-6

❧ 圖目錄 ❧

頁次

圖 1.4-1	施工期間環境監測位置圖 -----	1-5
圖 1.5.1-1	採樣作業流程圖 -----	1-6
圖 1.5.2-1	品保/品管作業流程圖 -----	1-8
圖 2.1-1	總懸浮微粒 24 小時值監測成果彙整 -----	2-3
圖 2.1-2	粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒日平均值監測成果彙整 -----	2-3
圖 2.1-3	二氧化氮小時平均最大值監測成果彙整 -----	2-3
圖 2.1-4	二氧化硫日平均值監測成果彙整 -----	2-4
圖 2.1-5	二氧化硫小時平均最大值監測成果彙整 -----	2-4
圖 2.1-6	一氧化碳小時平均最大值監測成果彙整 -----	2-4
圖 2.1-7	一氧化碳 8 小時平均最大值監測成果彙整 -----	2-5
圖 2.2-1	各測站水溫監測成果彙整 -----	2-8
圖 2.2-2	各測站透明度監測成果彙整 -----	2-8
圖 2.2-3	各測站溶氧量監測成果彙整 -----	2-8
圖 2.2-4	各測站鹽度監測成果彙整 -----	2-9
圖 2.2-5	各測站生化需氧量監測成果彙整 -----	2-9
圖 2.2-6	各測站 pH 監測成果彙整 -----	2-9
圖 2.2-7	各測站銅監測成果彙整 -----	2-10
圖 2.2-8	各測站鋅監測成果彙整 -----	2-10
圖 2.2-9	各測站鉛監測成果彙整 -----	2-10
圖 2.2-10	各測站汞監測成果彙整 -----	2-11
圖 2.2-11	各測站砷監測成果彙整 -----	2-11

前 言

前 言

一、依據

依據 100 年 3 月 21 日環保署審核通過「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析報告」之定稿本，依環評承諾辦理該區開發期間就海域環境及空氣品質監測調查結果分析、檢討並作因應對策研擬，達成環評承諾要求。

二、監測執行期間

本季為施工期間 102 年第 2 季環境監測，監測工作時程自 102 年 4 月至 102 年 6 月底止。

三、執行監測單位

本計畫由創迅科技股份有限公司統籌執行及監測報告書之彙整，監測計畫中之空氣品質及海域水質檢測方面由瑩諮科技股份有限公司(環署檢字第 012A 號)執行現場監測及採樣工作，有關檢測公司認證資料請參閱附錄一。

第一章、監測內容概述

1.1 工程進度

1.2 監測情形概述

1.3 監測計畫概述

1.4 監測位置

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管

1.5.2 分析工作之品保/品管

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

1.5.4 分析項目之檢測方法

1.5.5 數據處理原則

第一章、監測內容概述

1.1 工程進度

「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源工程」，施工期程預估約於 7 年內完成填築作業，主要施工內容包括輸排灰設備工程、土建工程及煤灰填地工程等，相關之預定工程進度如下所述：

- 一、輸排灰設備工程：已於 101 年 4 月 12 日申報開工，預定於 102 年 7 月完工，有關工程進度之預估請參閱表 1.1-1。
- 二、土建工程：已於 101 年 7 月 13 日申報開工，9 月 27 日進場施工，預定於 103 年 1 月完工，累計本季之總完成工程進度為 66.39 %，如表 1.1-2 所示。
- 三、煤灰填地工程：實際之執行期程為取得事業廢棄物清理計畫書核備文後開始執行。

表 1.1-1 輸排灰設備工程預定工程進度表

工程項目	101 年										102 年						
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	
1.開工	12 日																
2.圍堤填地																	
3.管理員室																	
4.儀控施工及安裝																	
5.電力外管路																	
6.試運轉及修正																	
7.現場整理及申報竣工																	

表 1.1-2 土建工程預定工程進度表

項次	工程項目	權重%	101年7月	8月	9月	10月	11月	12月	102年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	103年1月	累積%
1	樁設工程	0.51%	19	50	80	111	141	172	203	231	262	292	323	353	384	415	445	476	506	537	540	-100%
2	預鑄方塊製作	16.43%		5.74%	7.10%	7.18%	7.18%	10.04%	10.76%	12.20%	12.48%	12.98%	14.34%									-90%
3	東隔堤北段堤岸(下層) (E0k+000.00~E0k+442.52)	11.56%		15.29%	25.07%	29.06%	29.06%	30.58%														-80%
4	東隔堤北段堤岸(上層) (E0k+000.00~E0k+442.52)	4.96%						27.31%	29.69%	42.99%												-70%
5	東隔堤北段排水溝、護欄 (E0k+000.00~E0k+442.52)	2.35%						21.61%	33.67%	44.72%												-60%
6	東隔堤北段路面工程 (E0k+000.00~E0k+442.52)	1.06%								33.34%	66.66%											-50%
7	東隔堤南段堤岸(下層) (E0k+469.65~E1k+540.77)	28.00%						6.91%	12.88%	14.82%	16.85%	17.8%	20.21%	10.53%								-40%
8	東隔堤南段堤岸(上層) (E0k+469.65~E1k+540.77)	12.00%									13.07%	15.42%	16.41%	17.39%	18.37%	19.35%	15.56%	37.97%				-30%
9	東隔堤南段排水溝、護欄 (E0k+469.65~E1k+540.77)	5.68%													12.45%	15.56%	18.46%	15.56%				-20%
10	東隔堤南段路面工程 (E0k+469.65~E1k+540.77)	2.58%																		80.82%	19.18%	-10%
11	彭濱西五路路堤(下層)	8.61%											12.19%	13.98%	35.61%	38.22%	27.95%	35.07%	36.98%			-0%
12	彭濱西五路路堤(上層)	4.30%																	100.00%	39.49%	60.51%	
13	彭濱西五路排水溝	0.11%																				
14	彭濱西五路覆蓋土	1.85%																				
總計		100.00%																				
預定進度 %			0.25%	1.20%	2.93%	4.08%	4.54%	6.54%	5.68%	8.54%	7.60%	7.56%	8.91%	8.56%	6.12%	5.86%	7.58%	4.88%	4.59%	4.09%	0.49%	
累計進度 %			0.25%	1.45%	4.38%	8.46%	13.00%	19.54%	25.22%	33.76%	41.36%	48.92%	57.83%	66.39%	72.51%	78.37%	85.95%	90.83%	95.42%	99.51%	100.00%	

1.2 監測情形概述

本季為施工期間第六季環境監測(含施工前環境監測)，監測工作時程自民國 102 年 4 月至 102 年 6 月底止。本季於空氣品質及海域水質方面，監測結果，皆符合相關法令標準限值，監測項目如表 1.2-1 所示。

表 1.2-1 監測結果概述

監測類別	監測項目	本季監測結果摘要 (102.4~102.6)	因應對策
空氣品質	1.風向 2.風速 3.總懸浮微粒(TSP) 4.粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒(PM ₁₀) 5.二氧化氮(NO ₂) 6.二氧化硫(SO ₂) 7.一氧化碳(CO)	監測時間為民國 102/04/02~03，監測地點為線西西 3 區填築作業區(海巡署崗哨)，監測結果皆符合空氣品質標準限值。	持續監測
海域水質	1.水溫 2.透明度 3.溶氧量(DO) 4.鹽度 5.生化需氧量(BOD) 6.pH 值 7.重金屬(銅(Cu)、硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)、砷(As))	監測時間為民國 102/04/02，監測地點為線西西 3 區填築作業區北側、西側及南側海域，監測結果各測站皆符合乙類海域水質標準。	持續監測

1.3 監測計畫概述

本計畫施工期間之環境監測內容，依據環評承諾事項辦理，監測項目包含空氣品質及海域水質等，監測頻率為每季進行乙次，如表 1.3-1 所示，相關說明分述如下：

一、空氣品質

- (一)監測項目：風向、風速、總懸浮微粒(TSP)、粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒(PM₁₀)、二氧化氮(NO₂)、二氧化硫(SO₂)、一氧化碳(CO)。
- (二)頻率：施工期間每季進行乙次，每次連續 24 小時。
- (三)方法：依據行政院環境保護署公告之 NIEA 相關規定辦理。

二、海域水質

- (一)監測項目：水溫、透明度、溶氧量(DO)、鹽度、生化需氧量(BOD)、pH 值、重金屬(銅(Cu)、硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)、砷(As))。
- (二)頻率：施工期間每季進行乙次。
- (三)方法：依據行政院環境保護署公告之 NIEA 相關規定辦理。

表 1.3-1 彰濱工業區線西 3 區施工期間環境監測計畫

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行執行單位	執行監測時間
空氣品質	1.風向	線西 3 區填築作業區(海巡署崗哨)。	每季進行 1 次，24 小時連續監測。	氣象設備自動測定法 氣象設備自動測定法 NIEA A102.12A NIEA A206.10C NIEA A417.11C NIEA A416.11C NIEA A421.11C	瑩諮科技股份有限公司(環署環檢字第 012A 號)	102/04/02 ~ 102/04/03
	2.風速					
	3.總懸浮微粒(TSP)					
	4.粒徑 $\leq 10\mu m$ 之懸浮微粒(PM ₁₀)					
	5.二氧化氮(NO ₂)					
	6.二氧化硫(SO ₂)					
	7.一氧化碳(CO)					
海域水質	1.水溫	線西 3 區填築作業區北側、西側及南側海域各選取 1 處，共計 3 處測站。	每季進行 1 次。	NIEA W217.51A NIEA E220.50C NIEA W455.52C NIEA W447.20C NIEA W510.55B NIEA W424.52A NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W311.52C NIEA W311.52C NIEA W330.52A NIEA W434.53B	瑩諮科技股份有限公司(環署環檢字第 012A 號)	102/04/02
	2.透明度					
	3.溶氧量(DO)					
	4.鹽度					
	5.生化需氧量(BOD)					
	6.pH 值					
	7.重金屬					
	(1)銅(Cu)					
	(2)鋅(Zn)					
	(3)鉛(Pb)					
	(4)鎘(Cd)					
	(5)硒(Se)					
	(6)鉻(Cr)					
	(7)汞(Hg)					
	(8)砷(As)					

1.4 監測位置

本計畫依據 100 年 3 月 21 日環保署審核修正通過「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析報告」之定稿本，內文中所提及之環境監測計畫，選定具有代表性之監測位置，如圖 1.4-1 所示。



圖 1.4-1 施工期間環境監測位置圖

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管

為確保本監測計畫監測數據品質，除了在樣品檢測分析過程中執行品保品管作業外，更應注意樣品之採集、輸送及保存作業中所有步驟是否依據標準作業程序進行，惟有採集正確且不受污染或變質之樣品，其檢測結果方能代表受測環境的真實值。為達上述目的，採樣作業流程圖(圖 1.5.1-1)提供採樣人員從採樣作業開始至樣品送達實驗室接收為止之採樣標準作業程序。

本監測計畫於本次執行空氣品質及海域水質，其中空氣品質均須在採樣現場使用各分析儀器，依規定之標準操作程序即刻分析。

在監測作業上除遵照環保署所公告之標準方法進行外，並依照表 1.5.1-1 之採樣作業準則及表 1.5.1-2~3 採樣至運輸過程中注意事項進行採樣工作。

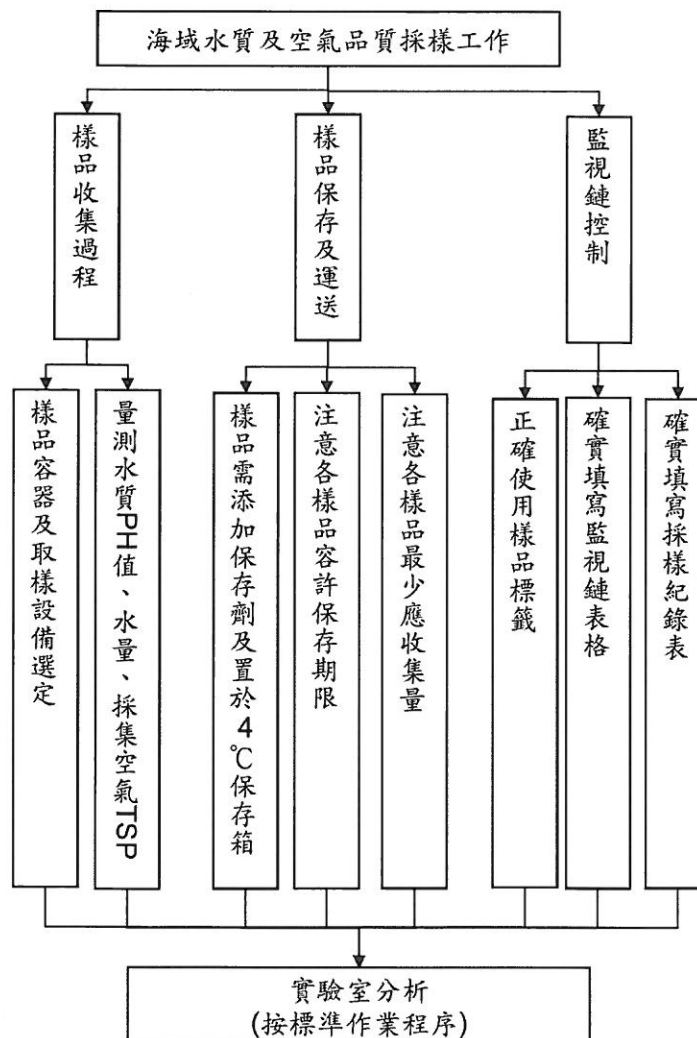


圖 1.5.1-1 採樣作業流程圖

表 1.5.1-1 採樣作業準則

採樣項目	作業準則
空氣品質	▶ 監測站宜尋找空曠地點，附近儘可能遠離建築物及樹林。 ▶ 遠離交通要道，以避免受交通工具排放污染物之影響。 ▶ 須有便利之電源供應及容量應符合需要。 ▶ 測站附近不應有大型工作機具。
海域水質	▶ 每次採樣前由實驗室計畫負責人先行收集相關天候、漲退潮資訊。 ▶ 以採集具代表性水樣為主。

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

表 1.5.1-2 空氣品質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
現場記錄	▶ 了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。	▶ 必須將氣象資料，周界環境因子詳加記載。
穩定/校正	▶ 確保分析所得之數據具有代表性。	▶ 使用儀器前必須先經流量校正
採樣	▶ 採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。	▶ 使用測定前預先開機運轉至流量穩定，才開始測定 24 小時之值。
運送空白	▶ 為確保分析結果之正確性，每次均有一組運送空白樣品。	▶ 以運送空白，瞭解運送過程之完整性。
儲存/運送	▶ 避免樣品因儲存時間過久或是運送不當，造成品質變化。	▶ 依照環保署所公告規定項目保存方式加以運送保存，並注意密封時之完整性。

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

表 1.5.1-3 海域水質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
清洗採樣設備	▶ 洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	▶ 須用試劑水清洗採樣器。
採樣	▶ 自水體採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	▶ 在採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧等，宜避免有氣泡殘存。
現場測定	▶ 為確保取出樣品為具代表性一些指標於取樣後應盡速分析。	▶ pH 值、導電度及溫度應於現場立即進行分析。
樣品保存與運輸	▶ 樣品分析前應依樣品保存方式，予以保存，俾使化學性質變化減至最小。	▶ 須遵照環檢所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析。

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

1.5.2 分析工作之品保/品管

實驗室的分析流程，均依照或參考環保署公告之檢測方法，而從樣品收樣開始至報告之訂定完成，每一步驟都參照品保/品管作業流程(圖 1.5.2-1)，以確保實驗室中品保/品管正確無誤。

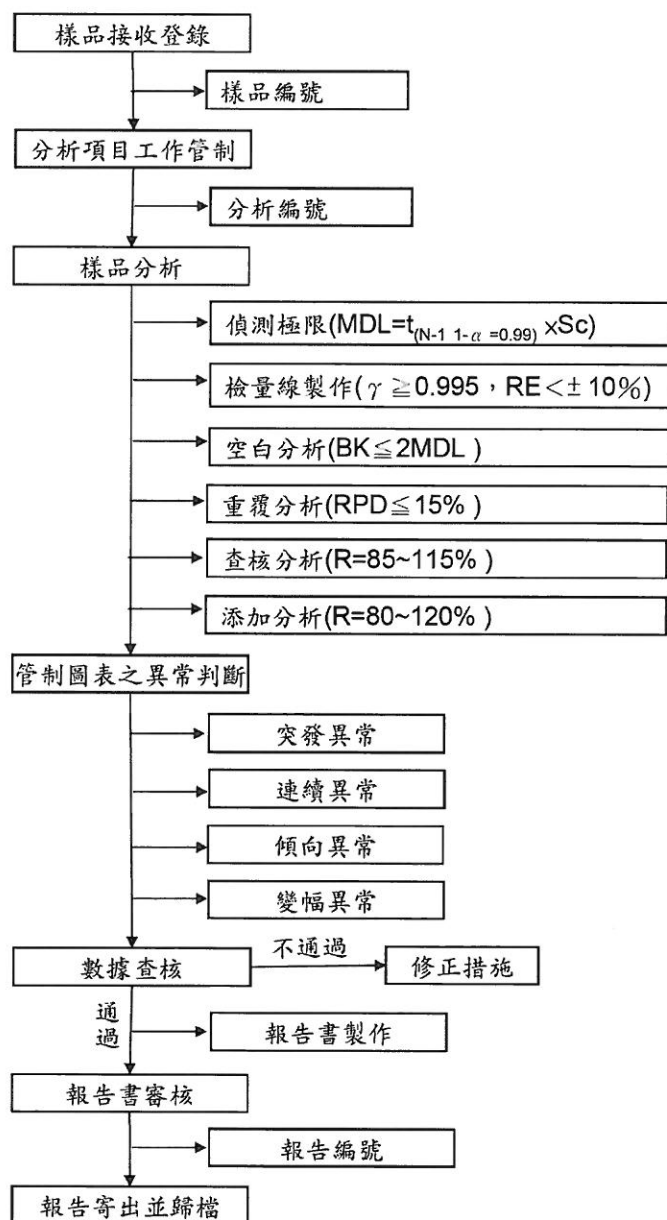


圖 1.5.2-1 品保/品管作業流程圖

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

本計畫執行監測之儀器，均定期之維修校正，維修校正之項目及頻率，如表 1.5.3-1 所示。

表 1.5.3-1 儀器維修校正情形(1/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物件	校正維護步驟與相關規定	參考資料
1	溫度計 ▶ 參考溫度計 (liquid-in-glass) ▶ 工作溫度計 (liquid-in-glass)	▶ 外部校正 ▶ 內部校正 ▶ 內部校正	▶ 每六年校正一次 ▶ 六個月 ▶ 初次使用前 ▶ 六個月	▶ 完整的校正 ▶ 冰點 ▶ 多點溫度校正 (1)冰點 (2)室溫 (3)油沸點 (4)水沸點	▶ 參考溫度計 ▶ 參考溫度計 ▶ 參考溫度計 ▶ 參考溫度計 ▶ 參考溫度計	▶ 冰點檢查 ▶ 用參考溫度計做溫度檢查 (包含冰點及選擇足夠的 檢查點以涵蓋使用範圍) ▶ 使用參考溫度計做冰點或 使用範圍內之單點檢查 ▶ 使用參考溫度計做多點溫 度檢查	
2	▶ 工作熱電偶 (Working thermocouples)	▶ 內部校正	▶ 六個月	▶ 冰點、室溫、油沸 點、水沸點	▶ 參考溫度計		
3	玻璃器皿 ▶ 玻璃器皿(含玻璃量瓶、 玻璃移液管、玻璃滴定管 等) ▶ 活塞操作定容裝置 (piston operated) (1)自動移液器(Pipettes)	▶ 內部校正 ▶ 內部校正	▶ 每年校正一次 (附有證書之 A 級品初次使用前 不需校正)	▶ 標示體積			▶ NIEA-PA 106
	(2)分液器(Dispensers) (3)自動滴定管(Burettes)	▶ 內部校正 ▶ 內部校正	▶ 初次使用前(有不 原廠保證書即不 用校正) ▶ 三個月 ▶ 同自動移液器 ▶ 初次使用前 ▶ 每六個月及當內 管或外筒(barrel / plunger)換新時	▶ 標示體積 ▶ 標示體積 ▶ 標示體積 ▶ 標示體積		▶ 檢查器示最大值；對可調 整移取體積者，至少檢查 定之移取體積。 ▶ 同上或至少檢查使用時所 設定之移取體積 ▶ 同自動移液器 ▶ 檢查器示最大值與其他 2 個設定之移取體積 ▶ 同上	

表 1.5.3-1 儀器維修校正情形(2/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物	校正維護步驟與相關規定	參考資料
4	瞬間與累積流量計 ▶ 皂泡式氣體流量計 (1)高流量(H) (2)低流量(L) (3)小流量(S) ▶ 動態稀釋器(周界) ▶ 動態稀釋器(煙道) ▶ 小孔流量計 ▶ 溼式流量計及乾式流量計 ▶ 風速/風向計/溫度/濕度 ▶ 皮托管(Pitot tubes)	▶ 外部校正 ▶ 外部校正 ▶ 外部校正 ▶ 外部校正 ▶ 內部校正 ▶ 外部校正 ▶ 外部校正 ▶ 內部校正 ▶ 外部校正 ▶ 內部校正 ▶ 外部校正 ▶ 內部校正或維護	▶ 六年(工研院) ▶ 一年(南部監測中心) ▶ 一年(南部監測中心) ▶ 一年(南部監測中心) ▶ 一年(南部監測中心) ▶ 二年 ▶ 6個月 ▶ 一年 ▶ 初次使用時 ▶ 採樣前 ▶ 6個月	▶ 流量 ▶ 流量 ▶ 流量 ▶ 流量 ▶ 流量 ▶ 體積 ▶ 皮托管係數 ▶ 皮托管係數或確 認構造特性		▶ 用肥皂流量計校正 ▶ 動態稀釋器 ▶ 目視檢查是否損壞或污染 ▶ 檢查方向及尺寸吻合性 ▶ 檢查是否有損壞、堵塞等	
5	▶ 參考氣壓計 ▶ 工作氣壓計	▶ 外部校正 ▶ 內部校正	▶ 一年 ▶ 六個月(改每次攜出做 比對)	▶ 多點壓力刻度 ▶ 大氣壓校正	▶ 參考壓力計	▶ 檢查、維護、比對	
6	▶ BOD 培養箱 (BOD incubator) ▶ BOD 瓶 ▶ 培養箱	▶ 檢查維護 ▶ 內部校正 ▶ 檢查維護	▶ 使用期間 ▶ 一年 ▶ 使用期間	▶ 溫度 ▶ 標示體積 ▶ 溫度	▶ 高低溫溫度計 ▶ 專用溫度計	▶ 檢查開始測試時 BOD 培養箱之溫度及五天培養期間之最高與最低溫度。 ▶ 使用專用且經校正之溫度計(或適當溫度檢測器), 監視培養箱內部的溫度並記錄之, 溫度需維持在±1℃或在方法中可允許之範圍。	
8	▶ 乾燥烘箱(Oven) ▶ 高溫爐	▶ 內部校正 ▶ 檢查維護	▶ 二年一次 ▶ 使用時	▶ 溫度 ▶ 溫度	▶ 熱電偶	▶ 檢查溫度變化 ▶ 檢查烘箱內使用位置之溫度變化 ▶ 以適當的檢測器(Sensor)監視溫度並記錄	

表 1.5.3-1 儀器維修校正情形(3/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物件	校正維護步驟與相關規定	參考資料
9	▶導電度計	▶內部校正	▶使用前 ▶每年	▶單點檢查 ▶全刻度檢查			
10	▶pH計	▶內部校正	▶使用前	▶pH值(線性)	▶標準緩衝溶液	▶以涵蓋待測樣品 pH值之兩種標準 緩衝溶液進行校正	
11	▶溶氧計	▶內部校正	▶使用前 ▶每月	▶單點檢查 ▶與傳統滴定做 比較			
12	▶分光光度計 (Spectrophotometers)	▶內部校正	▶使用前 ▶三個月	▶檢量線製備 ▶波長準確度、 線性 (Linearity)、迷 光 (Stray light)、樣品吸 光槽配對 (Matching of cells)之校正	▶參考標準品		▶NIEA-PA103 及 各該廠牌儀器之 使用手冊 ▶各該廠牌儀器之 使用手冊
13	▶吹氣捕捉儀	▶內部校正與維護	▶每批次樣品分析前 ▶更換試劑水後	▶溫度檢視 ▶壓力檢視 ▶試劑水存量檢 查(手動者免執 行) ▶管路潤洗		▶檢視熱脫附 Heater 溫度 ▶檢視熱脫附表壓 ▶檢視試劑水位是 否高於安全存量線 ▶H ₂ O/Std Prime 動作	▶各該廠牌儀器之 使用手冊
14	▶自動進樣儀	▶內部校正與維護	▶每批次樣品分析前	▶壓力檢視		▶檢視 Oven Heater 溫度 ▶檢視氣體壓力	▶各該廠牌儀器之 使用手冊

表 1.5.3-1 儀器維修校正情形(4/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物件	校正維護步驟與相關規定	參考資料
15	▶感應偶和電漿原子發射光譜儀	▶內部校正與維護	▶使用前	▶Cu/Pb 訊號強度當比值(須符合管制值) ▶Mn check：確認ICP 感度，同心圓霧化器 300 萬以上，抗高鹽類霧化器 250 萬以上。			▶各該廠牌儀器之使用手冊
16	▶真空壓力表 ▶工作壓力表	▶外部校正	▶每年一次				
17	▶周界分析儀(CO,NOx,SO2,O3,THC)	▶內部校正	▶使用前後	▶檢量線多點校正 ▶單點校正			
18	▶高量採樣器(Hi-vol)	▶內部校正	▶更換破刷或維修作多點 ▶使用前後	▶檢量線多點校正 ▶單點校正			

資料來源：臺諡科技股份有限公司提供。

1.5.4 分析項目之檢測方法

有關本監測計畫空氣品質及海域水質各檢測項目之檢驗分析方法及偵測極限值等，請參閱表 1.5.4-1~2。

表 1.5.4-1 空氣品質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法 偵測極限	儀器 偵測極限	重複 分析	添加回收率 (%)
風向	—	—	0~360 度	—	—
風速	—	—	0.5~20 m/s	—	—
總懸浮微粒(TSP)	NIEA A102.12A	—	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—
粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒(PM ₁₀)	NIEA A206.10C	—	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—
二氧化氮(NO ₂)	NIEA A417.11C	—	1.0 ppb	—	—
二氧化硫(SO ₂)	NIEA A416.11C	—	1.0 ppb	—	—
一氧化碳(CO)	NIEA A421.11C	—	0.1 ppm	—	—

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

表 1.5.4-2 海域水質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	重複分析 (%)	添加回收率 (%)	查核回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	—	$\pm 0.5^\circ\text{C}$	—	—
透明度	NIEA E220.50C	—	—	—	—
溶氧(DO)	NIEA W455.52C	—	0~6.1	—	—
鹽度	NIEA W447.20C	—	—	—	—
生化需氧量(BOD)	NIEA W510.55B	—	0~10.0	—	85~114
pH	NIEA W424.52A	—	± 0.1	—	—
銅(Cu)	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	0.00060 mg/L	0~11.5	80~115	84~112
鋅(Zn)		0.00092 mg/L	0~8.5	85~115	82~114
鉛(Pb)		0.00096 mg/L	0~7.3	85~116	82~115
鎘(Cd)		0.00066 mg/L	0~6.1	83~115	83~115
硒(Se)	NIEA W311.52C	0.0054 mg/L	0~8.8	86~120	88~112
鉻(Cr)	NIEA W311.52C	0.0125 mg/L	0~8.8	84~118	83~112
汞(Hg)	NIEA W330.52A	0.000575 mg/L	0~7.1	84~115	82~115
砷(As)	NIEA W434.53B	0.00010 mg/L	0~8.1	85~115	81~116

註：鉻(Cr)為 QDL 定量偵測極限。

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

1.5.5 數據處理原則

一、有效測值定義

空氣監測項目，數據計算處理方式，以算術平均方式處理，有效小時平均值，應至少有 3/4 以上有效值(即 45 分鐘以上)，有效日平均值，應至少有 2/3 以上有效值(即每日 16 小時以上)，有效月平均值，應至少有 2/3 以上有效值(即每月至少 20 有效日以上)方為有效值。以確保數據之有效及準確性。

二、有效位數定義

檢測人員於採樣分析過程中，各種化學物理之量度，其真實值與觀測值間多少有些差異即為誤差。通常一觀測值乃由一正確數字加上一位未確定之估計值所組成；分析所得之結果數據則於計算過程中以「有效數字法」將不準度捨去。

(一)加減：以小數點位數最少者作基準，將計算所得結果歸整為相同之小數點位數。

(二)乘除：有效位數相乘除時，計算所得之有效位數的取捨以各數值中有效位數最少者為標準。

(三)進位方法：四捨五入法。

以上加減或乘除有效位數之取捨乃檢驗數據運算之通則、檢驗室各檢驗類別之分析項目皆依照此原則決定檢測數據之有效位數。

三、方法偵測極限值之數據處理

檢測分析數據，若有檢測出低於方法偵測極限值之數據結果，則一概均以 ND(低於方法偵測極限值)記錄處理，計算平均值時則以 MDL 值代入計算。

第二章、監測結果數據分析

2.1 氣象及空氣品質

2.2 海域水質

第二章、監測結果數據分析

本季為施工期間第六季環境監測(含施工前環境監測)，監測工作時程自民國 102 年 4 月至 102 年 6 月底止。監測項目包含空氣品質及海域水質等，監測結果，分述於下列各節。品保/品管記錄、相關監測原始數據及現場照片等請參閱附錄三~附錄四。

2.1 氣象及空氣品質

本季氣象及空氣品質之監測時間為 102 年 4 月 2 日~102 年 4 月 3 日，監測地點為線西西 3 區填築作業區(海巡署崗哨)，有關本季氣象及空氣品質之監測結果彙整如表 2.1-1 所示，茲分述如下：

一、氣象

(一)風向：本季之盛行風向為西風。

(二)風速：本季之日平均風速為 8.0 m/s。

二、空氣品質

本季空氣品質監測之監測項目包括：總懸浮微粒(TSP)、粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒(PM_{10})、二氧化氮(NO_2)、二氧化硫(SO_2)及一氧化碳(CO)，監測結果皆符合環保署公告之空氣品質標準值(101 年環署空字第 1010038913 號令修正發布)，監測結果分述如下：

(一)總懸浮微粒(TSP)

本季調查結果，測站之總懸浮微粒(TSP)之 24 小時值為 $182 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合空氣品質 $250 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之標準值。

(二)懸浮微粒(PM_{10})

本季調查結果，測站之粒徑 $\leq 10 \mu\text{m}$ 懸浮微粒(PM_{10})之日平均值為 $87 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，符合空氣品質 $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 之標準值。

(三)二氧化氮(NO_2)

本季調查結果，測站之二氧化氮(NO_2)之小時平均最大值為 0.013 ppm，符合空氣品質 0.25 ppm 之標準值。

(四)二氧化硫(SO_2)

本季調查結果，測站之二氧化硫(SO_2)之小時平均最大值為 0.002 ppm，日平均值為 0.001 ppm，符合空氣品質小時平均最大值 0.25 ppm 及日平均值 0.1 ppm 之標準值。

(五)一氧化碳(CO)

本季調查結果，測站之一氧化碳(CO)之小時平均最大值及八小時平均最大值皆為 0.7 ppm，均符合空氣品質小時平均值 35 ppm 及八小時平均值 9 ppm 之標準值。

表 2.1-1 空氣品質監測調查綜合成果

項目	最頻風向 (deg)	平均 風速 (m/s)	總懸浮微粒 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 24 小時值	粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒(PM_{10}) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 日平均值	二氧化氮 (ppm)		二氧化硫 (ppm)		一氧化碳 (ppm)	
					小時平均 最大值	日平均值	小時平均 最大值	小時平均 最大值	小時平均 最大值	最大 8 小時 平均值
101/01/10~11	東風	12.6	122	41	0.007	0.002	0.002	0.4	0.4	0.4
101/05/13~14	東南風	3.8	70	49	0.015	0.002	0.005	0.4	0.4	0.3
101/07/24~25	北北東風	3.2	50	21	0.018	0.002	0.005	0.4	0.4	0.6
101/10/08~09	北北東風	7.9	95	42	0.013	0.002	0.005	0.2	0.2	0.2
102/01/15~16	北北西風	5.5	126	67	0.020	0.002	0.005	0.5	0.5	0.5
102/04/02~03	西風	8.0	182	87	0.013	0.001	0.002	0.7	0.7	0.7
法規標準	--	--	250	125	0.25	0.1	0.25	35	35	9

註：1.監測單位：瑩諮科技股份有限公司(行政院環保署認可証字號第 012 號)。
2.空氣品質標準，行政院環境保護署，101.05.14 環署空字第 1010038913 號令修正發布。

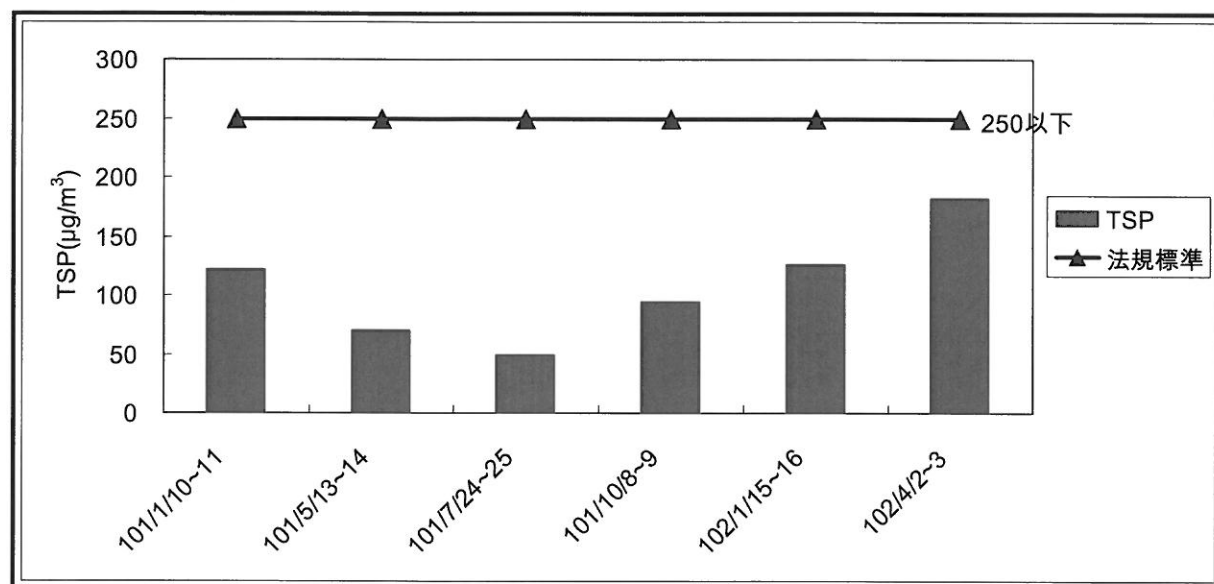


圖 2.1-1 總懸浮微粒 24 小時值監測成果彙整

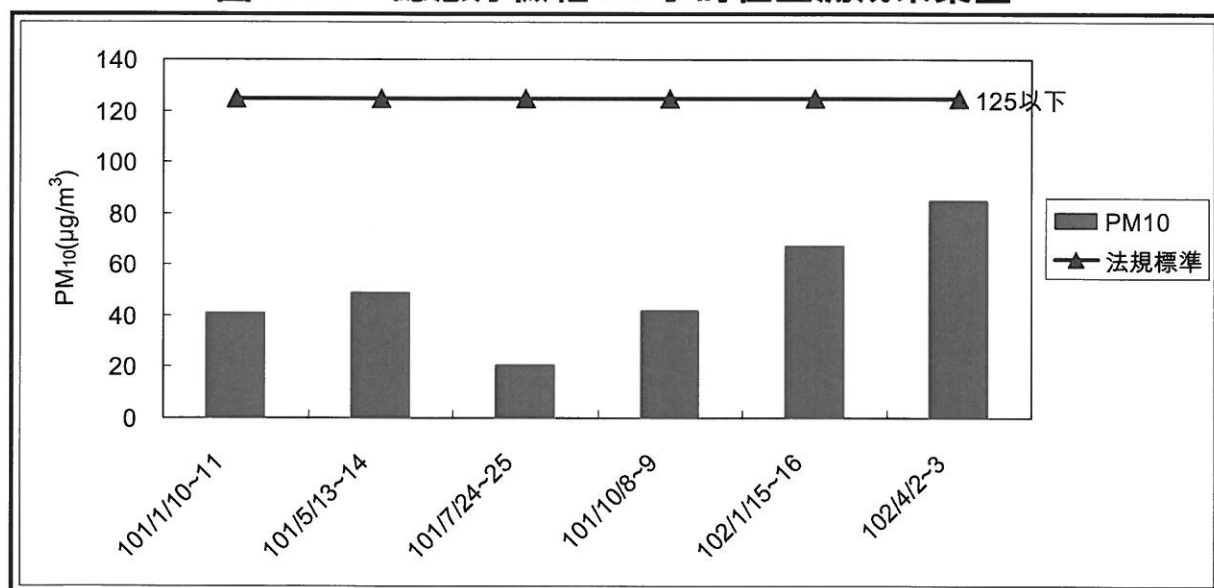


圖 2.1-2 粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒日平均值監測成果彙整

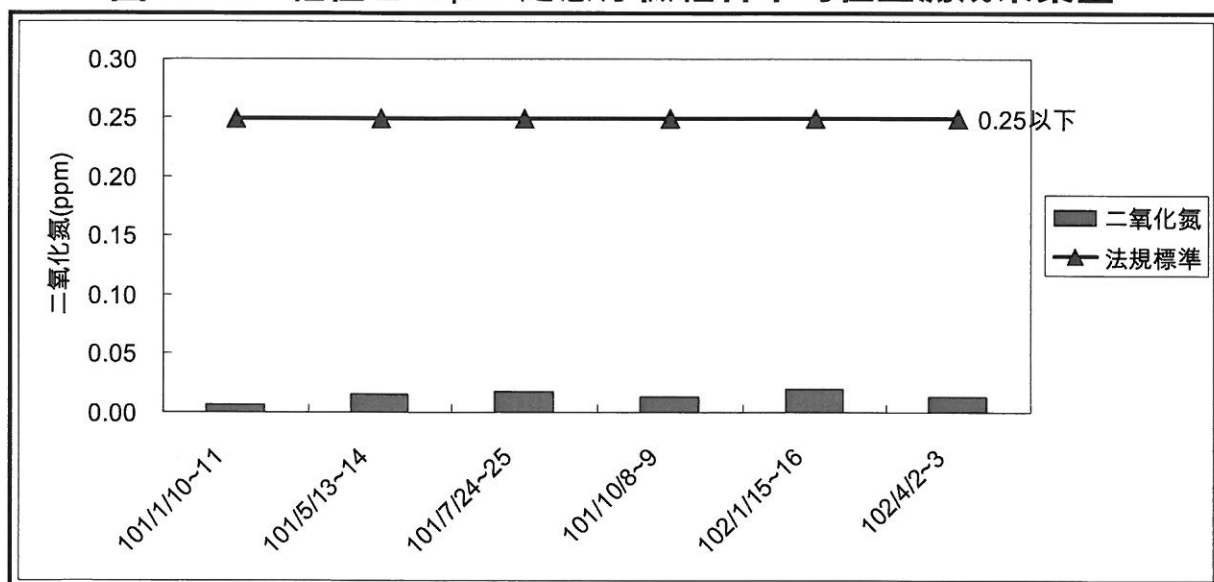


圖 2.1-3 二氧化氮小時平均最大值監測成果彙整

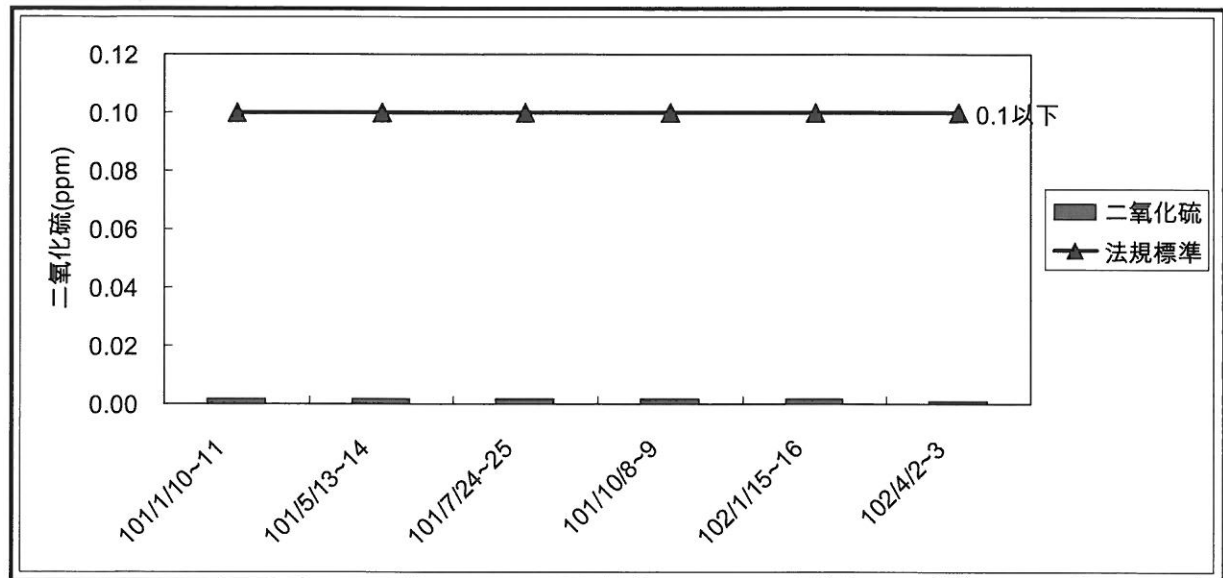


圖 2.1-4 二氧化硫日平均值監測成果彙整

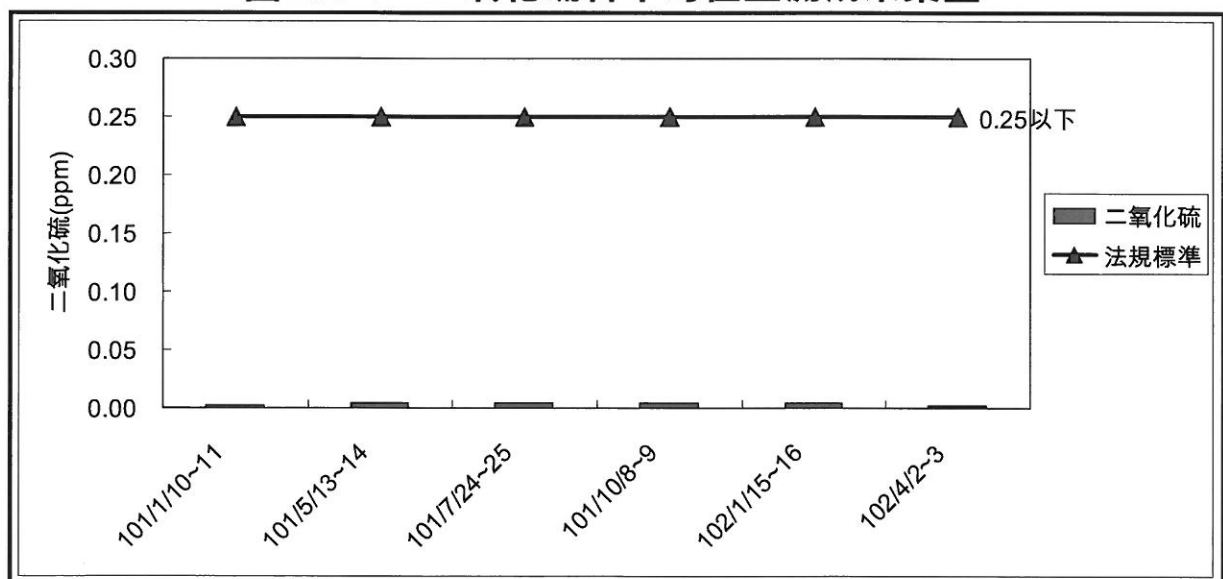


圖 2.1-5 二氧化硫小時平均最大值監測成果彙整

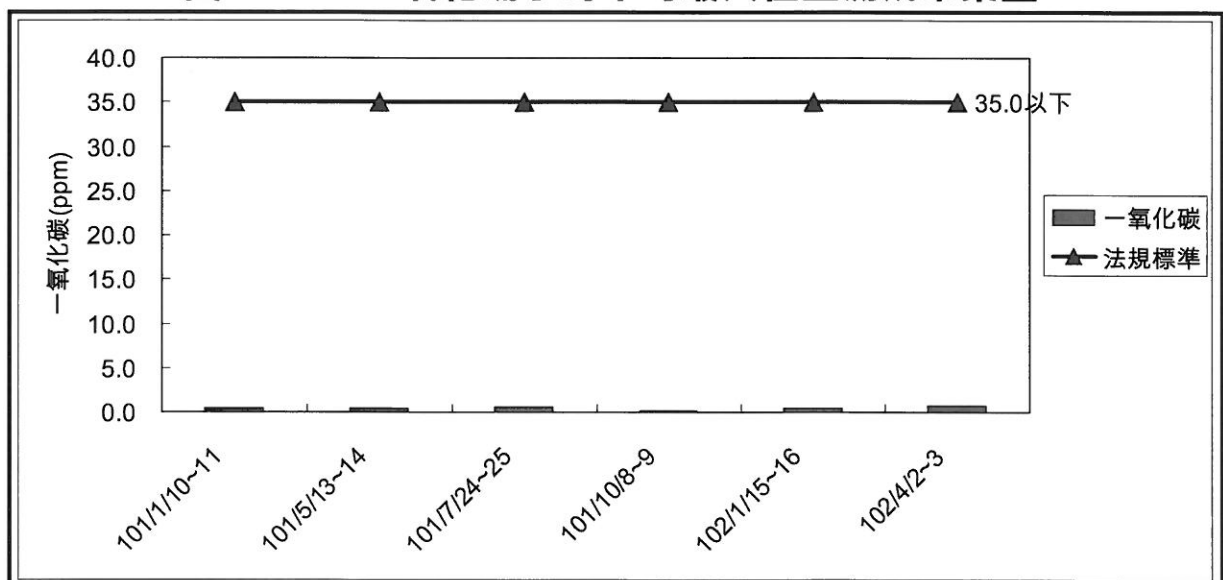


圖 2.1-6 二氧化碳小時平均最大值監測成果彙整

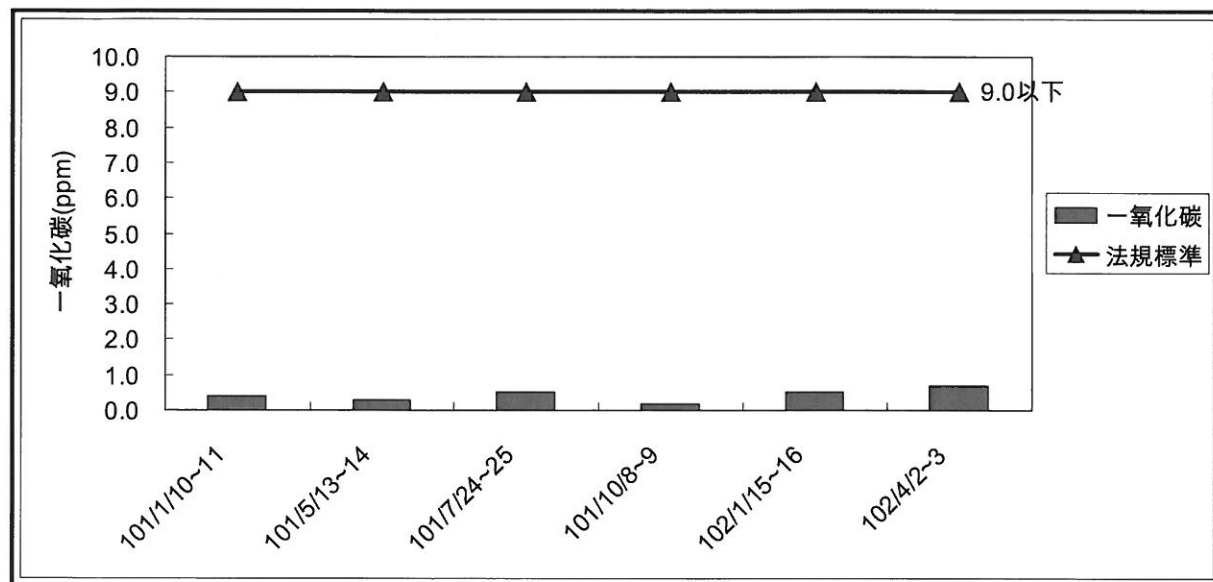


圖 2.1-7 一氧化碳 8 小時平均最大值監測成果彙整

2.2 海域水質

本季海域水質之監測時間為 102 年 4 月 2 日，監測地點為線西西 3 區填築作業區北側、西側及南側海域，本季海域水質之監測項目包括：水溫、透明度、溶氧量(DO)、鹽度、生化需氧量(BOD)、pH 值、重金屬(銅(Cu)、硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)、砷(As))，各測站之監測結果皆符合乙類海域環境標準值((90)環署水字第 0081750 號)，有關本季海域水質之監測結果彙整如表 2.2-1 所示，茲分述如下：

一、水溫

本季調查結果，各測站水溫之測值介於 23.6~23.8 °C 之間，各測站之差異變化不明顯。

二、透明度

本季調查結果，各測站透明度之測值介於 70~90 cm 之間，各測站之差異變化不明顯。

三、溶氧量(DO)

本季調查結果，各測站溶氧量(DO)之測值皆為 5.3 mg/L，符合乙類海域環境標準 5.0 mg/L 以上標準值。

四、鹽度

本季調查結果，各測站鹽度之測值介於 33.5~33.7 psu 之間。

五、生化需氧量(BOD)

本季調查結果，各測站生化需氧量(BOD)之測值介於 0.7~0.9 mg/L 之間，符合乙類海域環境標準 3 mg/L 以下標準值。

六、pH 值

本季調查結果，各測站 pH 值之測值介於 7.9~8.0 之間，符合乙類海域環境標準 7.5~8.5 標準值。

七、重金屬

本季調查結果，各測站重金屬(1)銅(Cu)之測值介於 0.0006(方法偵測極限)~0.0009 mg/L 之間，符合乙類海域環境標準 0.03 mg/L；(2)汞(Hg)之測值介於 0.000575(方法偵測極限)~0.0009 mg/L 之間，符合乙類海域環境標準 0.002 mg/L；(3)砷(As)之測值介於 0.0014~0.0015 mg/L 之間，符合乙類海域環境標準 0.05 mg/L，(4)另於硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)之測值均小於方法偵測極限。

表 2.2-1 海域水質監測成果

監測項目		水溫	透明度	溶氧量	鹽度	生化需氧量	pH 值	重金屬							
監測日期		(°C)	(cm)	(mg/L)	(psu)	(mg/L)		銅	砷	鋅	鉛	鎘	鉻	汞	砷
101/2/21	北側	14.4	80	6.4	34.0	0.9	8.2	N.D.	N.D.	0.0015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
	西側	14.6	80	6.5	33.0	0.8	8.1	N.D.	N.D.	0.0026	0.0012	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	南側	14.5	60	6.5	34.0	0.7	8.1	N.D.	N.D.	0.0035	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
101/4/18	北側	23.4	80	6.8	34.0	0.7	8.1	0.0034	N.D.	0.0147	0.0036	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	西側	23.5	80	6.8	34.1	0.7	8.1	0.0015	N.D.	0.0089	0.0014	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
	南側	23.5	90	6.8	34.4	0.8	8.1	0.0014	N.D.	0.0060	0.0011	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
101/7/24	北側	31.7	60	6.8	33.6	0.9	8.1	0.0027	N.D.	0.018	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	西側	31.6	60	6.8	33.2	0.9	8.2	N.D.	N.D.	0.011	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	南側	31.2	70	6.8	33.5	1.8	8.1	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
101/10/9	北側	25.7	80	6.7	34.0	0.9	8.2	0.0092	N.D.	0.014	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	0.0020
	西側	25.8	70	6.6	34.2	0.9	8.2	0.0114	N.D.	0.014	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	0.0021
	南側	25.6	80	6.6	34.4	1.5	8.2	0.0153	N.D.	0.009	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	0.0019
102/01/16	北側	19.1	80	6.7	34.2	1.2	8.1	0.0009	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0018
	西側	19.0	70	6.7	34.2	1.3	8.0	0.0009	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0017
	南側	19.2	70	6.7	34.3	1.1	8.0	0.0015	N.D.	0.009	0.011	N.D.	N.D.	N.D.	0.0016
102/04/02	北側	23.8	90	5.3	33.5	0.9	8.0	0.0009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009	0.0014
	西側	23.6	70	5.3	33.7	0.7	7.9	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
	南側	23.8	80	5.3	33.6	0.7	8.0	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
101 年方法偵測極限		--	--	--	--	--	--	0.00069	0.0059	0.00091	0.00101	0.00062	0.0006	0.000638	0.000075
102 年方法偵測極限		--	--	--	--	--	--	0.00060	0.0054	0.00092	0.00096	0.00066	0.0125 ^{註3}	0.000575	0.00010
乙類 海域環境標準		--	--	5.0 以上	--	3 以下	7.5~8.5	0.03	0.05	0.5	0.1	0.01	0.05	0.002	0.05

註：1.監測單位：臺諡科技股份有限公司(行政院環境保護署認可証字號第 012 號)。
2.海域環境分類及海洋環境標準，行政院環境保護署，90.10.26(90)環署水字第 0081750 號。
3.QDL 定量偵測極限。

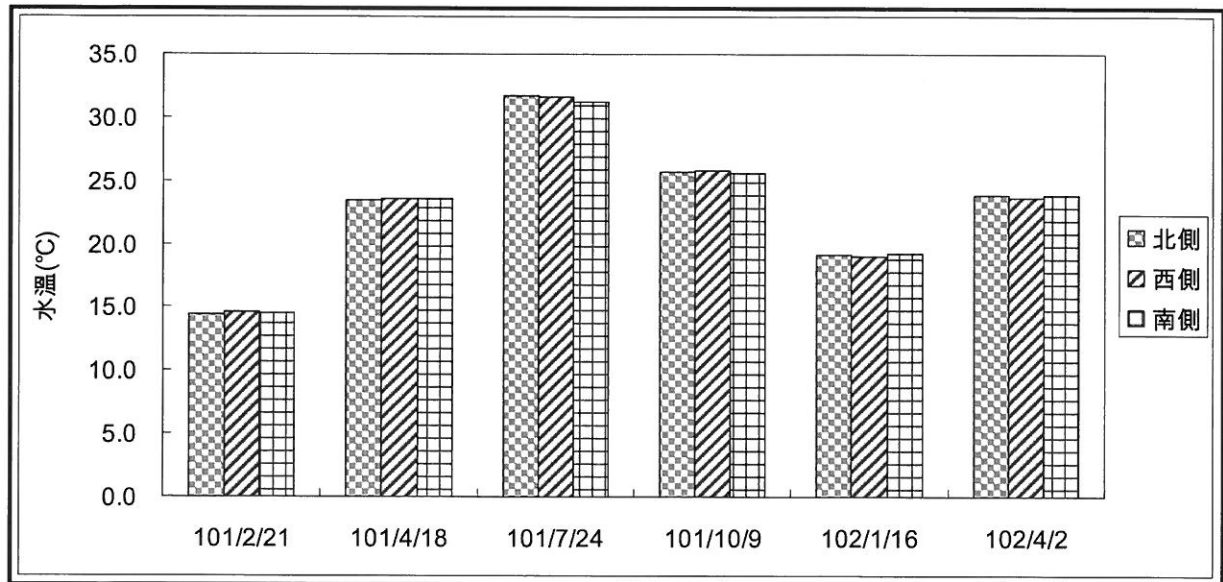


圖 2.2-1 各測站水溫監測成果彙整

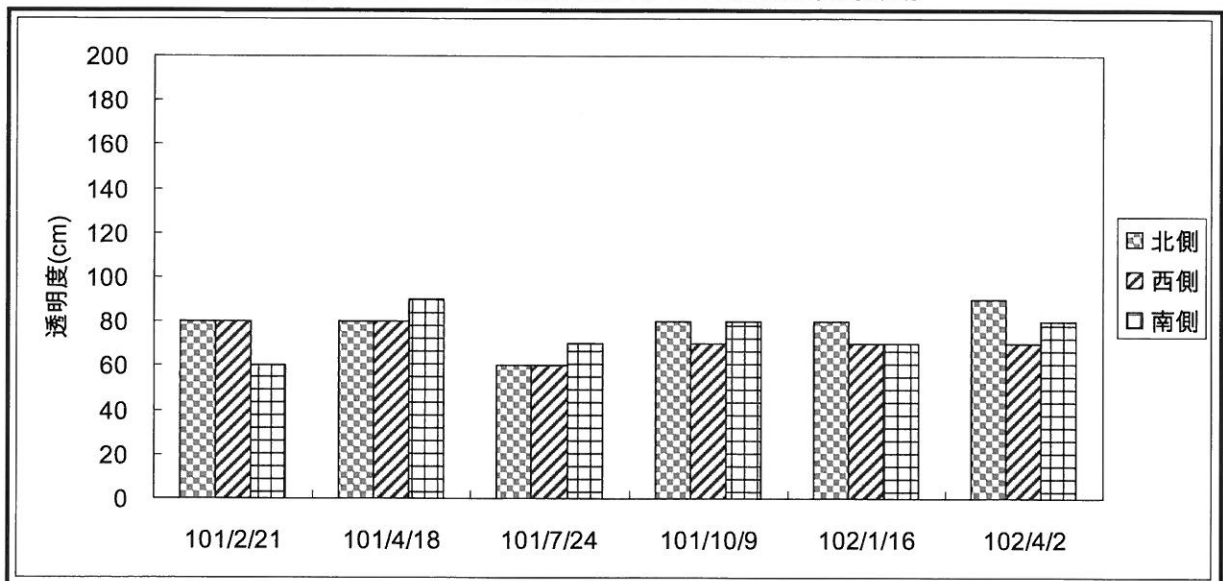


圖 2.2-2 各測站透明度監測成果彙整

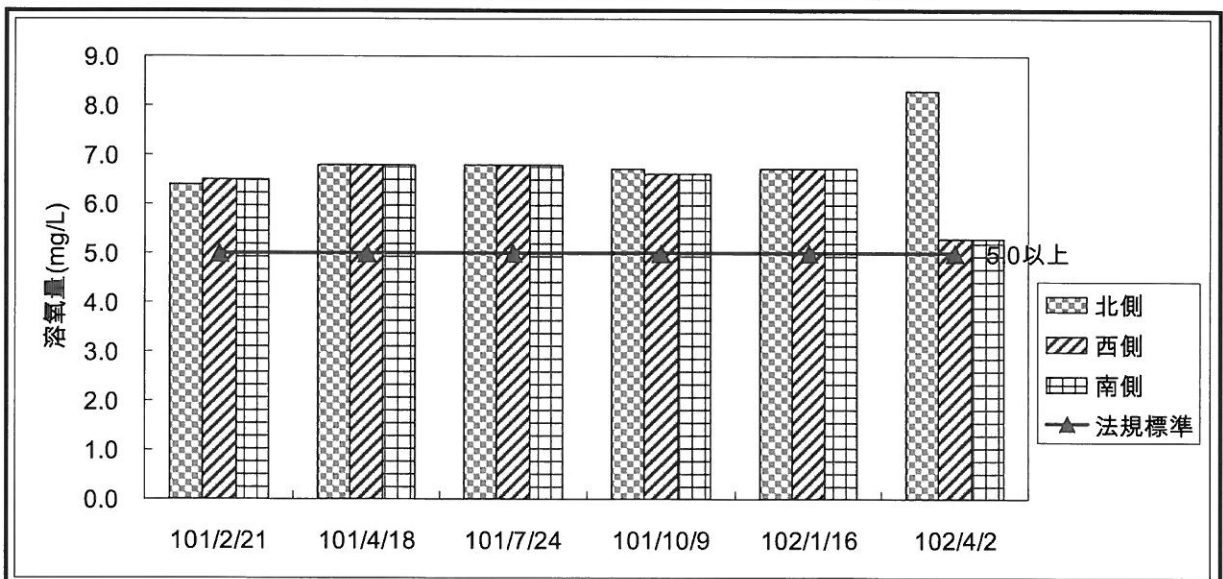


圖 2.2-3 各測站溶氧量監測成果彙整

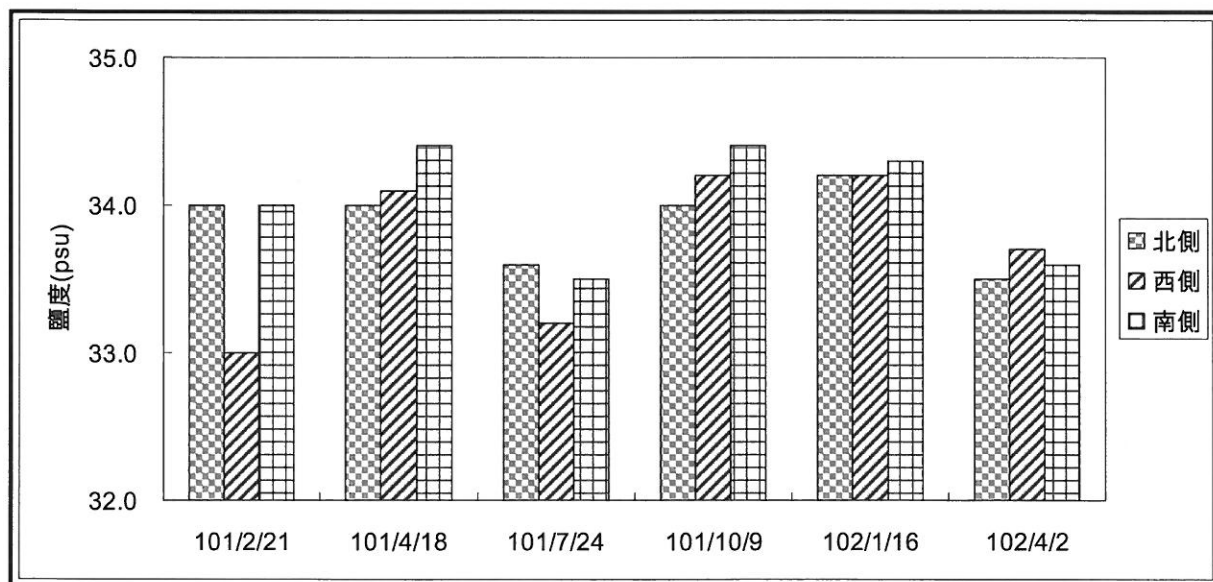


圖 2.2-4 各測站鹽度監測成果彙整

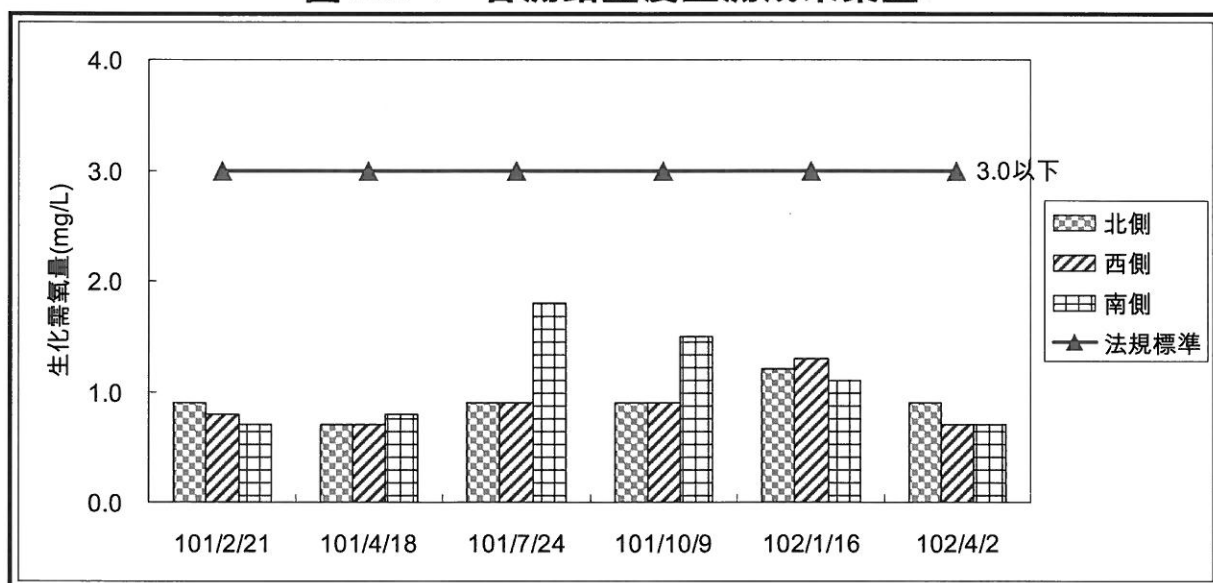


圖 2.2-5 各測站生化需氧量監測成果彙整

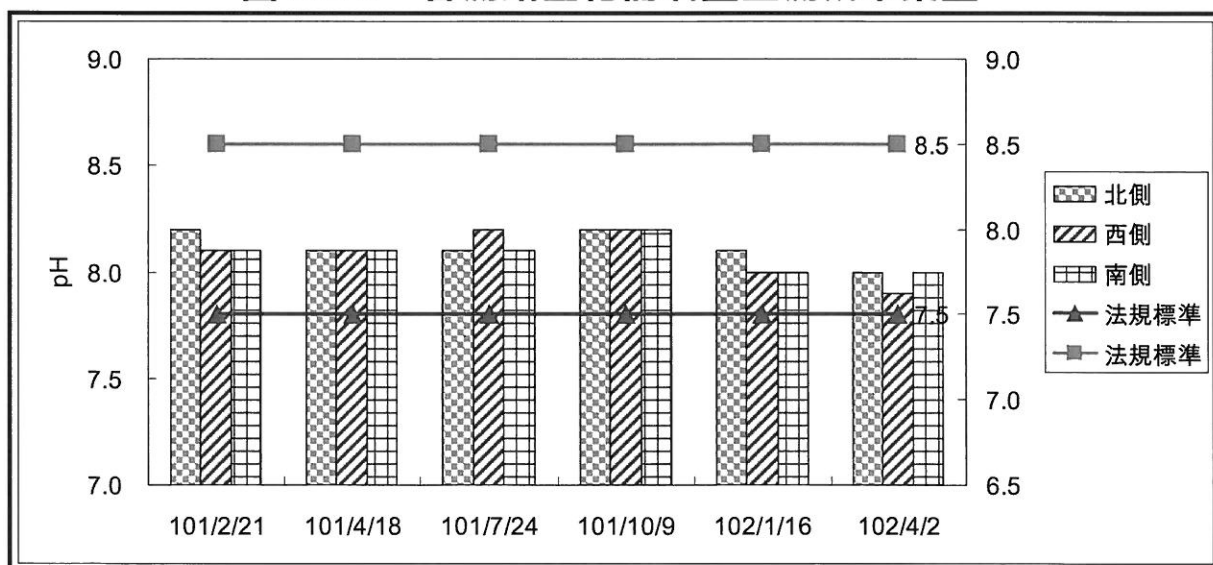


圖 2.2-6 各測站 pH 監測成果彙整

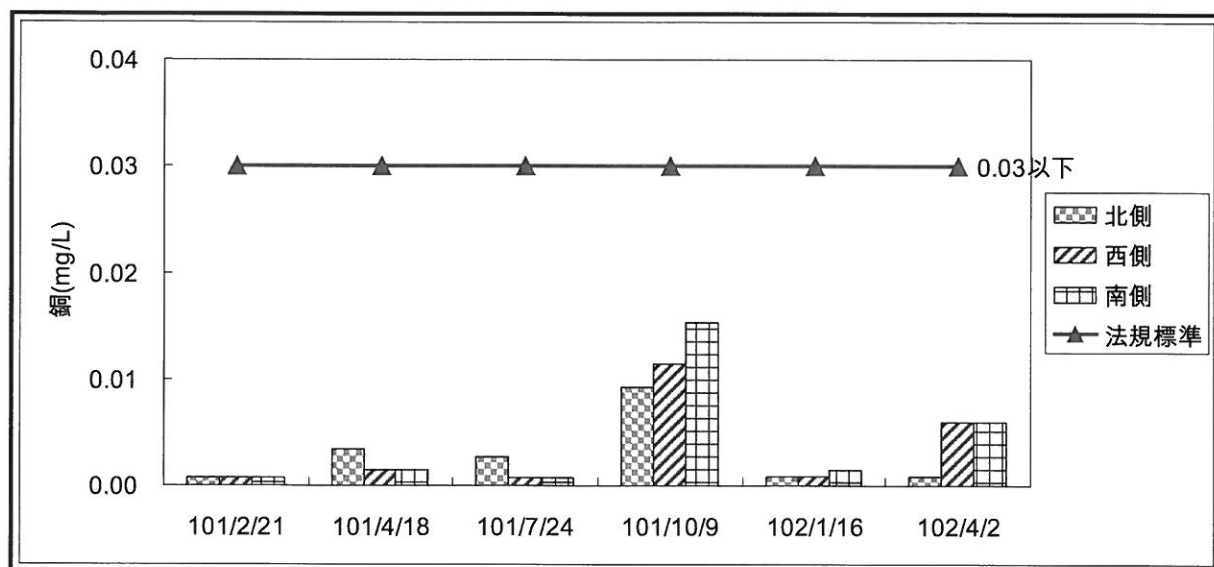


圖 2.2-7 各測站銅監測成果彙整

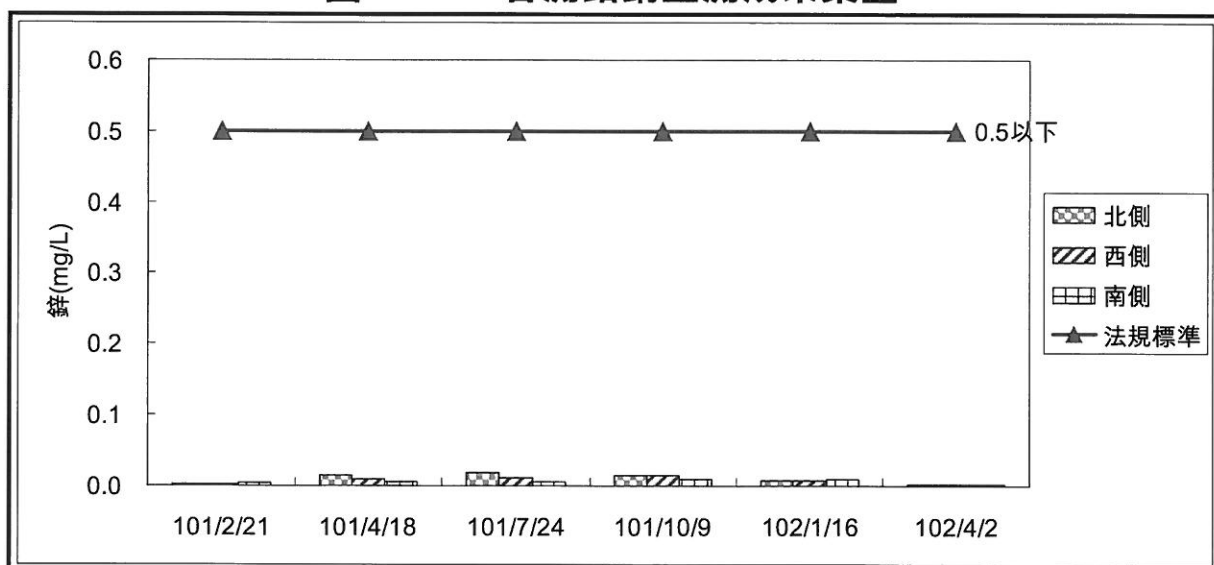


圖 2.2-8 各測站鋅監測成果彙整

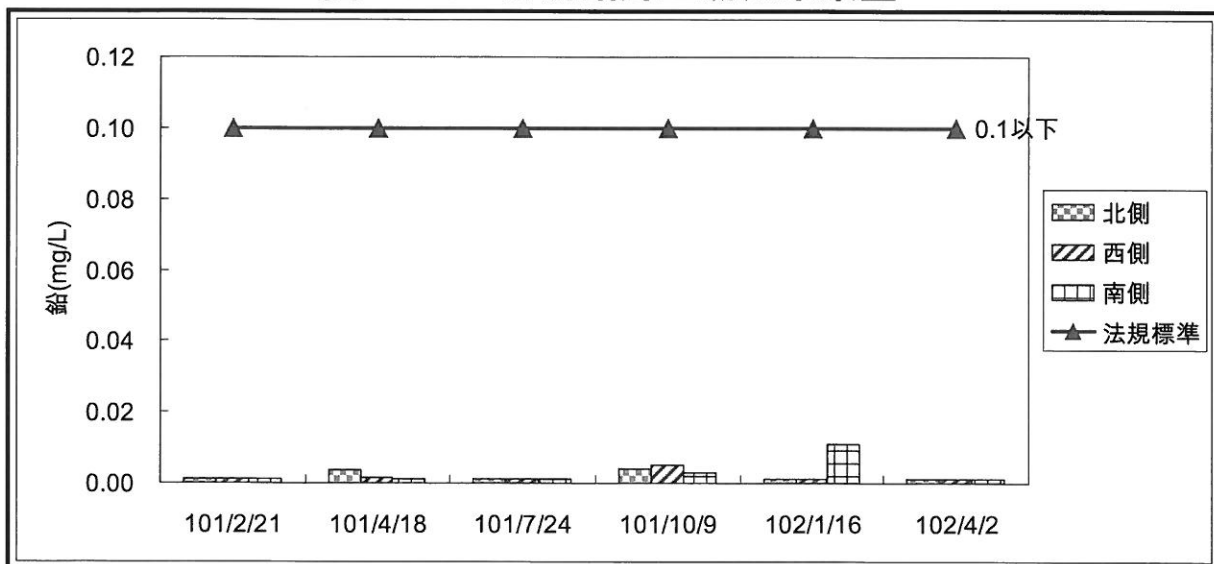


圖 2.2-9 各測站鉛監測成果彙整

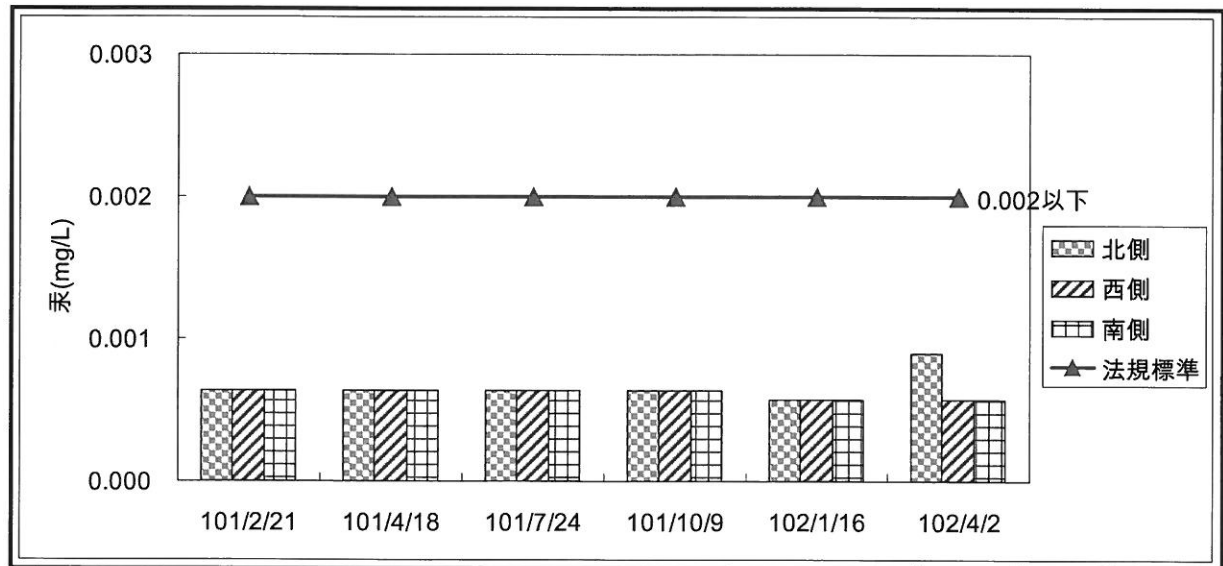


圖 2.2-10 各測站汞監測成果彙整

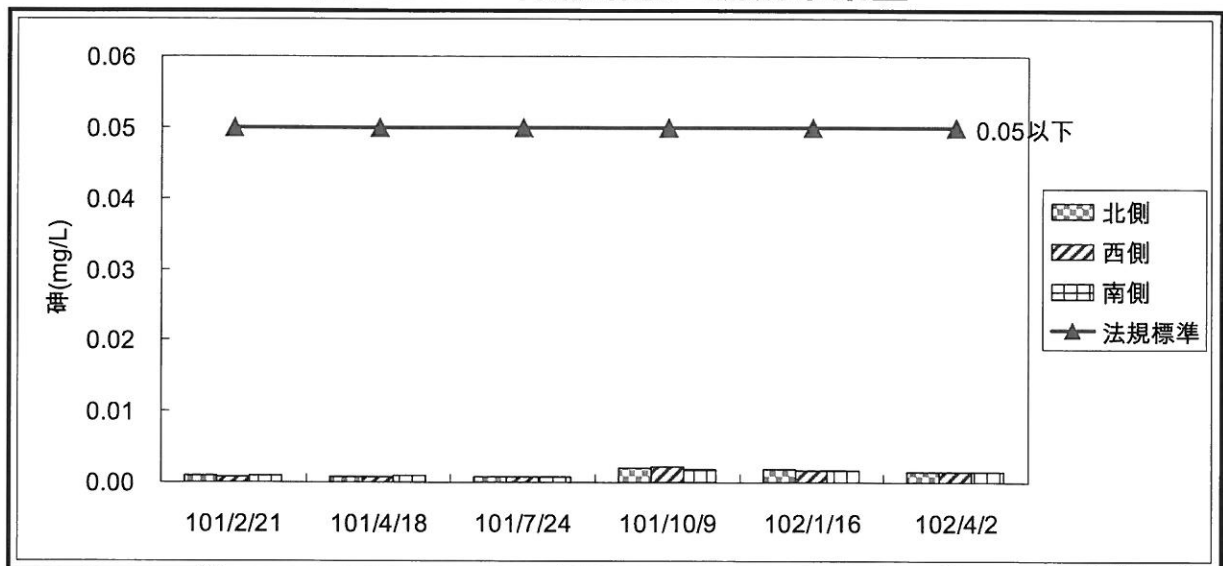


圖 2.2-11 各測站砷監測成果彙整

第三章、檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.2 建議事項

第三章、檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

一、監測結果綜合檢討、分析

有關本季(102 年第 2 季)與上季(102 年第 1 季)之空氣品質及海域水質監測成果如表 3.1-1~2 所示，分述如下：

(一)空氣品質

1.氣象

(1)風向：本季盛行風向為西風，上季為北北西風。

(2)風速：本季之日平均風速為 8.0 m/s，上季為 5.5 m/s，風向之差異主要係受季節變化之影響。

2.空氣品質

(1)總懸浮微粒(TSP)

本季調查結果，總懸浮微粒(TSP)之 24 小時值為 182 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，上季為 126 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，本季測值較上季高，主要係受境外傳輸影響，監測結果均符合空氣品質 250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之標準值。

(2)懸浮微粒(PM₁₀)

本季調查結果，粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 懸浮微粒(PM₁₀)之日平均值為 87 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，上季為 67 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，本季測值較上季高，主要係受境外傳輸影響，監測結果均符合空氣品質 125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之標準值。

(3)二氧化氮(NO₂)

本季調查結果，二氧化氮(NO₂)之小時平均最大值為 0.013 ppm，上季為 0.020 ppm，本季測值較上季減少 0.007 ppm，變化不大，監測結果均符合空氣品質 0.25 ppm 之標準值。

(4)二氧化硫(SO₂)

本季調查結果，二氧化硫(SO₂)之小時平均最大值均為 0.002 ppm，上季為 0.005 ppm，本季測值較上季減少 0.003 ppm，另於日平均值方面，本季為 0.001 ppm，上季為 0.002 ppm，本季測值較上季減少 0.001 ppm，監測結果均符合空氣品質小時平均值 0.25 ppm 及日平均值 0.1 ppm 之標準值。

(5)一氧化碳(CO)

本季調查結果，一氧化碳(CO)之小時平均最大值及八小時平均最大值均為 0.7 ppm，上季均為 0.5 ppm，本季測值較上季增加 0.2 ppm，變化不大，監測結果均符合空氣品質小時平均值 35 ppm 及八小時平均值 9 ppm 之標準值。

表 3.1-1 空氣品質本季與上季監測成果比較

項目	最頻風向 (deg)	平均 風速 (m/s)	總懸浮微粒 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 24 小時值	粒徑 $\leq 10 \mu\text{m}$ 之懸浮微粒(PM_{10}) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) 日 平 均 值	二氧化氮 (ppm)		二氧化硫 (ppm)		一氧化碳 (ppm)	
					小時平均 最大值	日平均值	小時平均 最大值	小時平均 最大值	小時平均 最大值	最大 8 小時 平均值
本季 (102 年第 2 季) 102/04/02~03	西風	8.0	182	87	0.013	0.001	0.002	0.7	0.7	0.7
上季 (102 年第 1 季) 102/01/15~16	北北西風	5.5	126	67	0.020	0.002	0.005	0.5	0.5	0.5
差異	--	+2.5	+56	+20	-0.007	-0.001	-0.003	+0.2	+0.2	+0.2
法規標準	--	--	250	125	0.25	0.1	0.25	35	9	9

註：1. 監測單位：臺諡科技股份有限公司(行政院環保署認可証字號第 012 號)。
2. 空氣品質標準，行政院環境保護署，101.05.14 環署空字第 1010038913 號令修正發布。

(二)海域水質

1.水溫

本季調查結果，各測站水溫之測值介於 23.6~23.8 °C 之間，上季測值介於 19.0~19.2 °C，本季較上季增加 4.4~4.7 °C，另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 19.5 °C，水溫之差異主要係受季節變化之影響。

2.透明度

本季調查結果，各測站透明度之測值介於 70~90 cm 之間，上季測值介於 70~80 cm，測值差異變化不大。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 140 cm，與本季測值相較差異變化不大。

3.溶氧量(DO)

本季調查結果，各測站溶氧量(DO)之測值均為 5.3 mg/L，上季測值均為 6.7 mg/L 測值差異變化不大，均符合乙類海域環境標準 5.0 mg/L 以上標準值。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 6.79 mg/L，與本季測值相較差異變化不大。

4.鹽度

本季調查結果，各測站鹽度之測值介於 33.5~33.7 psu 之間，上季測值介於 34.2~34.3 psu，測值差異變化不大。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 33.7 psu，與本季測值相較差異變化不大。

5.生化需氧量(BOD)

本季調查結果，各測站生化需氧量(BOD)之測值介於 0.7~0.9 mg/L 之間，上季測值介於 1.1~1.3 mg/L，各測站測值差異變化不大，均符合乙類海域環境標準 3 mg/L 以下標準值。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 2.1 mg/L，最大測值為 3.7 mg/L，工業區之最大測值略高於管制標準。

6.pH 值

本季調查結果，各測站 pH 值之測值介於 7.9~8.0 之間，上季測值介於 8.0~8.1，差異變化不大，符合乙類海域環境標準 7.5~8.5 標準值。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 8.1，與本季測值相較差異變化不大。

7.重金屬

(1)銅(Cu)：本季調查結果，各測站銅(Cu)之測值介於 0.0006(方法偵測極限)~0.0009 mg/L 之間，上季測值介於 0.0009~0.0015 mg/L，差異變化不大，均符合乙類海域環境標準 0.03 mg/L。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 0.0028 mg/L，最大測值為 0.0054 mg/L，工業區之最大測值高於管制標準。

表 3.1-2 海域水質各測站本季、上季與彰濱工業區監測成果比較

監測項目		水溫	透明度	溶氧量	鹽度	生化需氧量	pH 值	重金屬							
								銅	砷	鋅	鉛	鎘	鉻	汞	砷
本季 (102 年第 2 季)	北側	23.8	90	5.3	33.5	0.9	8.0	0.0009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009	0.0014
	西側	23.6	70	5.3	33.7	0.7	7.9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
	南側	23.8	80	5.3	33.6	0.7	8.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
上季 (102 年第 1 季)	北側	19.1	80	6.7	34.2	1.2	8.1	0.0009	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0018
	西側	19.0	70	6.7	34.2	1.3	8.0	0.0009	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0017
	南側	19.2	70	6.7	34.3	1.1	8.0	0.0015	N.D.	0.009	0.011	N.D.	N.D.	N.D.	0.0016
差異 (本季-上季)	北側	4.7	10	-1.4	-0.7	-0.3	-0.1	0	0	-0.00708	0	0	0	+0.000325	-0.0004
	西側	4.4	0	-1.4	-0.6	-0.4	-0.1	-0.0003	0	-0.00708	0	0	0	0	-0.0002
	南側	4.6	10	-1.4	-0.7	-0.4	0	-0.0009	0	-0.00808	-0.01004	0	0	0	-0.0001
101 年方法偵測極限		-	-	-	-	-	-	0.00069	0.0059	0.00091	0.00101	0.00062	0.0006	0.000638	0.000075
102 年方法偵測極限		-	-	-	-	-	-	0.00060	0.0054	0.00092	0.00096	0.00066	0.0125 ^{#3}	0.000575	0.00010
彰濱工業區 102 年第 1 季 (01~03 月)	最大值	21.6	230	7.92	34.5	3.7	8.2	0.0054	<0.0002	0.0186	<0.0060	<0.0003	<0.0010	<0.0003	0.0018
	最小值	17.6	93	4.73	33.2	<2.0	8.0	<0.0010	<0.0002	<0.0060	<0.0020	<0.0003	<0.0004	<0.0001	0.0011
	平均值	19.5	140	6.79	33.7	2.1	8.1	0.0028	<0.0002	0.0073	0.0031	<0.0003	0.0006	0.0003	0.0014
乙類 海域環境標準		-	-	5.0 以上	-	3 以下	7.5~8.5	0.03	0.05	0.5	0.1	0.01	0.05	0.002	0.05

註：1. 監測單位：臺諮科技股份有限公司(行政院環保署認可証字號第 012 號)。
 2. 海域環境分類及海洋環境標準，行政院環境保護署，90.10.26(90)環署水字第 0081750 號。
 3. QDL 定量偵測極限。

- (2) 鋅(Zn)：本季調查結果，各測站鋅(Zn)之測值均小於方法偵測極限(0.00092 mg/L)，上季測值介於 0.008~0.009 mg/L，差異變化不大，均符合乙類海域環境標準 0.5 mg/L。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 0.0073 mg/L，與本季測值相較差異變化不大。
- (3) 鉛(Pb)：本季調查結果，各測站鉛(Pb)之測值均小於方法偵測極限(0.00096 mg/L)，上季測值介於方法偵測極限(0.00096 mg/L)~0.011 mg/L 之間，差異變化不大，均符合乙類海域環境標準 0.1 mg/L。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 0.0031 mg/L，與本季測值相較差異變化不大。
- (4) 汞(Hg)：本季調查結果，各測站汞(Hg)之測值介於方法偵測極限(0.000575 mg/L)~0.0009 mg/L，上季測值均小於方法偵測極限(0.000575 mg/L)，差異變化不大，均符合乙類海域環境標準 0.02 mg/L。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 0.0003 mg/L，與本季測值相較差異變化不大。
- (5) 砷(As)：本季調查結果，各測站砷(As)之測值介於 0.0014~0.0015 mg/L，上季測值介於 0.0016~0.0018 mg/L，各測站測值差異變化不大，均符合乙類海域環境標準 0.05 mg/L。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 0.0014 mg/L，與本季測值相較差異變化不大。
- (6) 硒(Se)、鎘(Cd)、鉻(Cr)：本季調查結果與上季調查結果相同，各重金屬之測值均小於方法偵測極限，未產生差異。另參考彰濱工業區 102 年第 1 季(01~03 月)之平均測值為 0.0014 mg/L，與本季測值相較差異變化不大。

二、監測結果異常現象因應對策

本案之環境監測執行計畫，自民國 101 年 1 月開始執行，累計至 102 年 6 月，共計完成六季環境監測報告(包含施工前環境監測)，監測執行迄今，監測項目包括：空氣品質及海域水質，監測結果皆符合相關法令標準，期間並未有任何異常值之情況發生，無環境品質惡化之情況發生。

表 3.1-3 上次之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
無異常狀況發生	持續進行監測	本季空氣品質及海域水質監測結果，各監測項目之測值差異變化不大，均符合空氣品質及乙類海域水質標準。

附 錄

附錄一、檢測執行單位之認證資料

附錄二、採樣與分析方法

附錄三、品保/品管查核記錄與原始數據

附錄四、監測照片

**附錄五、歷次環保機關審查意見及辦理
情形說明對照表**

附錄一、檢測執行單位之認證資料


監測類別	執行單位	環保署認證資料	環保署認可之檢測項目	
空氣檢測類	營諮科技股份有限公司	環署檢字第012A號	1.排放管道中排氣流速檢測：(NIEA A101) 2.排放管道中粒狀污染物：(NIEA A101) 3.空氣中粒狀污染物：(NIEA A102) 4.空氣中粒狀污染物(自動測定)：(NIEA A206) 5.空氣中鉛及其化合物：(NIEA A301) 6.排放管道中氮氧化物(自動測定)：(NIEA A411) 7.排放管道中二氧化硫(自動測定)：(NIEA A413) 8.排放管道中二氧化碳(自動測定)：(NIEA A415) 9.空氣中二氧化硫(自動測定)：(NIEA A416) 10.空氣中氮氧化物(自動測定)：(NIEA A417) 11.空氣中臭氣(自動測定)：(NIEA A420) 12.空氣中一氧化碳(自動測定)：(NIEA A421) 13.空氣中氯氣：(NIEA A425)	14.空氣中溴氣(NIEA A425) 15.排放管道中氧氣(自動測定)：(NIEA A432) 16.空氣中氟化氫(氫氟酸)：(NIEA A435) 17.空氣中硫酸：(NIEA A435) 18.空氣中氯化氫(鹽酸)：(NIEA A435) 19.空氣中硝酸：(NIEA A435) 20.空氣中溴化氫(氫溴酸)：(NIEA A435) 21.空氣中磷峻 NIEA A435) 22.排放管道中氫氟酸：(NIEA A452) 23.排放管道中硫酸：(NIEA A452) 24.排放管道中硝酸：(NIEA A452) 25.排放管道中磷酸：(NIEA A452) 26.排放管道中鹽酸：(NIEA A452) 27.排放管道中一氧化碳(自動測定)：(NIEA A704) 28.排放管道中非甲烷總碳氫化合物(自動測定)：(NIEA A723) 29.排放管道中總碳氫化合物(自動測定)：(ME A723)

監測類別	執行單位	環保署認證資料	環保署認可之檢測項目	
水質水量檢測類	營諮科技股份有限公司	環署檢字第 012A 號	1.大腸桿菌群：(NIEA E202) 2.水量：(NIEA W022) 3.事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)：(NIEA W109) 4.導電度：(NIEA W203) 5.總溶解固體物：(NIEA W210) 6.懸浮固體：(NIEA W210) 7.水溫：(NIEA W217) 8.真色色度：(NIEA W223) 9.溶解性鐵：(NIEA W305) 10.鉛：(NIEA W306) 11.銀：(NIEA W306) 12.銅：(NIEA W306) 13.鋅：(NIEA W306) 14.錳：(NIEA W306) 15.總鉻：(NIEA W306) 16.鎳：(NIEA W306) 17.鎘：(NIEA W306) 18.鐵：(NIEA W306) 19.硒：(NIEA W311) 20.鉛：(NIEA W311) 21.鉬：(NIEA W311) 22.銀：(NIEA W311) 23.銅：(NIEA W311) 24.銻：(NIEA W311) 25.鋅：(NIEA W311) 26.鋁：(NIEA W311) 27.錳：(NIEA W311) 28.總鉻：(NIEA W311) 29.鎳：(NIEA W311) 30.鎘：(NIEA W311) 31.鎳：(NIEA W311) 32.鐵：(NIEA W311) 33.海水中鉛：(NIEA W308)/(NIEA W311) 34.海水中銅：(NIEA W308)/(NIEA W311) 35.海水中鋅：(NIEA W308)/(NIEA W311) 36.海水中錳：(NIEA W308)/(NIEA W311) 37.海水中鎘：(NIEA W308)/(NIEA W311) 38.六價鉻：(NIEA W320) 39.六價鉻：(NIEA W321)	40.汞：(NIEA W330) 41.硼：(NIEA W404) 42.氯鹽：(NIEA W406) 43.總餘氯：(NIEA W408) 44.氟鹽：(NIEA W413) 45.正磷酸鹽：(NIEA W415) 46.亞硝酸鹽氮(NIEA W415) 47.硫酸鹽：(NIEA W415) 48.氯鹽：(NIEA W415) 49.硝酸鹽氮：(NIEA W415) 50.亞硝酸鹽氮：(NIEA W418) 51.溶氧量：(NIEA W422) 52.總氮：(NIEA W423) 53.氫離子濃度指數(pH 值)：(NIEA W424) 54.正磷酸鹽：(NIEA W427) 55.總磷：(NIEA W427) 56.硫化物：水(NIEA W438) 57.砷：(NIEA W434) 58.氨氮：(NIEA W437) 59.氰化物：(NIEA W441) 60.氨氮：(NIEA 取 48) 61.凱氏氮：(NIEA W451) 62.溶氧量：(NIEA W455) 63.油脂：(NIEA W505) 64.生化需氧量：(NIEA W510) 65.海水中化學需氧量：(NIEA W514) 66.化學需氧量：(NIEA W515) 67.含高鹵離子化學需氧量：(NIEA W516) 68.酚類：(NIEA W521) 69.陰離子界面活性劑：(NIEA W525) 70.總有機碳：(NIEA W530) 71.1,1,1-三氯乙烷：(NIEA W785) 72.1,1-二氯乙烯：(NIEA W785) 73.1,2-二氯乙烷：(NIEA W785) 74.三氯乙烯：(NIEA W785) 75.四氯化碳：(NIEA W785) 76.苯：(NIEA W785) 77.氯乙烯：(NIEA W785) 78.對-二氯苯：(NIEA W785) 79.總三鹵甲烷：(NIEA W785) 80.總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：(NIEA W785)



行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

瑩諮科技股份有限公司
檢驗測定機構管理辦法
此證。

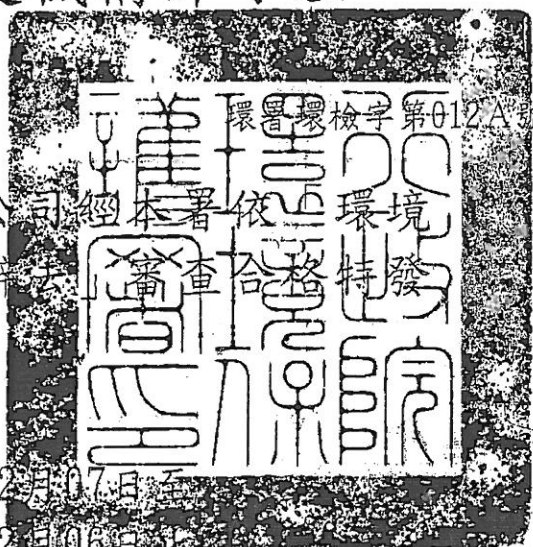

本證有效期限自101年12月07日至
106年12月06日止

許可證內容詳見副頁

署長 沈世宏

中華民國102年1月9日



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第1頁共3頁

檢驗室名稱：瑩諮科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：臺北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：胡欣

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 1、排放管道中排氣流速檢測：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
 - 2、排放管道中粒狀污染物：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
 - 3、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法—高量採樣法 (NIEA A102)
 - 4、空氣中粒狀污染物（自動測定）：空氣中粒狀污染物自動檢測方法—貝他射線衰減法 (NIEA A206)
 - 5、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法—火焰式、石墨式原子吸收光譜法 (NIEA A301)
 - 6、排放管道中氮氧化物（自動測定）：排放管道中氮氧化物自動檢測方法—儀器分析法 (NIEA A411)
 - 7、排放管道中二氧化硫（自動測定）：排放管道中二氧化硫抽取式自動檢測方法—非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（非分散性紅外光法） (NIEA A413)
 - 8、排放管道中二氧化碳（自動測定）：排放管道中二氧化碳自動檢測法—NDIR法 (NIEA A415)
 - 9、空氣中二氧化硫（自動測定）：空氣中二氧化硫自動檢驗方法—紫外光螢光法 (NIEA A416)
 - 10、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法—化學發光法 (NIEA A417)
 - 11、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法—紫外光吸收法 (NIEA A420)
 - 12、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法—紅外線法 (NIEA A421)
 - 13、空氣中氯氣：空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A425)
 - 14、空氣中溴氣：空氣中氯氣及溴氣之檢測方法—離子層析電導度法 (NIEA A425)
- （續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁


環署環檢字第012A號

第2頁共3頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

- 15、排放管道中氧氣（自動測定）：排放管道中氧自動檢測方法-儀器分析法（NIEA A432）
 - 16、空氣中氟化氫（氫氟酸）：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435）
 - 17、空氣中硫酸：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435）
 - 18、空氣中氟化氫（鹽酸）：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435）
 - 19、空氣中硝酸：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435）
 - 20、空氣中溴化氫（氫溴酸）：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435）
 - 21、空氣中磷酸：空氣中無機酸類之檢測方法-離子層析電導度法（NIEA A435）
 - 22、排放管道中氫氟酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法（NIEA A452）
 - 23、排放管道中硫酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法（NIEA A452）
 - 24、排放管道中硝酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法（NIEA A452）
 - 25、排放管道中磷酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法（NIEA A452）
 - 26、排放管道中鹽酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法-等速吸引法（NIEA A452）
 - 27、排放管道中一氧化碳（自動測定）：排放管道中一氧化碳自動檢驗法-非分散性紅外線法（NIEA A704）
 - 28、排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法-線上火燄離子化偵測法（NIEA A723）
- （續接空氣檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第3頁共3頁

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

29、排放管道中總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳
氫化合物含量自動檢測方法-線上火燄離子化偵測法（NIEA A723）
（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署101年11月30日環署檢字第1010109727號函辦理。





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第1頁共5頁

檢驗室名稱：瑩諮科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：臺北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：胡欣

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法—濾膜法 (NIEA E202)
- 2、水量：水量測定方法—流速計法 (NIEA W022)
- 3、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
- 4、導電度：水中導電度測定方法—導電度計法 (NIEA W203)
- 5、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 6、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 7、水溫：水溫檢測方法 (NIEA W217)
- 8、真色色度：水中真色色度檢測方法—分光光度計法 (NIEA W223)
- 9、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W305)
- 10、鉛：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 11、銀：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 12、銅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 13、鋅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 14、錳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 15、總鉻：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 16、鎳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法—火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)

(續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第2頁共5頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 17、鎘：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 18、鐵：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA W306)
- 19、硒：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 20、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 21、鉬：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 22、銀：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 23、銅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 24、銻：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 25、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 26、鋁：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 27、錳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 28、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 29、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 30、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 31、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 32、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 33、海水中鉛：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308) / 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 34、海水中銅：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308) / 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 35、海水中鋅：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308) / 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 36、海水中錳：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308) / 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)

(續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁


環署環檢字第012A號

第3頁共5頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 37、海水中鎘：海水中鎘、鉛、銅、鐵、錳、鎳、鋅及鋅檢測前處理方法-鉍合離子交換樹脂濃縮法 (NIEA W308) / 水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
 - 38、六價鉻：水中六價鉻檢測方法-比色法 (NIEA W320)
 - 39、六價鉻：水中六價鉻檢測方法-APDC整合MIBK萃取原子吸收光譜法 (NIEA W321)
 - 40、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)
 - 41、硼：水中硼檢測方法-薑黃素比色法 (NIEA W404)
 - 42、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法 (NIEA W406)
 - 43、總餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法 (NIEA W408)
 - 44、氟鹽：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法 (NIEA W413)
 - 45、正磷酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 46、亞硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 47、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 48、氯鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 49、硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA W415)
 - 50、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法 (NIEA W418)
 - 51、溶氧量：水中溶氧檢測方法-碘定量法 (NIEA W422)
 - 52、總氮：水中總氮檢測方法 (NIEA W423)
 - 53、氫離子濃度指數 (pH值)：水中氫離子濃度指數測定方法-電極法 (NIEA W424)
 - 54、正磷酸鹽：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
 - 55、總磷：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法 (NIEA W427)
 - 56、硫化物：水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法 (NIEA W433)
 - 57、砷：水中砷檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
 - 58、氨氮：水中氨氮之流動分析法-靛酚法 (NIEA W437)
 - 59、氰化物：水中總氰與弱酸可分解氰之流動注入分析法-比色法 (NIEA W441)
 - 60、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法 (NIEA W448)
 - 61、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法 (NIEA W451)
 - 62、溶氧量：水中溶氧檢測方法-電極法 (NIEA W455)
 - 63、油脂：水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法 (NIEA W505)
 - 64、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法 (NIEA W510)
 - 65、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W514)
- (續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第4頁共5頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

- 66、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W515)
 - 67、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法 (NIEA W516)
 - 68、酚類：水中總酚檢測方法-分光光度計法 (NIEA W521)
 - 69、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (NIEA W525)
 - 70、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法 (NIEA W530)
 - 71、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 72、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 73、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 74、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 75、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 76、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 77、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 78、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 - 79、總三鹵甲烷—一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- (續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第012A號

第5頁共5頁

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

80、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
（以下空白）

其他註記事項：

- 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
- 2、許可事項依據本署101年11月30日環署檢字第1010109727號及102年3月5日環署檢字第1020018116號函辦理。



附錄二、採樣與分析方法

一、採樣方法

採樣作業準則

採樣項目	作業準則
空氣品質	▶ 監測站宜尋找空曠地點，附近儘可能遠離建築物及樹林。 ▶ 遠離交通要道，以避免受交通工具排放污染物之影響。 ▶ 須有便利之電源供應及容量應符合需要。 ▶ 測站附近不應有大型工作機具。
海域水質	▶ 每次採樣前由實驗室計畫負責人先行收集相關天候、漲退潮資訊。 ▶ 採集水質混合。以採集穩定混合均勻且具代表性水樣為主。

空氣品質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
現場記錄	▶ 了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。	▶ 必須將氣象資料，周界環境因子詳加記載。
穩定/校正	▶ 確保分析所得之數據具有代表性。	▶ 使用儀器前必須先經流量校正
採樣	▶ 採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。	▶ 使用測定前預先開機運轉至流量穩定，才開始測定 24 小時之值。
運送空白	▶ 為確保分析結果之正確性，每次均有一組運送空白樣品。	▶ 以運送空白，瞭解運送過程之完整性。
儲存/運送	▶ 避免樣品因儲存時間過久或是運送不當，造成品質變化。	▶ 依照環保署所公告規定項目保存方式加以運送保存，並注意密封時之完整性。

海域水質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
清洗採樣設備	▶ 洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	▶ 須用試劑水清洗採樣器。
採樣	▶ 自水體採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	▶ 在採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧等，宜避免有氣泡殘存。
現場測定	▶ 為確保取出樣品為具代表性一些指標於取樣後應盡速分析。	▶ pH 值、導電度及溫度應於現場立即進行分析。
樣品保存與運輸	▶ 樣品分析前應依樣品保存方式，予以保存，俾使化學性質變化減至最小。	▶ 須遵照環檢所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析。

二、分析方法

空氣品質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法 偵測極限	儀器 偵測極限	重複 分析	添加回收率 (%)
風向	—	—	0~360 度	—	—
風速	—	—	0.5~20 m/s	—	—
總懸浮微粒(TSP)	NIEA A102.12A	—	1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—
粒徑 $\leq 10\mu\text{m}$ 之懸浮微粒(PM ₁₀)	NIEA A206.10C	—	10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	—	—
二氧化氮(NO ₂)	NIEA A417.11C	—	1.0 ppb	—	—
二氧化硫(SO ₂)	NIEA A416.11C	—	1.0 ppb	—	—
一氧化碳(CO)	NIEA A421.11C	—	0.1 ppm	—	—

海域水質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	重複分析 (%)	添加回收率 (%)	查核回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	—	$\pm 0.5^\circ\text{C}$	—	—
透明度	NIEA E220.50C	—	—	—	—
溶氧(DO)	NIEA W455.52C	—	0~6.1	—	—
鹽度	NIEA W447.20C	—	—	—	—
生化需氧量(BOD)	NIEA W510.55B	—	0~10.0	—	85~114
pH	NIEA W424.52A	—	± 0.1	—	—
銅(Cu)	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	0.00060 mg/L	0~11.5	80~115	84~112
鋅(Zn)		0.00092 mg/L	0~8.5	85~115	82~114
鉛(Pb)		0.00096 mg/L	0~7.3	85~116	82~115
鎘(Cd)		0.00066 mg/L	0~6.1	83~115	83~115
硒(Se)	NIEA W311.52C	0.0054 mg/L	0~8.8	86~120	88~112
鉻(Cr)	NIEA W311.52C	0.0125 mg/L	0~8.8	84~118	83~112
汞(Hg)	NIEA W330.52A	0.000575 mg/L	0~7.1	84~115	82~115
砷(As)	NIEA W434.53B	0.00010 mg/L	0~8.1	85~115	81~116

附錄三、品保/品管查核記錄與原始數據

瑩諮科技股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第012A號

地址：台北市內湖區瑞光路2號5樓 電話：(02) 2794-8833

空氣品質監測報告

計畫名稱：彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

委託單位：創迅科技股份有限公司

報告編號：EL02AB0183

樣品別：空氣

採樣日期：102年04月02~03日

採樣單位：瑩諮科技股份有限公司

收樣日期：102年04月08日

採樣地點：如報告

報告日期：102年05月13日

聯絡人：賴海源

聲明書

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：瑩諮科技股份有限公司

檢驗報告專用章

瑩諮科技(股)公司

負責人(簽名或蓋章)：楊炯浩

負責人：楊炯浩

檢驗室主任：胡欣

檢驗室主管

空氣採樣類

無機檢測類

有機檢測類

(簽名)

報告簽署人(簽名)

報告簽署人(簽名)

報告簽署人(簽名)

胡欣

楊炯浩

(ELA- 01)

(ELI-)

(ELO-)

備註：

1、本報告共 2 頁，不得作為法律訴訟用，報告內容不得隨意複製或作為商業廣告之用。

空氣品質逐時監測成果

計畫名稱：彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

委託單位：創迅科技股份有限公司

監測日期：102.04.02~102.04.03

執行單位：瑩諮科技股份有限公司

監測人員：陳南州、林俊秀

監測位置：基地

天氣狀況：晴

時間 \ 項目		風向 deg	風速 m/s	PM ₁₀ μg/m ³	NO ₂ ppm	SO ₂ ppm	CO ppm	TSP μg/m ³
16 :00~ 17 :00		西南西	11.3	88	0.0105	0.0009	0.5	182
17 :00~ 18 :00		西南西	11.0	96	0.0113	0.0012	0.6	
18 :00~ 19 :00		西	11.0	108	0.0105	0.0018	0.6	
19 :00~ 20 :00		西	10.8	106	0.0117	0.0019	0.7	
20 :00~ 21 :00		西	10.1	103	0.0099	0.0014	0.7	
21 :00~ 22 :00		西	9.1	86	0.0084	0.0011	0.7	
22 :00~ 23 :00		西	9.0	59	0.0080	0.0012	0.6	
23 :00~ 24 :00		西南西	8.9	98	0.0063	0.0007	0.7	
00 :00~ 01 :00		西	8.7	97	0.0084	0.0008	0.7	
01 :00~ 02 :00		西	7.6	100	0.0071	0.0005	0.7	
02 :00~ 03 :00		西	8.5	91	0.0051	0.0002	0.6	
03 :00~ 04 :00		西	8.1	67	0.0081	0.0005	0.6	
04 :00~ 05 :00		西	5.5	79	0.0130	0.0014	0.6	
05 :00~ 06 :00		西南西	6.5	77	0.0061	0.0005	0.5	
06 :00~ 07 :00		西南西	7.8	67	0.0054	0.0004	0.4	
07 :00~ 08 :00		西南西	8.7	66	0.0039	0.0001	0.4	
08 :00~ 09 :00		西	6.3	62	0.0103	0.0006	0.5	
09 :00~ 10 :00		西南西	5.0	65	0.0096	0.0005	0.5	
10 :00~ 11 :00		西南西	5.2	62	0.0095	0.0004	0.5	
11 :00~ 12 :00		北北西	5.9	97	0.0096	0.0004	0.6	
12 :00~ 13 :00		北	6.1	104	0.0080	0.0005	0.5	
13 :00~ 14 :00		北	6.3	101	0.0072	0.0003	0.5	
14 :00~ 15 :00		北北西	6.4	104	0.0067	0.0003	0.5	
15 :00~ 16 :00		北北西	8.1	109	0.0031	0.0006	0.4	
最大小時平均值		*	11.3	109	0.0130	0.0019	0.7	
最大8小時平均值		*	*	*	*	*	0.7	
日平均值		*	8.0	87	0.0082	0.0008	0.6	
空氣品質 標準值	小時平均值	*	*	*	0.25	0.25	35	250μg/m ³ 24小時 標準值
	日平均值	*	*	125	*	0.1	*	
	8小時平均值	*	*	*	*	*	*	
檢驗室主任：胡 欣			品保品管：鐘美紅			檢驗報告專用章 瑩諮科技(股)公司 林俊秀		

周界儀器自動監測資料轉交表

監測日期		102.4.2-102.4.7		監測人員		林俊昇, 陳南州	
計畫名稱		彰濱工業區線西面3區施工階段環境監測					
委樣編號		測定點位置名稱		測定點監測日期			
ELOZAB0183		基地		102.4.2-102.4.7			
監測項目		資料內容		監測項目		資料內容	
☒ NO _x		☒ 儀器原始數據 ☐ 儀器多點校正記錄 ☒ 儀器零點/高幅校正記錄 ☐ 其他 _____		☒ SO ₂		☒ 儀器原始數據 ☐ 儀器多點校正記錄 ☒ 儀器零點/高幅校正記錄 ☐ 其他 _____	
☒ CO		☒ 儀器原始數據 ☐ 儀器多點校正記錄 ☒ 儀器零點/高幅校正記錄 ☐ 其他 _____		☒ HC		☒ 儀器原始數據 ☐ 儀器多點校正記錄 ☒ 儀器零點/高幅校正記錄 ☐ 其他 _____	
☒ O ₃		☒ 儀器原始數據 ☐ 儀器多點校正記錄 ☒ 儀器零點/高幅校正記錄 ☐ 其他 _____		☒ PM ₁₀		☒ 儀器原始數據 ☒ 儀器校正記錄 ☐ 其他 _____ ☐ 其他 _____	
☒ TSP ☐ Pb		☒ HV採樣記錄表 ☒ HV校正記錄 ☐ 其他 _____ ☐ 其他 _____		☐ 噪音		☐ 儀器原始數據 ☐ 儀器校正記錄 ☐ 其他 _____ ☐ 其他 _____	
☐ 其他		☐ 監測狀況紀錄表 ☐ 儀器校正記錄 ☐ 其他 _____ ☐ 其他 _____		☐ 振動		☐ 儀器原始數據 ☐ 儀器校正記錄 ☐ 其他 _____ ☐ 其他 _____	

空氣品質監測計畫書

委託編號:	ZL02AB0183		
初勘日期: 101.10.8	初勘人員: 林俊秀	監測頻率: *	次/□月■季 共計 * 次
檢測目的: ☒ 定期監測 ☐ 稽查監測 ☐ 申請許可 ☐ 改善完成 ☐ 自行評鑑 ☐ 其他			

一、委託單位與計畫基本資料

委託單位: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測	聯絡人: 劉治桓	聯絡電話: 02-82217666*204
計畫名稱: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測	聯絡人: *	聯絡電話: *
計畫位址: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測		

二、監測要求

監測位置	監測項目與方法				電源
基地	☒ CO	NIEA A421.11C	☒ CH ₄ /THC		☐ 110V ☒ 220V ☐ 發電機
	☒ SO ₂	NIEA A416.11C	☒ 氣象		☐ 其他
	☒ NO/NO ₂	NIEA A417.11C	☒ 落塵		☐ 110V ☐ 220V ☐ 發電機
	☒ O ₃	NIEA A420.11C	☐ 其他		☐ 其他
	☒ TSP	NIEA A102.12A	☐ NIEA		☐ 110V ☐ 220V ☐ 發電機
	☒ PM ₁₀	NIEA A206.10C	☐ NIEA		☐ 其他
	☐ 金屬	NIEA A301.11C	☐ 金屬	NIEA A306	☐ 110V ☐ 220V ☐ 發電機
	☐ 無機酸	NIEA A435.70C	☐ NIEA		☐ 其他

三、儀器設備

☒ CO分析儀	☒ SO ₂ 分析儀	☒ NO _x 分析儀	☒ O ₃ 分析儀	☒ PM ₁₀ 分析儀
☒ THC分析儀	☒ 氣象儀	☒ 高量採樣器	☒ Hi-vol濾紙	☒ 動態稀釋器
☒ 標準氣體	☒ 資料收集器	☒ 校正流量計	☒ 小孔校正器	☒ 大氣壓力計
☐ mini-pump	☐ 矽膠管	☐ 吸收液	☒ H ₂	

四、監測一般事宜

出發日期: 102.4.2	監測日期: 102.4.2~102.4.3	往返交通工具: 1370-EH、2453-UK
監測人員: 林俊秀、陳南州	監督人員隨行: ☒ 是 ☐ 否	

五、作業安全

☒ 警示標誌	☒ 警示帶	☒ 警示燈	☒ 安全帽	☒ 手電筒	☒ 急救箱	☒ 反光背心
--	---	---	---	---	---	--

六、注意事項

監測人員注意墜落、感電、雷擊
監測人員注意行車安全
其他未盡事項以安全第一為首項

品管負責人: 陳南州

測小組負責人: 林俊秀

審核人:

林俊秀

空氣品質監測計畫書(續)

監測位置: <u>基地</u>	監測位置:
監測位置:	監測位置:

空氣品質監測車執行中每日檢查表

檢查人員：

測站位置：

檢查日期：

審核人：

102/4/2

K3526

一、資料蒐集器檢查：	是	否	七、二氧化硫測定儀：	是	否
1.檢查電源是否開啟？	✓		4.檢查測定範圍是否設定在0.5ppm處？	✓	
2.檢查日期時間是否正常？	✓		5.檢查過濾紙是否正常？（太髒則應更換）	✓	
3.檢查測值顯示是否正常？	✓		6.試漏是否<0.2L/min(顯示Flow Alarm)? 0.0 L/min	✓	
二、校正器檢查：	是	否	八、臭氧測定儀：	是	否
1.檢查電源是否開啟？	✓		1.檢查電源是否開啟？	✓	
2.檢查各儀器Sample/CAL管路是否在正確位置？	✓		3.檢查流量是否在範圍之內(0.4~1.0L/min)? 0.8 L/min	✓	
3.檢查流量控制顯示是否正確？	✓		3.檢查測定範圍是否設定在0.5ppm處？	✓	
4.檢查零氣體流量設定值是否正確？	✓		4.檢查Alarm警示燈是否熄滅？如Alarm警示燈亮著將其記錄於後：	✓	
5.檢查高幅校正氣體流量設定值是否正確？	✓		5.檢查過濾紙是否正常？（太髒則應更換）	✓	
三、零氣體產生器檢查：	是	否	6.試漏是否<0.2L/min(顯示Flow Alarm)? 0.0 L/min	✓	
1.檢查電源是否開啟？	✓		九、一氧化碳測定儀：	是	否
2.檢查溫度設定是否在500°C~520°C？	✓		1.檢查電源是否開啟？	✓	
3.檢查溫度控制動作是否正常？ （指示燈一閃一滅或已滅）	✓		2.檢查過濾紙是否正常？（太髒則應更換）	✓	
4.檢查壓力設定是否為20~30psi？	✓		3.檢查流量是否在範圍之內(1.0~2.0L/min)? 1.0 L/min	✓	
5.檢查壓縮幫浦是否有漏水？ 檢查出水口（每日需排水一次）	✓		4.檢查測定範圍是否設定在50ppm處？	✓	
四、風向/風速檢查：	是	否	5.檢查Alarm警示燈是否熄滅？如Alarm警示燈亮著將其記錄於後：	✓	
1.檢查電源是否開啟？	✓		6.試漏是否<0.8L/min(顯示Flow Alarm)? 0.0 L/min	✓	
2.檢查風向/風速是否正對北方？	✓		十、碳氫化合物測定儀：	是	否
五、PM ₁₀ 粉塵測定儀：	是	否	1.檢查電源是否開啟？	✓	
1.檢查電源是否開啟？	✓		3.檢查流量是否在範圍之內(0.6~1.2L/min)? 1.0 L/min	✓	
2.檢查濾紙是否足夠？	✓		3.檢查測定範圍是否設定在50ppm處？	✓	
3.檢查儀器換紙是否正確？	✓		4.檢查Alarm警示燈是否熄滅？如Alarm警示燈亮著將其記錄於後：	✓	
4.檢查真空幫浦動作是否正常（流量為16.7L/min）？	✓		5.檢查過濾紙是否正常？（太髒則應更換）	✓	
5.檢查濾點是否正確？	✓		6.試漏是否<0.2L/min(顯示Flow Alarm)? 0.1 L/min	✓	
6.試漏是否<0.2L/min? 監測前 0.1 L/min 監測後 0.0 L/min	✓		十一、監測車週邊設備檢查：	是	否
六、氮氧化物測定儀：	是	否	1.檢查冷氣動作是否正常？（25~28°C）	✓	
1.檢查電源是否開啟？	✓		2.檢查AVR穩壓器動作是否正常？	✓	
2.檢查Alarm警示燈是否熄滅？如Alarm警示燈亮著將其記錄於後：	✓		3.檢查鋼瓶壓力是否正常（須>300Psi）	✓	
3.檢查流量是否在範圍之內(0.7~1.5L/min)? 1.0 L/min	✓		4.檢查鋼瓶二級壓力值是否設定為30Psi？	✓	
4.檢查測定範圍是否設定在0.5ppm處？	✓		5.其他（監測車若有其他不正常情形，請記錄於下，並通知會維修人員）		✓
5.檢查過濾紙是否正常？（太髒則應更換）	✓				
6.試漏是否<0.7L/min(顯示Flow Alarm)? 0.5 L/min	✓				
七、二氧化硫測定儀：	是	否			
1.檢查電源是否開啟？	✓				
2.檢查Alarm警示燈是否熄滅？如Alarm警示燈亮著將其記錄於後：	✓				
3.檢查流量是否在範圍之內(0.3~1.1L/min)? 1.0 L/min	✓				

空氣品質監測車多點校正表

監測車車號: 2453-UK
 校正日期: 102.03.06

校正人員: 林瑞祥
 審核人: 鐘美紅

一.鋼瓶氣體數據

標準氣體鋼瓶號: CBO9847
 配製日期: 101/07/16
 NO 濃度: 25.74 ppm
 CO 濃度: 2503 ppm
 SO₂ 濃度: 25.49 ppm
 CH₄ 濃度: 2519 ppm

二.校正器數據

廠牌/型號: SABIO 4010
 序 號: 9620605

校正日期: 102.03.06

標準氣體流量校正:

斜 率(m): 0.9997
 截 距(b): 0.0120
 相 關 系 數(r): 0.9999

零氣體流量校正

斜 率(m): 1.0061
 截 距(b): -0.0178
 相 關 系 數(r): 0.9999

03校正日期: 101.9.13

斜 率(m): 1.003
 截 距(b): -2.485
 相 關 系 數(r): 1.0000

空氣品質監測車多點校正表(續)

校正地點: 潭墘國小

校正人員: 林瑞祥

校正日期: 102.03.06

審核人: 鐘美紅

1. 一氧化碳多點校正數據

	SPAN CONC	儀器 ppm
1	0.0	0.06
2	10.0	10.22
3	20.0	20.22
4	30.0	30.10
5	40.0	39.98
*	*	*

CO

斜率(m): 0.9972 (0.880~1.120)

截距(b): 0.1720 ($\leq \pm 2\%$ OF F.S)

相關系數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

3. 氮氧化物多點校正數據

	SPAN CONC SET(NO&NOx)	儀器 NO ppb	儀器 NOx ppb		SPAN CONC	儀器 ppb
1	0	1.0	1.3	1	0	0.2
2	100	104.3	106.3	2	100	95.8
3	200	205.2	207.6	3	200	201.8
4	300	304.4	306.9	4	300	303.5
5	400	398.4	400.5	5	400	400.8
*	*	*	*	*	*	*

NO

斜率(m): 0.9949 (0.880~1.120)

截距(b): 3.6800 ($\leq \pm 2\%$ OF F.S)

相關系數(r): 0.9998 (0.995~1.000)

NOx

斜率(m): 0.9990 (0.880~1.120)

截距(b): 4.7200 ($\leq \pm 2\%$ OF F.S)

相關系數(r): 0.9998 (0.995~1.000)

5. 碳氫化合物多點校正數據

	SPAN CONC SET(CH ₄ &THC)	儀器 CH ₄ ppmC	儀器 THC ppmC
1	0.0	0.05	0.09
2	10.1	10.19	10.29
3	20.2	20.09	20.37
4	30.2	30.00	30.38
5	40.2	40.17	40.38
*	*	*	*

CH₄

斜率(m): 0.9955 (0.880~1.120)

截距(b): 0.0503 ($\leq \pm 2\%$ OF F.S)

相關系數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

THC

斜率(m): 1.0017 (0.880~1.120)

截距(b): 0.1279 ($\leq \pm 2\%$ OF F.S)

相關系數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

2. 二氧化硫多點校正數據

	SPAN CONC	儀器 ppb
1	0	0.8
2	99	100.5
3	197	198.6
4	296	297.3
5	396	394.4
*	*	*

SO₂

斜率(m): 0.9949 (0.880~1.120)

截距(b): 1.7229 ($\leq \pm 2\%$ OF F.S)

相關系數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

4. 臭氧多點校正數據

O₃

斜率(m): 1.0089 (0.880~1.120)

截距(b): -1.3600 ($\leq \pm 2\%$ OF F.S)

相關系數(r): 0.9999 (0.995~1.000)

空氣品質監測儀器設備檢查表

檢查日期: 102/4/2

檢查人員: 陳俊男

監測車號: 2453-UP

確認日期: 102/4/2

確認人員: 陳南州

審核人: 楊政弘

一、文件資料

前	後	
☒	☒	1 空氣品質監測計畫書及位置圖
☒	☒	2 空氣品質校正記錄表
☒	☒	3 空氣品質監測概況說明表
☒	☒	4 高量採樣器使用前後校正表
☒	☒	5 空氣樣品監視鏈
☒	☒	6 空氣品質監測儀器設備檢查表
☒	☒	7 周界檢測氣狀污染物紀錄表
☒	☒	8 採樣與分析過程之樣品核對記錄表
☒	☒	9 周界儀器自動監測資料轉交表
☒	☒	10 空氣品質監測車執行中每日檢查表
☒	☒	11 PM10監測儀流量校正及射源強度紀錄表
☒	☒	12 PM2.5監測儀流量校正及射源強度紀錄表

前	後	
☒	☒	25 指北針
☒	☒	26 照相機
☒	☒	27 發電機
☒	☒	28 針筒
☒	☒	29 冰塊

三、安全設備

前	後	
☒	☒	1 安全帽
☒	☒	2 反光背心
☒	☒	3 警示標誌
☒	☒	4 警示燈
☒	☒	5 警示帶
☒	☒	6 急救箱
☐	☐	7
☒	☒	8

二、儀器設備


前	後	
☒	☒	1 CO 分析儀(序號: D000RBSH)
☒	☒	2 SO ₂ 分析儀(序號: 40214320022)
☒	☒	3 NO _x 分析儀(序號: 4341998001)
☒	☒	4 O ₃ 分析儀(序號: 59288101)
☒	☒	5 THC 分析儀(序號: 590454051)
☒	☒	6 PM ₁₀ 分析儀(序號: 85116501E)
☒	☒	7 高量採樣器(序號: HIVOL-6)
☒	☒	8 氣象分析儀(序號: 33546,2903)
☒	☒	9 資料收集器(序號: *)
☒	☒	10 動態稀釋器(序號: 09620605)
☒	☒	11 標準氣體(編號: CB09847)
☒	☒	12 校正流量計(序號: Defender530/129934)
☒	☒	13 小孔校正器(序號: 1243)
☒	☒	14 大氣壓力計
		(標準值: <u>747</u> 實際值: <u>747</u>)
☒	☒	15 mini-pump 台
☒	☒	16 矽膠管 支
☒	☒	17 Hi-vol濾紙 3 張
☒	☒	18 活性碳管 支
☒	☒	19 吸收液
☒	☒	20
☒	☒	21
☒	☒	22
☒	☒	23 氬氣
☒	☒	24 三用電表

四、品保品管

前	後	
☒	☒	1 運送空白* 張(TSP)
		運送空白* 組(無機酸)
		運送空白* 組()
		運送空白* 組()
		運送空白* 組()
		運送空白* 組()
☒	☒	2 設備空白* 張(TSP)
		設備空白* 組(無機酸)
		設備空白* 組()
		設備空白* 組()
		設備空白* 組()
		設備空白* 組()
☐	☐	3 現場空白* 組(無機酸)
		現場空白* 組()
		現場空白* 組()
		現場空白* 組()
		現場空白* 組()
		現場空白* 組()
		現場空白* 組()

環境品質監測概況說明

工程名稱	彰濱工業區綠路西子區施工階段
監測站之詳細位置說明	環境監測基地
監測項目	CO, SO ₂ , O ₃ , NO _x , THC, 氣象, 風速, 風向, PM ₁₀ , TSP, Pb
監測日期	102.4.2-102.4.3
監測天候狀況	晴
周遭環境特點(敏感點)說明	因氣候變遷測站位於海邊, 風速偏高。
施工作業概述	無。

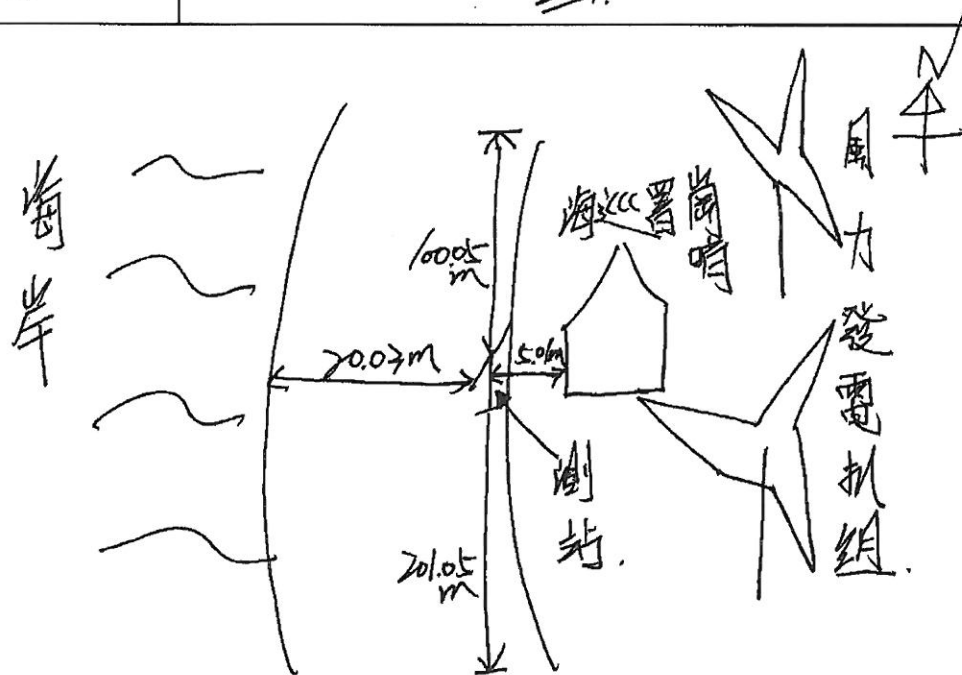

監測人員：

林俊男, 陳南村

檢驗室主任：

胡乙

空氣品質監測車監測前後校正表

監測地點:

基地

檢查人員:

林俊青

審核人:

林俊青

監測前偏移檢查

檢查日期: 102/4/2

監測項目	零點偏移		偏移結果 (B-A)	全幅偏移		偏移結果 (D-C)	是否合格	
	設定值 (A)	顯示值(B)		設定值 (C)	顯示值 (D)			
CO(ppm)	0.00	0.08	0.08	40.00	39.55	-0.45	☒ 是	☐ 否
SO ₂ (ppb)	0.0	0.4	0.4	396.0	396.1	-5.9	☒ 是	☐ 否
NO(ppb)	0.0	0.0	0.0	400.0	407.7	7.7	☒ 是	☐ 否
NO _x (ppb)	0.0	1.0	1.0	400.0	409.5	9.5	☒ 是	☐ 否
O ₃ (ppb)	0.0	1.1	1.1	400.0	406.8	6.8	☒ 是	☐ 否
CH ₄ (ppmC)	0.00	0.37	0.37	40.20	40.61	0.41	☒ 是	☐ 否
THC(ppmC)	0.00	0.25	0.25	40.20	40.17	-0.07	☒ 是	☐ 否

監測後偏移檢查

檢查日期: 102/4/3

監測項目	零點偏移		偏移結果 (B-A)	全幅偏移		偏移結果 (D-C)	是否合格	
	設定值 (A)	顯示值(B)		設定值 (C)	顯示值 (D)			
CO(ppm)	0.00	0.09	0.09	40.00	39.48	-0.52	☒ 是	☐ 否
SO ₂ (ppb)	0.0	0.2	0.2	396.0	396.9	-5.1	☒ 是	☐ 否
NO(ppb)	0.0	0.7	0.7	400.0	393.1	-6.9	☒ 是	☐ 否
NO _x (ppb)	0.0	1.0	1.0	400.0	393.1	-6.9	☒ 是	☐ 否
O ₃ (ppb)	0.0	0.7	0.7	400.0	402.0	2.0	☒ 是	☐ 否
CH ₄ (ppmC)	0.00	0.07	0.07	40.20	39.29	-0.91	☒ 是	☐ 否
THC(ppmC)	0.00	0.17	0.17	40.20	39.72	-0.48	☒ 是	☐ 否

零點/全幅偏移品質管制範圍:

監測項目	CO	SO ₂	O ₃	NO _x	CH ₄	THC
零點偏移	±0.5ppm	±4ppb	±20ppb	±20ppb	±0.5ppmC	±0.5ppmC
全幅偏移	設定值±2%	設定值±3%	±20ppb	±20ppb	設定值±2%	設定值±2%

註: 零點/全幅兩點偏移檢查, 須符合零點/全幅偏移品質管制範圍方能判定合格

若零點/全幅兩點偏移檢查判定不合格, 須重新執行多點校正

PM₁₀監測儀流量校正及射源強度記錄表

監測地點：基地

校正人員：陳俊昇

審核人：何裕元

校正流量計廠牌：Bios

校正流量計型號/序號：Defender 30 / D9934

監測前

日期：102/4/2

大氣壓力Pa：765 mmHg

大氣溫度Ta：22.4 °C

飽和蒸氣壓 P_{H2O}：* mmHg

項目	校正次數	儀器流量 Q1(L/min)	換算後儀器流 量Q2(L/min)	校正器流量 Qc(L/min)	換算後校正器流 量Q(L/min)	誤差(%)	平均誤差 ≤±10%
流量 校正	1	16.7	17.0	16.785	17.044	-0.26	-0.39
	2	16.7	17.0	16.811	17.071	-0.42	
	3	16.7	17.0	16.820	17.080	-0.47	
	4	16.7	17.0	16.794	17.053	-0.31	
	5	16.7	17.0	16.829	17.089	-0.52	
貝他射源強度			☒ COUNT ☐ Hz	11316			

監測後

日期：102/4/27

大氣壓力Pa：765 mmHg

大氣溫度Ta：21.6 °C

飽和蒸氣壓 P_{H2O}：* mmHg

項目	校正次數	儀器流量 Q1(L/min)	換算後儀器流 量Q2(L/min)	校正器流量 Qc(L/min)	換算後校正器流 量Q(L/min)	誤差(%)	平均誤差 ±10%
流量 校正	1	16.7	17.0	16.821	17.117	-0.80	-0.69
	2	16.7	17.0	16.819	17.125	-0.77	
	3	16.7	17.0	16.797	17.103	-0.60	
	4	16.7	17.0	16.799	17.105	-0.61	
	5	16.7	17.0	16.815	17.121	-0.71	
貝他射源強度			☒ COUNT ☐ Hz	11021			

換算後儀器流量計算： $Q2=Q1 \times \left[\left(\frac{Pa}{760} \right) \times \left(\frac{298}{Ta+273} \right) \right]$

換算後流量計算： $Q=Qc \times \left[\left(\frac{Pa-P_{H2O}}{760} \right) \times \left(\frac{298}{Ta+273} \right) \right]$

誤差計算： $\left(\frac{Q2-Q}{Q} \right) \times 100\%$

使用乾式流量計校正時，無須扣除飽和蒸氣壓

若貝他射源強度COUNT小於5000或貝他射源強度小於100Hz，將儀器送修。

高量採樣器使用前後校正表

日期	小孔校正器號碼:	1247	斜率(m1):	1.5771	截距(b1):	-0.0159	使用人		備註
10242	高量採樣器號碼:	1116	斜率(m2):	1.1197	截距(b2):	-0.0897	林俊利		
測站名稱	採樣前/後	大氣壓力 P(mm-Hg)	大氣溫度 T(°C)	水柱壓差 ΔH(in-H ₂ O)	校正流量 Q (m ³ /min)	校正流量補正 Q ₀ (m ³ /min)	浮子流量 Y(m ³ /min)	誤差 (%)	
彰濱	採樣前	765	22.4	3.6	1.22	*	1.20	-1.6	
	採樣開始	765	22.4	*	*	*	1.20	*	
	採樣結束	765	21.6	*	*	*	1.20	*	
	採樣後	765	21.6	3.6	1.22	*	1.20	-1.6	

日期	小孔校正器號碼:		斜率(m1):		截距(b1):		使用人		備註
	高量採樣器號碼:		斜率(m2):		截距(b2):				
測站名稱	採樣前/後	大氣壓力 P(mm-Hg)	大氣溫度 T(°C)	水柱壓差 ΔH(in-H ₂ O)	校正流量 Q (m ³ /min)	校正流量補正 Q ₀ (m ³ /min)	浮子流量 Y(m ³ /min)	誤差 (%)	
	採樣前								
	採樣開始			*	*	*		*	
	採樣結束			*	*	*		*	
	採樣後								

日期	小孔校正器號碼:		斜率(m1):		截距(b1):		使用人		備註
	高量採樣器號碼:		斜率(m2):		截距(b2):				
測站名稱	採樣前/後	大氣壓力 P(mm-Hg)	大氣溫度 T(°C)	水柱壓差 ΔH(in-H ₂ O)	校正流量 Q (m ³ /min)	校正流量補正 Q ₀ (m ³ /min)	浮子流量 Y(m ³ /min)	誤差 (%)	
	採樣前								
	採樣開始			*	*	*		*	
	採樣結束			*	*	*		*	
	採樣後								

1. 校正流量 $Q = (((\Delta H * (P/760) * (298/(273+T))))^{1/2} - b1) / m1$

2. 當溫度、壓力變化很大時(採樣當日溫度、大氣壓力與小孔校正器追溯傳輸驗證時溫度 $T \pm 15^\circ\text{C}$ 或大氣壓力 $P \pm 60\text{mmHg}$)，則小孔校正器之校正流量依下式補正：

說明: $Q_0 = Q \times \left[\frac{(273+T)}{298} \times \frac{760}{P} \right]$

3. 誤差 = ((浮子流量 - 校正流量) / 校正流量) * 100%

4. 誤差須小於 $\pm 7\%$ ，否則須重作多點校正

審核人: 林俊利

Date	Time	CO	SO2	NO	NOx	NO2	CH4	THC	NMHC	O3	PM10	WD	WS	TEMP	HUM	SP
2013/4/2	15:13	-2.53	1.15	1.38	7.1	5.73	0.8	2.12	1.33	79.35	-0.2	229.38	8.85	22.47	81.92	117.95
2013/4/2	15:14	-2.53	1.18	1.19	7.17	5.98	0.82	2.12	1.3	78.54	-0.2	228.51	12.52	22.49	80.92	116.6
2013/4/2	15:15	-2.53	1.18	0.9	7.08	6.18	0.83	2	1.17	77.85	-0.2	236.02	10.91	22.47	81.57	115.72
2013/4/2	15:16	-2.53	1.11	0.71	6.78	6.08	0.43	2.14	1.71	78.21	-0.2	232.98	11.28	22.49	82.1	116.31
2013/4/2	15:17	-2.53	0.97	1.33	7.35	6.02	1.21	2.07	0.86	77.39	-0.2	234.51	9.9	22.57	82.95	115.06
2013/4/2	15:18	-2.53	1.01	1.41	7.32	5.91	1.1	2.09	0.99	77.92	-0.2	236.21	11.17	22.44	81.55	116.05
2013/4/2	15:19	-2.53	1.75	1.3	6.86	5.56	0.99	2.1	1.11	79.03	-0.2	234.74	12.28	22.4	80.78	117.77
2013/4/2	15:20	-2.53	2.26	0.13	3.38	3.25	1.03	2.1	1.08	79.55	-0.2	234.11	12.87	22.36	80.51	118.69
2013/4/2	15:21	-2.53	1.51	0.34	2.03	1.69	1.49	2.06	0.58	80.04	-0.2	232.05	10.97	22.38	80.91	119.33
2013/4/2	15:22	-2.53	0.54	0.29	1.25	0.96	1.18	2.08	0.91	79.96	-0.2	238.75	11.65	22.39	80.82	119.39
2013/4/2	15:23	-2.53	0.36	0.03	1.01	0.97	0.9	2.11	1.22	80.16	-0.2	237.55	12.23	22.4	80.74	119.69
2013/4/2	15:24	-2.53	0.71	0.98	1.58	0.61	1.23	2.09	0.86	79.91	-0.2	231.76	11	22.46	81.72	119.38
2013/4/2	15:25	-2.53	57.48	100.45	94.18	-6.27	0.94	1.98	1.05	79.3	-0.2	236.4	11.81	22.5	81.81	118.65
2013/4/2	15:29	-2.53	395.3	281.35	285.55	4.2	1.77	2.01	0.23	79.65	-0.2	231.44	11.75	22.39	82.03	119.4
2013/4/2	15:30	-2.54	395.2	289.84	289.56	-0.29	1.78	2.01	0.23	79.86	-0.2	239.61	11.53	22.39	82.09	119.61
2013/4/2	15:31	-2.54	394.52	360.96	382.31	21.35	1.69	2.06	0.37	80.47	-0.2	238.66	11.62	22.42	82.3	120.74
2013/4/2	15:32	-2.54	391.48	407.27	408.98	1.71	1.85	2.04	0.19	80.2	-0.2	235.46	12.61	22.36	82.3	120.27
2013/4/2	15:33	-2.53	390.07	407.71	409.48	1.78	1.91	2.04	0.13	79.93	-0.2	228.9	10.99	22.42	82.86	119.79
2013/4/2	15:34	-2.54	372.39	236.01	257.54	21.53	2.04	2.19	0.15	79.78	-0.2	231.61	10.36	22.47	83.15	119.79
2013/4/2	15:35	-2.54	224.46	23.58	20.82	-2.76	5.25	6.89	1.64	79.43	-0.2	244.2	11.88	22.47	83.14	119.3
2013/4/2	15:36	-2.54	52.73	2.59	-12.36	-14.95	1.91	2.13	0.22	79.3	-0.2	242.02	11.45	22.41	83.38	118.89
2013/4/2	15:37	0.37	6.43	-5.51	1.8	7.31	0.8	0.52	-0.29	79.07	-0.2	234.97	10.71	22.48	83.75	118.63
2013/4/2	15:38	0.36	2.5	-0.07	7.63	7.7	0.63	0.29	-0.35	78.6	-0.2	236.13	12.41	22.41	82.75	118.15
2013/4/2	15:39	0.38	1.74	0.58	7.63	7.06	0.58	0.24	-0.35	79.08	-0.2	237.79	11.31	22.46	83.24	118.77
2013/4/2	15:40	0.38	1.45	0.68	7.58	6.91	0.43	0.25	-0.19	78.34	-0.2	239.8	12.07	22.45	81.56	117.84
2013/4/2	15:41	0.38	1.31	1.14	7.89	6.75	0.37	1.25	0.88	78.37	-0.2	237.1	11.89	22.45	82.64	117.9
2013/4/2	15:42	0.08	1.1	1.16	7.96	6.81	0.36	0.26	-0.1	79.14	-0.2	234.72	11.59	22.38	83.11	119.05
2013/4/2	15:43	0.08	1.16	0.69	8.05	7.36	0.37	0.25	-0.12	79.29	-0.2	231.68	11.66	22.42	82.67	119.33
2013/4/2	15:44	0.07	1.28	0.46	8.08	7.62	0.36	0.23	-0.13	78.88	-0.2	242.6	12.11	22.41	82.18	118.67
2013/4/2	15:45	0.07	1.15	-0.99	6.17	7.16	1.6	1.42	-0.18	78.02	-0.2	243.11	11.19	22.48	83.4	117.38
2013/4/2	15:46	1.98	1.21	-2.74	-15.52	-12.78	24.83	27.36	2.52	77.39	-0.2	235.44	10.62	22.58	84.54	116.39
2013/4/2	15:47	28.02	1.18	3.66	-19.98	-23.63	34.84	39.18	4.33	77.26	-0.2	238.35	10.08	22.54	84.63	116.4
2013/4/2	15:48	38.33	1.2	3.32	-23.23	-26.55	39.34	40.09	0.75	76.88	-0.2	237.48	11.53	22.43	83.93	115.82

	CO	SO ₂	NO	NOx	NO ₂	CH ₄	THC	MMMC	O ₃	PM ₁₀	WD	WS	TEMP	NUM	SP
2013/4/2 15:49	39.56	1.12	3.28	-23.67	-26.94	40.24	40.2	-0.04	77.26	-0.2	247.08	11.48	22.43	84.23	116.3
2013/4/2 15:50	39.55	1.1	13.74	-4.34	-18.07	40.61	40.13	-0.48	76.42	-0.2	238.81	9.38	22.56	85.05	115.09
2013/4/2 15:51	39.37	1.24	210.29	203.71	-6.58	38.94	38.76	-0.19	69.16	-0.2	240.31	11.28	22.53	83.68	104.17
2013/4/2 15:52	31.22	1.28	243.83	254.19	10.37	8.12	8.01	-0.11	13.81	-0.2	242.69	11.32	22.44	83.79	20.81
2013/4/2 15:53	-2.54	1.18	84.54	93.53	8.99	2.9	1.82	-1.08	-0.05	-0.2	235.64	10.37	22.49	84.08	-0.06
2013/4/2 15:54	-2.54	1.15	10.41	12.44	2.03	2.5	2.07	-0.43	0.69	-0.2	242.91	10.3	22.55	84.32	1.01
2013/4/2 15:55	-2.54	1.27	2.04	2.58	0.54	2.51	2.07	-0.44	1.04	-0.2	242.29	10.74	22.52	83.89	1.58
2013/4/2 15:56	-2.54	1.14	0.32	1.04	0.72	2.52	2.08	-0.44	1.08	-0.2	236.82	12.04	22.49	83.61	1.67
2013/4/2 15:57	-2.54	1.1	1.05	10.74	9.69	2.17	2.3	0.13	405.66	-0.2	239.94	11.47	22.5	82.54	610.48
2013/4/2 15:58	-2.54	1.15	1.05	10.6	9.55	2.2	2.29	0.1	406.9	-0.2	253.19	10.66	22.54	84.12	612.7
2013/4/2 15:59	-2.54	1.15	1.38	10.75	9.38	2.2	2.29	0.1	406.83	-0.2	246.58	10.74	22.57	84.07	612.3
2013/4/2 16:00	0.53	0.94	1.19	11.67	10.49	2.18	2.36	0.18	69.7	87.6	242.7	11.27	22.29	83.05	110.4
2013/4/2 17:00	0.6	1.19	1.6	12.9	11.3	2.11	2.32	0.21	71.64	95.8	249.6	10.97	22.31	77.76	118.93
2013/4/2 18:00	0.61	1.82	1.94	12.43	10.49	2.04	2.22	0.18	83.45	107.7	258.81	10.96	21.93	73.44	134.93
2013/4/2 19:00	0.69	1.89	1.99	13.68	11.69	2.01	2.31	0.3	78.97	105.8	263.43	10.78	21.18	75.63	130.86
2013/4/2 20:00	0.69	1.4	2.05	11.92	9.87	2.07	2.33	0.26	71.61	102.8	262.46	10.1	20.55	76.64	118.92
2013/4/2 21:00	0.65	1.07	2.22	10.62	8.4	2.22	2.25	0.03	64.77	86	264.96	9.1	20.29	77.32	106.84
2013/4/2 22:00	0.63	1.16	2.2	10.22	8.02	1.94	2.17	0.23	63.69	58.7	263.96	9.01	20.06	74.83	103.15
2013/4/2 23:00	0.66	0.65	2.27	8.61	6.33	2	2.24	0.24	64.55	97.7	251.22	8.91	19.31	83.72	106.35
2013/4/3 00:00	0.69	0.77	2.43	10.84	8.41	2	2.27	0.27	58.74	96.8	267.06	8.72	18.67	88.32	98.75
2013/4/3 01:00	0.67	0.49	2.39	9.5	7.11	2.09	2.2	0.11	54.88	99.7	260.17	7.62	18.35	90.63	93.42
2013/4/3 02:00	0.61	0.2	2.46	7.59	5.13	1.89	2.19	0.3	54.95	90.8	260.72	8.51	18.64	92.1	92.73
2013/4/3 03:00	0.59	0.54	2.52	10.63	8.11	1.96	2.27	0.31	47.58	66.8	268.26	8.11	17.8	93.1	78.64
2013/4/3 04:00	0.63	1.4	2.51	15.48	12.97	1.96	2.25	0.29	35.14	78.7	264.15	5.46	17.61	94.55	61.49
2013/4/3 05:00	0.53	0.51	2.5	8.6	6.1	2.13	2.32	0.19	42.81	76.6	249.62	6.47	18.51	95.14	72.63
2013/4/3 06:00	0.44	0.43	2.63	8.02	5.38	1.93	2.13	0.2	51.54	67	250.88	7.83	18.63	93.73	84.39
2013/4/3 07:00	0.43	0.09	2.78	6.67	3.88	1.92	2.16	0.24	53.28	65.9	256.93	8.72	18.73	92.88	87.18
2013/4/3 08:00	0.48	0.6	3.38	13.72	10.34	1.91	2.16	0.25	43.64	61.9	261.31	6.33	18.29	91.8	72.89
2013/4/3 09:00	0.47	0.48	3.68	13.33	9.64	2.21	2.39	0.18	43.74	64.9	247.21	4.99	18.83	90.49	72.34
2013/4/3 10:00	0.51	0.39	3.8	13.27	9.47	1.96	2.14	0.18	44.64	61.6	244.81	5.24	19.58	91.08	73.06
2013/4/3 11:00	0.57	0.43	3.65	13.29	9.64	1.96	2.22	0.26	62.13	96.6	347.53	5.86	20.03	88.27	102.24
2013/4/3 12:00	0.45	0.45	3.55	11.55	8.01	1.92	2.15	0.23	81.17	103.6	355.47	6.14	20.41	83.36	131.64
2013/4/3 13:00	0.48	0.31	2.84	10	7.15	1.87	2.22	0.35	91.97	100.8	352.35	6.3	21.05	81.32	148.16
2013/4/3 14:00	0.54	0.27	3.12	9.86	6.74	1.96	2.18	0.22	91.52	103.6	346.94	6.41	21.42	80.44	148.98

	CO	SO ₂	NO	NO _x	NO ₂	CH ₄	THC	MMHC	O ₃	PM ₁₀	WD	WS	TEMP	WVM	SP
2013/4/3 15:00V	0.41	0.59	2.71	5.8	3.09	1.82	2.03	0.21	74.35	108.9	338.92	8.06	21.45	83.29	119.98
2013/4/3 16:00	0.23	0.27	2.5	6.6	4.1	1.88	2.26	0.39	73.7	-0.2	341.64	7.81	21.58	83.57	112.21
2013/4/3 16:01	0.23	-0.1	2.13	3.38	1.25	1.89	2.28	0.39	71.42	-0.2	347.72	7.56	21.6	82.74	108.82
2013/4/3 16:02	0.23	0.2	0.89	2.04	1.15	1.88	2.27	0.39	71.79	-0.2	350.47	7.61	21.68	83.21	109.33
2013/4/3 16:03	0.23	0.24	0.75	1.42	0.67	1.88	2.27	0.39	72.39	-0.2	349.54	8.36	21.58	81.68	110.16
2013/4/3 16:04	0.23	0.16	0.66	0.97	0.31	1.88	2.28	0.39	72.38	-0.2	346.33	7.59	21.63	82.59	110.1
2013/4/3 16:05	0.23	2.59	5.73	4.46	-1.26	1.89	2.27	0.38	72.29	-0.2	348.28	7.32	21.64	82.62	110.02
2013/4/3 16:06	0.23	85.04	138.02	128	-10.02	1.9	2.27	0.38	71.42	-0.2	349.78	7.37	21.66	82.58	108.61
2013/4/3 16:07	0.23	261.11	299.95	295.12	-4.83	1.91	2.29	0.38	70.9	-0.2	351.7	8.52	21.6	81.85	107.7
2013/4/3 16:08	0.23	372.14	294.19	295.71	1.51	1.89	2.29	0.4	71.13	-0.2	339.16	8.66	21.54	81.14	108.07
2013/4/3 16:09	0.23	389.68	281	283.19	2.19	1.89	2.28	0.39	69.55	-0.1	341.79	8.03	21.55	81.51	105.54
2013/4/3 16:10	0.23	389.59	319.24	325.03	5.79	1.88	2.29	0.41	68.32	-0.1	343.43	7.86	21.6	81.62	103.6
2013/4/3 16:11	0.23	388.35	373.21	382.23	9.02	1.89	2.28	0.39	67.71	-0.1	356.32	6.56	-3.69	52.09	102.56
2013/4/3 16:12	0.23	393.15	388.8	390.3	1.5	1.89	2.28	0.39	66.87	-0.1	34.65	3.92	-39.41	11.74	101.16
2013/4/3 16:13	0.23	391.04	391.76	392.03	0.26	1.89	2.28	0.39	65.49	-0.2	32.98	3.83	-40.02	10.96	99.09
2013/4/3 16:14	0.23	390.94	393.13	393.11	-0.02	1.89	2.28	0.39	66.81	-0.1	32.79	3.9	-40.32	10.63	101.13
2013/4/3 16:15	0.23	380.19	340.21	350.34	10.13	1.94	2.32	0.39	68.58	-0.1	32.96	4.01	-40.37	10.61	103.72
2013/4/3 16:16	0.23	239.84	61.42	69.82	8.4	7.07	8.07	0.99	69.42	-0.1	32.59	4.03	-40.64	10.37	104.97
2013/4/3 16:17	0.38	63.06	0.29	-15.44	-15.73	1.96	2.62	0.66	70.83	-0.1	32.5	4.13	-40.81	9.93	107.19
2013/4/3 16:18	2.08	3.07	-2.19	-2.55	-0.35	0.38	0.57	0.19	70.38	-0.2	32.18	4.08	-41.02	9.65	106.43
2013/4/3 16:19	0.09	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.11	0.23	0.12	71.46	-0.1	31.66	4.08	-41.25	9.27	107.9
2013/4/3 16:20	0.09	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.07	0.17	0.1	71.93	-0.1	30.11	3.98	-41.91	8.42	108.63
2013/4/3 16:21	0.09	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.49	0.59	0.11	70.01	-0.1	28.6	3.88	-42.23	8.2	105.54
2013/4/3 16:22	10.09	-0.5	0.4	0.3	-0.1	23.03	26.4	3.36	68.34	-0.1	28	3.97	-42.19	8.49	103.18
2013/4/3 16:23	16.07	-0.5	0.4	0.3	-0.1	37.93	38.28	0.35	68.2	-0.1	28.12	4	-41.8	8.88	102.92
2013/4/3 16:24	20.44	-0.5	0.4	0.3	-0.1	38.8	39.6	0.8	68.16	-0.1	30.33	4.03	-41.63	9.91	102.65
2013/4/3 16:25	28.68	-0.5	0.4	0.3	-0.1	38.82	39.37	0.56	68.09	-0.1	30.59	4.02	-41.03	10.33	102.66
2013/4/3 16:26	38.74	-0.5	0.4	0.3	-0.1	38.8	39.38	0.58	66.81	-0.1	30	3.95	-41.29	9.87	100.63
2013/4/3 16:27	39.44	-0.5	0.4	0.3	-0.1	39.07	39.51	0.45	69.17	-0.1	30.58	4.08	-41.25	9.8	104.13
2013/4/3 16:28	39.48	-0.5	0.4	0.3	-0.1	39.29	39.72	0.43	69.19	-0.1	30.43	4.08	-41.39	9.66	104.23
2013/4/3 16:29	32.98	-0.5	0.4	0.3	-0.1	38.72	39.33	0.6	61.91	-0.1	28	3.65	-42.17	8.93	93.61
2013/4/3 16:30	2.35	-0.5	0.4	0.3	-0.1	24.2	25.98	1.79	13.11	-0.1	15.24	0.76	-46.55	4.91	19.93
2013/4/3 16:31	0.37	-0.5	0.4	0.3	-0.1	3.89	4.31	0.42	0.69	-0.1	4.9	0.03	-47.87	3.69	1.28
2013/4/3 16:32	-1.6	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.64	0.76	0.12	0.72	-0.1	4.62	0.03	-47.96	3.47	1.94

	CO	GO ₂	NO	NO _x	NO ₂	CH ₄	THC	MMHC	O ₃	PM ₁₀	VD	VS	TEMP	NUM	SP
2013/4/3 16:33	0.23	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.17	0.25	0.08	6.98	-0.1	182.88	-0.02	-48.12	3.28	2.04
2013/4/3 16:34	0.23	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.09	0.17	0.08	43.86	-0.1	33.37	2.43	-44.95	5.71	66.16
2013/4/3 16:35	0.23	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.07	0.15	0.08	256.1	-0.1	94.77	14.84	-28.15	20.4	382.36
2013/4/3 16:36	0.23	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.07	0.14	0.07	372.23	-0.1	123.69	21.78	-20.66	26.49	553.61
2013/4/3 16:37	0.23	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.06	0.13	0.07	397.98	-0.1	133.49	23.37	-18.38	28.5	591.47
2013/4/3 16:38	0.23	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.05	0.13	0.08	401.15	-0.1	148.46	23.62	-16.28	30.88	596.16
2013/4/3 16:39	0.23	-0.5	0.4	0.3	-0.1	0.05	0.13	0.08	√402	-0.1	150.73	23.67	-12.58	35.3	597.19

瑩諮科技股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第012A號

地址：台北市內湖區瑞光路2號5樓 電話：(02) 2794-8833

水質水量樣品檢驗報告

計畫名稱：彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

委託單位：創迅科技股份有限公司

樣品別：海水

採樣單位：瑩諮科技股份有限公司

採樣地點：彰濱工業區外海

報告編號：EL02B0225

採樣日期：102年04月02日

收樣日期：102年04月03日

報告日期：102年05月13日

連絡人：賴海源

是否經 認可	檢測項目	單位	樣品編號			檢驗方法	備註欄
			0225B01	0225B02	0225B03		
			南側 (表層、 底層混樣)	西側 (表層、 底層混樣)	北側 (表層、 底層混樣)		
			102.04.02 (06:29)	102.04.02 (07:30)	102.04.02 (08:10)		
			檢測值				
○	水溫	℃	23.8	23.6	23.8	NIEA W217.51A	—
	透明度	cm	80	70	90	NIEA E220.50C	—
○	溶氧	mg/L	5.3	5.3	5.3	NIEA W455.52C	—
	鹽度	psu	33.6	33.7	33.5	NIEA W447.20C	—
○	生化需氧量	mg/L	0.7	0.7	0.9	NIEA W510.55B	—
○	pH	—	8.0	7.9	8.0	NIEA W424.52A	—
○	銅	mg/L	N.D.	0.0011	N.D.	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	0.00060
○	鋅	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.		0.00092
○	鉛	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.		0.00096
○	鎘	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.		0.00066
○	硒	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	NIEA W311.52C	0.0054
	銻 _{註5}	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	NIEA W311.52C	0.0125
○	汞	mg/L	N.D.	N.D.	0.0009	NIEA W330.52A	0.000575
○	砷	mg/L	0.0015	0.0015	0.0014	NIEA W434.53B	0.00010

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：鍾美紅(ELI-01)。
- 2、本報告共 頁，不得作為法律訴訟用，報告內容不得隨意複製或作為商業廣告之用。
- 3、檢測項目有標示"○"者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
- 4、低於方法偵測極限之測定值以"N.D."表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
- 5、備註欄為QDL。
- 6、生化需氧量樣品經培養5天後，氧氣消耗量<2ppm。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：瑩諮科技股份有限公司

負責人(簽章)：楊炯浩

檢驗室主任(簽名蓋章)：胡欣

檢驗報告專用章
瑩諮科技(股)公司
負責人：楊炯浩
檢驗室主任：胡欣

水質採樣計畫書

委託編號:	EL02B075
檢測目的:	☒ 定期檢測 ☐ 稽查檢測 ☐ 申請許可 ☐ 改善完成 ☐ 自行評鑑 ☐ 其他

一、污染源基本資料

委託單位: 創迅科技股份有限公司	聯絡人: 劉治桓	聯絡電話: 02-82217666#204
場所名稱: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測	聯絡人: 張小姐	聯絡電話: 02-82217666#322
場所地址: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測		

二、委託要求

採樣位置:	1	2	3
檢測項目:	所有檢測項目須置於4±2℃冷藏箱冷藏運送		
pH Temp 透明度 鹽度 DO	現場測定		
Cr Zn Cd Cu Se Pb Hg As	H	4LPE瓶	
BOD	A	2LPE瓶	
Hg As	H	1LPE瓶	
保存液	A	100mLPE瓶	
報告書 3 份	初勘日期: 96.09.03	採樣頻率: 1 次/季	
註: (A)原樣品, (S)加硫酸pH<2, (H)加硝酸pH<2, (X)加1:1鹽酸pH<2, (P)加磷酸pH<2, (K)滅菌袋, (N)加NaOH, pH>12 (B)抗壞血酸=維他命C (C)加鹽酸pH<2, (E)加去氯試劑, (G)加0.7mL濃硫酸及1mL疊氮化鈉溶液, (D)加1mL硫酸亞錳及1mL疊氮化鈉試劑			

三、採樣一般事宜

出發日期: 102.4.2	採樣日期: 102.4.2	樣品送達檢驗室日期: 102.4.2
參與採樣人員: 林俊秀 陳南州		
往返交通工具: 1370-EH	監督人員隨行: ☐ 是 ☒ 否	

四、採樣方法與器材

☒ 採樣杓 ☒ 定深(甘末爾)採水器 ☒ DO計 ☒ 溫度計 ☒ pH計 ☒ 導電度計 ☐ 氧化還原電位計
☐ 濁度計 ☐ 沉水幫浦 ☐ 水位計 ☐ 延長線 ☒ 清潔劑(刷) ☒ 水桶 ☐ 繩子 ☒ 手套
☐ 塑膠布 ☐ 發電機 ☒ GPS ☐ 救生衣 ☐ 過濾裝置 ☐ 橡皮艇 ☐ 透視度計 ☒ 透明度板
☐ 濾紙 ☐ 貝勒管 ☐ 空壓機 ☐ 控制器 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

五、採樣順序

揮發性有機物	→	大腸桿菌群	→	溶解性氣體	→	半揮發性有機物	→	金屬	→	主要項目
溶氧				總有機碳				氯化物		

品管負責人: 陳南州

採樣小組負責人: 林俊秀

檢查日期: 102/4/2準備人員: 林俊宏確認人員: 陳南升

一、文件資料

- | 前 | 後 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ☒ | ☒ | 1 水質計畫書 |
| ☒ | ☒ | 2 水質現場採樣記錄表 |
| ☒ | ☒ | 3 一般水質採樣前後準備工作檢查表 |
| ☒ | ☒ | 4 現場採樣位置表 |
| ☒ | ☒ | 5 河川水質流速流量紀錄表 |
| ☒ | ☒ | 6 樣品及保存方式標籤 |
| ☒ | ☒ | 7 油性及水性筆 |
| ☒ | ☒ | 8 照相機 |
| ☒ | ☒ | 9 書寫板 |
| ☐ | ☐ | 10 |

二、儀器設備

- 1 ☒ pH計 (7.0校正液編號: B14 -600)
 (4.0校正液編號: B17 -600)
 (10.0校正液編號: B15 -600)
 (7.0確認液編號: B14 -601)
 pH7.0校正時溫度°C 為 7.00 24.4
 pH4.0校正時溫度°C 為 4.01 24.8
 零點電位(mV)值為 21.0 (應介於-25~25之間)
 斜率(mV/pH)為 -59.1 (應介於-56~-61之間)
 pH7.0確認值/溫度°C 為 7.00 / 24.5
 (確認值須符合7.0±0.05)

- ☒ 功能確認正常
 2 ☒ 溶氧計之滿點校正
 空氣校正值為 8.05 mg/L
 校正時溫度 27.7 °C
 飽和度 101.8 % (須符合101.7±1%)
 斜率 0.87 (應介於0.6~1.25之間)

- ☒ 功能確認正常
 3 ☒ 導電度計 (校正液編號:)
 0.01N氯化鉀溶液於25°C時值為
1417 μmho/cm, 溫度為 25.7 °C
 (應介於1343~1483之間)

- ☒ 功能確認正常
 4 ☒ 溫度計*1
 5 ☐ 氧化還原電位計
 ORP標準液校正讀值 _____ mV
 標準液之氧化還原電位值 _____ mV
☐ 功能確認正常 (誤差須符合ORP標準液校正讀值±3%)

- 6 ☒ 量杯 * 1 個
 7 ☐ 流速計 * _____ 支
 型號序號 _____
 8 ☐ 涉水裝 * _____ 件
 9 ☒ 救生衣 * 2 件
 10 ☒ 水桶 15 L * 1 桶
 45 L * 1 桶
 _____ L * _____ 桶

- 11 ☒ 自來水 20L * 1 桶
 12 ☒ 去離子水 20L * 1 桶
 13 ☒ 廢液桶 20L * 1 桶
 14 ☒ 帆布 5*5 _____ 件
 15 ☐ 皮尺 * _____ 捲
 16 ☒ 繩子 * 1 捲
 17 ☐ 指北針與GPS * 1個
 18 ☒ 拋棄式滴管
 19 ☐ 測距槍 * 1組
 20 ☒ 攪拌棒及擦拭紙
 21 ☒ 廣用試紙

- | 前 | 後 | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ☐ | ☐ | 22 透視度計 |
| ☒ | ☒ | 23 透明度板 |
| ☐ | ☐ | 24 過濾裝置*1組 |
| ☒ | ☒ | 25 電磁攪拌器+磁石 |
| ☒ | ☒ | 26 12電池+110V轉換器 |
| ☐ | ☐ | 27 橡皮艇 * _____ 台 |
| ☐ | ☐ | 28 碼錶 * _____ 個 |
| ☐ | ☐ | 29 延長桿 * _____ 支 |
| ☐ | ☐ | 30 量筒 _____ mL * _____ 個 |
| ☐ | ☐ | 量筒 _____ mL * _____ 個 |
| ☐ | ☐ | 31 |
| ☐ | ☐ | 32 |

三、採樣用具及容器

- 1 ☒ 採樣杓 * 1 支
 2 ☒ 定深採樣器 * 1 瓶
 3 ☒ 4LPE瓶 * 3 瓶
 4 ☒ 2LPE瓶 * 3 瓶
 5 ☒ 1LPE瓶 * 3 瓶
 6 ☐ L不透光PE瓶 * _____ 瓶
 7 ☐ Oil瓶1L * _____ 瓶
 8 ☐ TOC瓶100mL * _____ 瓶
 9 ☐ 大腸滅菌袋 * _____ 袋
 10 ☐ VOC瓶40mL * _____ 瓶
 11 ☐ 褐色玻璃瓶(Svoc)1L * _____ 瓶
 12 ☐ 褐色玻璃瓶(酚)1L * _____ 瓶
 13 ☐ BOD瓶300mL * _____ 瓶
 14 ☐ 0.5 LPE瓶 * _____ 瓶
 15 ☐ 0.3 LPE瓶 * _____ 瓶
 16 ☐ 0.25 LPE瓶 * _____ 瓶
 17 ☒ 0.1 LPE瓶 * 3 瓶
 18 ☐ * _____ 瓶

四、樣品保存劑

- 1 ☐ H₂SO₄
 2 ☒ HNO₃
 3 ☐ HCl
 4 ☐ 1:1 HCl
 5 ☐ H₃PO₄
 6 ☒ NaOH
 7 ☐ 去氯試劑
 8 ☐ 疊氮化鈉
 9 ☐ 抗壞血酸(維他命C)
 10 ☒ 冰塊
 11 ☒ 冰箱
 12 ☐

五、安全設備

- 1 ☒ 安全帽
 2 ☒ 工作服及安全鞋
 3 ☒ 警示標誌
 4 ☒ 尼龍手套
 5 ☒ 防酸手套
 6 ☒ 急救箱

六、品保與品管

- 1 ☒ 設備空白 * 1 組
 2 ☒ 現場空白 * 1 組
 3 ☒ 運送空白 * 1 組
 4 ☐ 重複樣品 * _____ 組
 5 ☐

水質採樣現場儀器使用校正記錄表

使用校正日期:

102/4/12

使用人員:

林俊承

儀器序號:

pH計 09290925 導電度計 09260607

溶氧計

10031711

ORP計

*

pH校正液編號:

4.0校正液: B13-600

7.0校正液: B14-600

10.0校正液: B15-600

7.0確認液: B14-601

0.01N 氯化鉀編號:

1020402 0201

採樣點:

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 <u>24.5</u> pH4.0溫度℃為 <u>24.7</u> pH10.0溫度℃為 <u>24.6</u> pH7.0確認值/溫度℃為 <u>7.00</u> / <u>24.6</u> (確認值須符合7.0 ± 0.05) 零點電位(mV) <u>-21.1</u> (應介於-25~-25之間) 斜率(mV/pH) <u>-54.5</u> (應介於-56~-61之間)
導電度計	儀器校正值為 <u>1413</u> (應介於1343~1483之間) 溫度(℃)為 <u>24.9</u>
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 <u>8.01</u> 校正時溫度(℃)為 <u>27.5</u> 飽和度(%) <u>101.0</u> (須符合$101.7 \pm 1\%$) 斜率 <u>0.80</u> (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 <u> </u> mV 儀器校正值為 <u> </u> mV 溫度(℃)為 <u> </u> (誤差須符合ORP標準液校正讀值$\pm 3\%$)

採樣點:

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 <u>24.6</u> pH4.0溫度℃為 <u>24.8</u> pH10.0溫度℃為 <u>24.7</u> pH7.0確認值/溫度℃為 <u>7.00</u> / <u>24.7</u> (確認值須符合7.0 ± 0.05) 零點電位(mV) <u>-21.2</u> (應介於-25~-25之間) 斜率(mV/pH) <u>-57.0</u> (應介於-56~-61之間)
導電度計	儀器校正值為 <u>1413</u> (應介於1343~1483之間) 溫度(℃)為 <u>24.9</u>
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 <u>8.05</u> 校正時溫度(℃)為 <u>27.3</u> 飽和度(%) <u>101.5</u> (須符合$101.7 \pm 1\%$) 斜率 <u>0.87</u> (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 <u> </u> mV 儀器校正值為 <u> </u> mV 溫度(℃)為 <u> </u> (誤差須符合ORP標準液校正讀值$\pm 3\%$)

採樣點:

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 <u>24.7</u> pH4.0溫度℃為 <u>24.9</u> pH10.0溫度℃為 <u>24.8</u> pH7.0確認值/溫度℃為 <u>7.00</u> / <u>24.6</u> (確認值須符合7.0 ± 0.05) 零點電位(mV) <u>-21.0</u> (應介於-25~-25之間) 斜率(mV/pH) <u>-57.1</u> (應介於-56~-61之間)
導電度計	儀器校正值為 <u>1413</u> (應介於1343~1483之間) 溫度(℃)為 <u>25.0</u>
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 <u>8.06</u> 校正時溫度(℃)為 <u>27.2</u> 飽和度(%) <u>101.6</u> (須符合$101.7 \pm 1\%$) 斜率 <u>0.85</u> (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 <u> </u> mV 儀器校正值為 <u> </u> mV 溫度(℃)為 <u> </u> (誤差須符合ORP標準液校正讀值$\pm 3\%$)

採樣點:

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 <u> </u> pH4.0溫度℃為 <u> </u> pH10.0溫度℃為 <u> </u> pH7.0確認值/溫度℃為 <u> </u> / <u> </u> (確認值須符合7.0 ± 0.05) 零點電位(mV) <u> </u> (應介於-25~-25之間) 斜率(mV/pH) <u> </u> (應介於-56~-61之間)
導電度計	儀器校正值為 <u> </u> (應介於1343~1483之間) 溫度(℃)為 <u> </u>
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 <u> </u> 校正時溫度(℃)為 <u> </u> 飽和度(%) <u> </u> (須符合$101.7 \pm 1\%$) 斜率 <u> </u> (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 <u> </u> mV 儀器校正值為 <u> </u> mV 溫度(℃)為 <u> </u> (誤差須符合ORP標準液校正讀值$\pm 3\%$)

附錄四、監測照片

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年四月份監測作業現場照片(空氣)




說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地

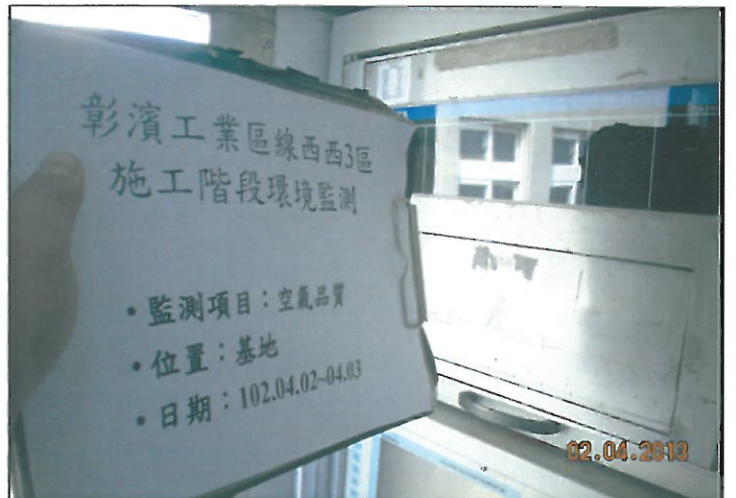

說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年四月份監測作業現場照片(空氣)



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地



說明： 項目：空氣監測
日期：102.04.02~04.03
地點：基地

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年四月份監測作業現場照片(海水)



說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02



說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02



說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02
地點：測站1



說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02
地點：測站1




說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02
地點：測站2



說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02
地點：測站2

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年四月份監測作業現場照片(海水)

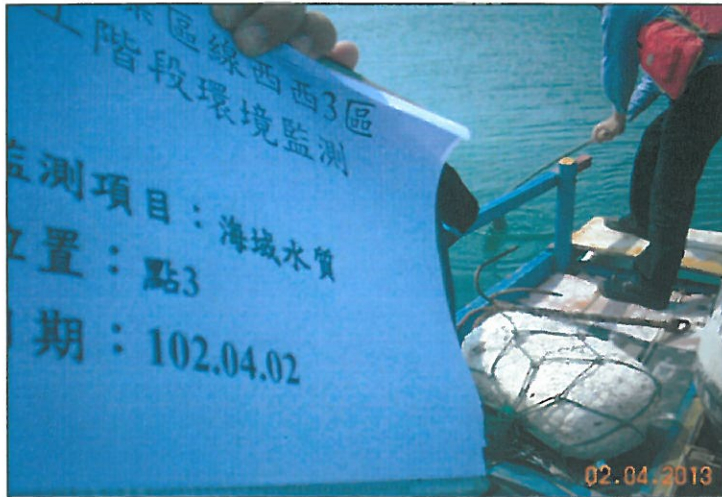

說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02
地點：測站3



說明： 項目：海域水質
日期：102.04.02
地點：測站3

附錄五、歷次環保機關審查意見及辦理 情形說明對照表

**A5.1 101 年第 2~4 季彰化縣環境保護局審查意見暨回覆辦理
情形說明(102.03.27)**

**A5.2 102 年第 1 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理
情形說明(102.05.28)**

**A5.1 101 年第 2~4 季彰化縣環境保護局
審查意見暨回覆辦理情說明
(102.03.27)**

電子公文

檔 號：
保存年限：

彰化縣環境保護局 函

地址：50057彰化市健興路1號2樓
承辦人：何奇？
電話：04-7115655-112
傳真：04-7119828
電子信箱：paperiso@chepb.gov.tw

受文者：經濟部工業局

發文日期：中華民國102年3月27日

發文字號：彰環綜字第1020011761號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析施工期間（101年第2季至第4季）環境監測報告」相關意見，請 查照。

說明：

一、依據 大局102年3月6日工地字第10200203890號函辦理。

訂 二、所送101年第2-4季環境監測報告，附錄一所附之環境檢驗測定機構許可證已逾期，請於下一季提送報告時一併更新。

正本：經濟部工業局

副本：行政院環境保護署、本局綜合計畫科

電子公文交換戳記

核

102-03-27 一般公文



10200203890

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填
地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告
101年度第2季~第4季報告(101年4月~101年12月)

環保局審查意見	開發單位辦理情形說明
1.所送 101 年第 2~4 季環境監測報告， 附錄一之環境檢驗測定機構許可証已 逾期，請於下一季提送報告時一併更 新。	1.遵照辦理，相關資料請參閱附錄一。

**A5.2 102 年第 1 季行政院環境保護署
審查意見暨回覆辦理情說明
(102.06.05)**

行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：涂邑靜
電話：(04)2252-1718 #123
傳真：(04)22591636
電子郵件：mitui@epa.gov.tw

受文者：經濟部工業局

發文日期：中華民國102年5月28日

發文字號：環署督字第1020044676號

遠別：普通件

密等及解密條件或保密期限：()

附件：

主旨：貴局所送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地
新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間102年第1
季監測報告」，本署審核意見，請 查照辦理。

說明：

一、依據 貴公司102年5月8日工地字第10200390060號函辦理。

二、本署審核意見如下：

(一)報告附錄三、品保/品管查核紀錄與原始數據之空氣檢
測項目部分缺TSP的採樣及校正紀錄；另採樣過程中使
用之儀器設備（如風速風向計、校正流量計等）之校正
紀錄未附，請補正說明。

(二)第1-57頁（三）儀器維修校正項目及頻率1.多點校正即
零點及3?5點高濃度校正，不符合本署公告之檢測方法。

(三)建議第1-10頁表1.5.3-1增列「感應偶和電漿園子發射
光譜儀」之校正維護項目與頻率。

三、上開意見，請 貴局於本案下次監測報告中說明辦理情形。

正本：經濟部工業局

副本：

??? 2013/5/31



經濟部工業局 函

地址：106臺北市信義路三段41-3號
聯絡人： 洪豪男
聯絡電話：02-27541255 分機2567
電子郵件：hnhorng@moeaidb.gov.tw
傳真：02-23255455

受文者：台灣電力股份有限公司

發文日期：中華民國102年6月5日

發文字號：工地字第10200462330號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：有關行政院環境保護署函送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間102年第1季監測報告審查意見勘誤表一案，請配合更正，請查照。

說明：

- 一、依據行政院環境保護署102年5月30日環署督字第1020045190號函辦理。
- 二、隨文檢附上開來函及勘誤表各1份。

正本：台灣電力股份有限公司

副本：經濟部工業局彰濱工業區服務中心、中華工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、
本局產業園區發展推動辦公室(合美)(均含附件)

行政院環境保護署公文勘誤表

日期	102 年 5 月 28 日
文別	函
發文字號	環署督字第 1020044676 號函（「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間 102 年第 1 季監測報告審查意見）
原文	說明：二、本署審核意見如下： （一）報告附錄三、…。 （二）第 1-57 頁（三）儀器維修項目及頻率 1.多點校正及零點及 3~5 點高濃度校正，不符本署公告之檢測方法。 （三）建議第 1-10 頁…。
更正內容	說明：二、本署審核意見如下： （一）報告附錄三、…。 （二）建議第 1-10 頁…。
備註	

請 查照惠予更正

此致

**「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填
地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告
102年第1季監測報告(102年1月~102年3月)**

行政院環境保護署審查意見	開發單位辦理情形說明
1.報告附錄三、品保/品管查核紀錄與原始數據之空氣檢測項目部份缺TSP的採樣及校正紀錄；另採樣過程中使用之儀器設備(如風速風向計、校正流量計等)之校正紀錄未附，請補正說明。	1.遵照辦理，相關資料已補充於附錄三。
2.建議第1-10頁表1.5.3-1增列「感應耦合電漿原子發射光譜儀」之校正維護項目及頻率。	3.遵照辦理，相關資料已補充於CH1.5.3；表1.5.3-2(P.1-12)。
