「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」

施工期間環境監測報告

102年第4季(期間：102年10月~102年12月)

開發單位：經濟部工業局

執行監測單位：創迅科技股份有限公司

提送日期：中華民國103年1月13日

目　錄

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告

102年第4季(期間：102年10月~102年12月)

目錄

頁次

表目錄

頁次

圖目錄

頁次

前　言

前　言

一、依據

依據 100 年 3 月 21 日環保署審核通過「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析報告」之定稿本，依環評承諾辦理該區開發期間就海域環境及空氣品質監測調查結果分析、檢討並作因應對策研擬，達成環評承諾要求。

二、監測執行期間

本季為施工期間 102 年之第 4 季環境監測，監測工作時程自 102 年 10 月~12 月底止。

三、執行監測單位

本計畫由創迅科技股份有限公司統籌執行及監測報告書之彙整，監測計畫中之空氣品質及海域水質檢測方面由瑩諮科技股份有限公司(環署檢字第 012A 號)執行現場監測及採樣工作，有關檢測公司認證資料請參閱附錄一。

第一章、監測內容概述

1.1 工程進度

1.2 監測情形概述

1.3 監測計畫概述

1.4 監測位置

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管
1.5.2 分析工作之品保/品管
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率
1.5.4 分析項目之檢測方法
1.5.5 數據處理原則

第一章、監測內容概述

1.1 工程進度

「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源工程」，施工期程預估約於 7 年內完成填築作業，主要施工內容包括輸排灰設備工程、土建工程及煤灰填地工程等，相關之預定工程進度如下所述：

一、輸排灰設備工程：已於 101 年 4 月 12 日申報開工，預定於 102 年 12 月完工，有關工程進度之預估請參閱表 1.1-1。

二、土建工程：已於 101 年 7 月 13 日申報開工，9 月 27 日進場施工，預定於 103 年 1 月完工，累計本季之總完成工程進度為 99.51 %，如表 1.1-2 所示。

三、煤灰填地工程：台中發電廠事業廢棄物清理計畫書，已於 102 年 9 月 16 日獲台中市政府環境保護局核備，待各項準備工作就緒後，即開始進行煤灰填地工程。

表 1.1-1　輸排灰設備工程預定工程進度表

工程項目	101 年									102 年											
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1.開工	12 日																				
2.圍堤填地																					
3.管理員室																					
4.儀控施工及安裝																					
5.電力外管路																					
6.試運轉及修正																					
7.現場整理及申報竣工																					

表 1.1-2　土建工程預定工程進度表

項次	工程項目	權重%	101年7月	8月	9月	10月	11月	12月	102年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	103年1月
			19	50	80	111	141	172	203	231	262	292	323	353	384	415	445	476	506	537	540
1	假設工程	0.51%	49.49%	50.51%																	
2	預鑄方塊製作	16.43%		5.74%	7.10%	7.18%	7.18%	10.04%	10.76%	12.20%	12.48%	12.98%	14.34%								
3	東隔堤北段堤岸(下層) (E0k+000.00~E0k+442.52)	11.56%			15.29%	25.07%	29.06%	30.58%													
4	東隔堤北段堤岸(上層) (E0k+000.00~E0k+442.52)	4.96%						27.31%	29.69%	42.99%											
5	東隔堤北段排水溝、護欄 (E0k+000.00~E0k+442.52)	2.35%							21.61%	33.67%	44.72%										
6	東隔堤北段路面工程 (E0k+000.00~E0k+442.52)	1.06%									33.34%	66.66%	東隔堤北段施工								
7	東隔堤南段堤岸(下層) (E0k+469.65~E1k+540.77)	28.00%							6.91%	12.88%	14.82%	16.85%	17.81%	20.21%	10.53%						
8	東隔堤南段堤岸(上層) (E0k+469.65~E1k+540.77)	12.00%											13.07%	15.42%	16.41%	17.39%	18.37%	19.35%			
9	東隔堤南段排水溝、護欄 (E0k+469.65~E1k+540.77)	5.68%														12.45%	15.56%	18.46%	37.97%	15.56%	
10	東隔堤南段路面工程 (E0k+469.65~E1k+540.77)	2.58%																		80.82%	19.18%
11	彰濱西五路路堤(下層)	8.61%												12.19%	13.98%	35.61%	38.22%				
12	彰濱西五路路堤(上層)	4.30%															27.95%	35.07%	36.98%		
13	彰濱西五路排水管	0.11%																	100.00%		
14	彰濱西五路覆蓋土	1.85%																	39.49%	60.51%	
	總　計	100.00%																			
	預定進度 %		0.25%	1.20%	2.93%	4.08%	4.54%	6.54%	5.68%	8.54%	7.60%	7.56%	8.91%	8.56%	6.12%	5.86%	7.58%	4.88%	4.59%	4.09%	0.49%
	累計進度 %		0.25%	1.45%	4.38%	8.46%	13.00%	19.54%	25.22%	33.76%	41.36%	48.92%	57.83%	66.39%	72.51%	78.37%	85.95%	90.83%	95.42%	99.51%	100.00%

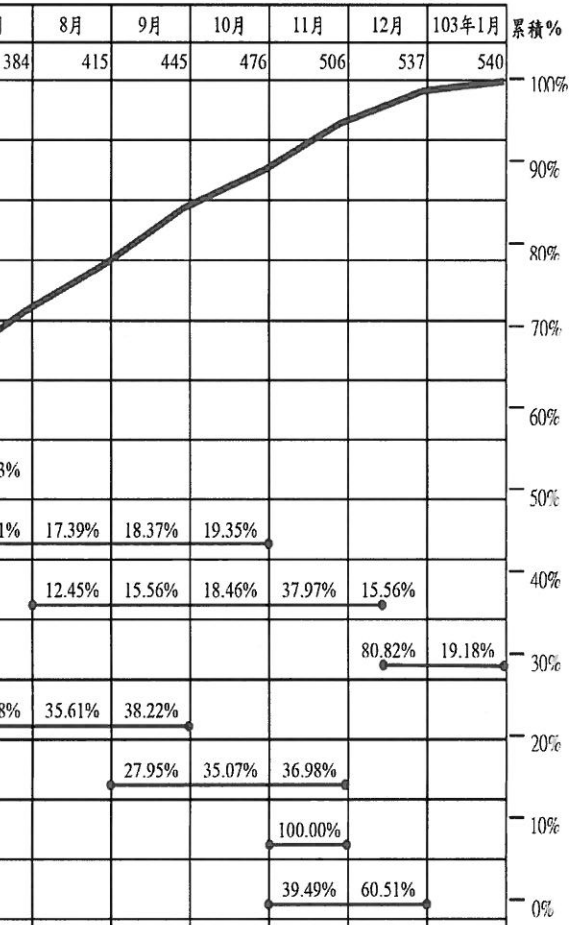

1.2 監測情形概述

本季為施工期間第八季環境監測(含施工前環境監測)，屬 102 年之第 4 季環境監測，監測工作時程自 102 年 10 月~12 月底止。本季於空氣品質及海域水質方面，監測結果，皆符合相關法令標準限值，監測項目如表 1.2-1 所示。

表 1.2-1　監測結果概述

監測類別	監測項目	本季監測結果摘要(102/10~102/12)	因應對策
空氣品質	1.風向 2.風速 3.總懸浮微粒(TSP) 4.粒徑≦10μm 之懸浮微粒(PM_{10}) 5.二氧化氮(NO_2) 6.二氧化硫(SO_2) 7.一氧化碳(CO)	監測時間為民國 102/10/13~14，監測地點為線西西 3 區填築作業區(海巡署崗哨)，監測結果皆符合空氣品質標準限值。	持續監測
海域水質	1.水溫 2.透明度 3.溶氧量(DO) 4.鹽度 5.生化需氧量(BOD) 6.pH 值 7.重金屬(銅(Cu)、硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)、砷(As))	監測時間為民國 102/10/13，監測地點為線西西 3 區填築作業區北側、西側及南側海域，監測結果各測站皆符合乙類海域水質標準。	持續監測

1.3 監測計畫概述

本計畫施工期間之環境監測內容，依據環評承諾事項辦理，監測項目包含空氣品質及海域水質等，監測頻率為每季進行乙次，如表 1.3-1 所示，相關說明分述如下：

一、空氣品質

(一)監測項目：風向、風速、總懸浮微粒(TSP)、粒徑≦10μm 之懸浮微粒(PM_{10})、二氧化氮(NO_2)、二氧化硫(SO_2)、一氧化碳(CO)。

(二)頻率：施工期間每季進行乙次，每次連續 24 小時。

(三)方法：依據行政院環境保護署公告之 NIEA 相關規定辦理。

二、海域水質

(一)監測項目：水溫、透明度、溶氧量(DO)、鹽度、生化需氧量(BOD)、pH 值、重金屬(銅(Cu)、硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)、砷(As))。

(二)頻率：施工期間每季進行乙次。

(三)方法：依據行政院環境保護署公告之 NIEA 相關規定辦理。

表 1.3-1 彰濱工業區線西西 3 區施工期間環境監測計畫

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行執行單位	執行監測時間
空氣品質	1.風向 2.風速 3.總懸浮微粒(TSP) 4.粒徑≦10μm 之懸浮微粒(PM_{10}) 5.二氧化氮(NO_2) 6.二氧化硫(SO_2) 7.一氧化碳(CO)	線西西 3 區填築作業區(海巡署崗哨)。	每季進行 1 次，24 小時連續監測。	氣象設備自動測定法 氣象設備自動測定法 NIEA A102.12A NIEA A206.10C NIEA A417.11C NIEA A416.12C NIEA A421.12C	瑩諮科技股份有限公司(環署環檢字第 012A 號)	102/10/13 ~ 102/10/14
海域水質	1.水溫 2.透明度 3.溶氧量(DO) 4.鹽度 5.生化需氧量(BOD) 6.pH 值 7.重金屬 (1)銅(Cu) (2)鋅(Zn) (3)鉛(Pb) (4)鎘(Cd) (5)硒(Se) (6)鉻(Cr) (7)汞(Hg) (8)砷(As)	線西西 3 區填築作業區北側、西側及南側海域各選取 1 處，共計 3 處測站。	每季進行 1 次。	NIEA W217.51A NIEA E220.50C NIEA W455.52C NIEA W447.20C NIEA W510.55B NIEA W424.52A NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C NIEA W311.52C NIEA W311.52C NIEA W330.52A NIEA W434.53B	瑩諮科技股份有限公司(環署環檢字第 012A 號)	102/10/13

1.4 監測位置

本計畫依據 100 年 3 月 21 日環保署審核修正通過「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析報告」之定稿本，內文中所提及之環境監測計畫，選定具有代表性之監測位置，如圖 1.4-1 所示。

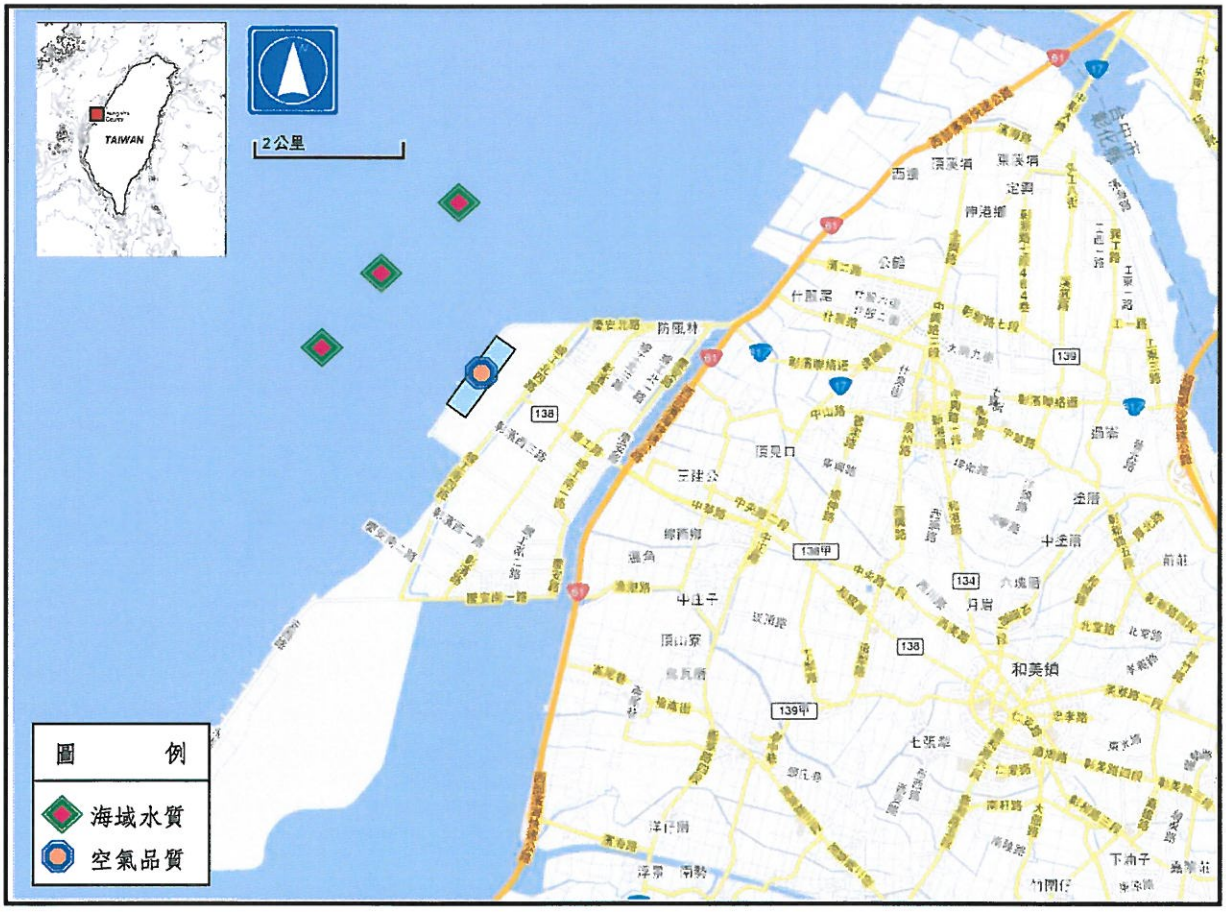

圖 1.4-1 施工期間環境監測位置圖

1.5 品保/品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保/品管

為確保本監測計畫監測數據品質，除了在樣品檢測分析過程中執行品保品管作業外，更應注意樣品之採集、輸送及保存作業中所有步驟是否依據標準作業程序進行，惟有採集正確且不受污染或變質之樣品，其檢測結果方能代表受測環境的真實值。為達上述目的，採樣作業流程圖(圖 1.5.1-1)提供採樣人員從採樣作業開始至樣品送達實驗室接收為止之採樣標準作業程序。

本監測計畫於本次執行空氣品質及海域水質，其中空氣品質均須在採樣現場使用各分析儀器，依規定之標準操作程序即刻分析。

在監測作業上除遵照環保署所公告之標準方法進行外，並依照表 1.5.1-1 之採樣作業準則及表 1.5.1-2~3 採樣至運輸過程中注意事項進行採樣工作。

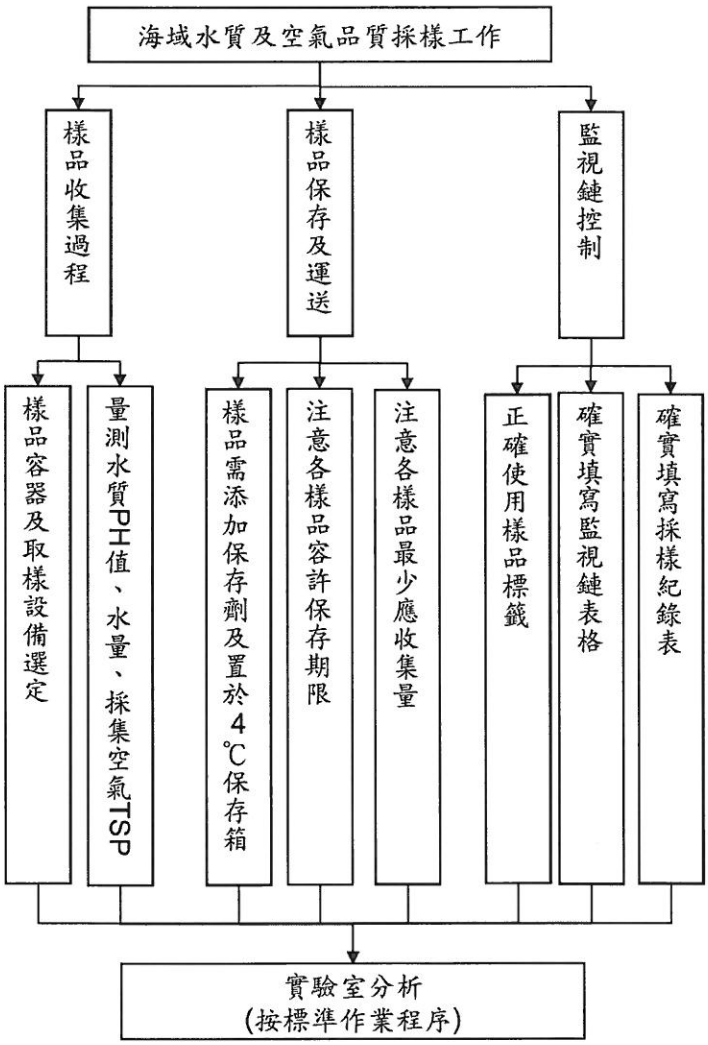

圖 1.5.1-1　採樣作業流程圖

表 1.5.1-1 採樣作業準則

採樣項目	作業準則
空氣品質	▶監測站宜尋找空曠地點，避免受建築物及樹林所遮蔽。 ▶遠離交通要道，以避免受交通工具排放污染物之影響。 ▶須有便利之電源供應及容量應符合需要。 ▶測站附近不應有大型工作機具。
海域水質	▶每次採樣前由實驗室計畫負責人先行收集相關天候、漲退潮資訊。 ▶以採集具代表性水樣為主(符合行政院環境保護署環境水質監測採樣作業指引)。

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

表 1.5.1-2 空氣品質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
現場記錄	▶了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。	▶必須將氣象資料，周界環境因子詳加記載。
穩定/校正	▶確保分析所得之數據具有代表性。	▶使用儀器前必須先經流量校正
採樣	▶採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。	▶使用測定前預先開機運轉至流量穩定，才開始測定 24 小時之值。
運送空白	▶為確保分析結果之正確性，每次均有一組運送空白樣品。	▶以運送空白，瞭解運送過程之完整性。
儲存/運送	▶避免樣品因儲存時間過久或是運送不當，造成品質變化。	▶依照環保署所公告規定項目保存方式加以運送保存，並注意密封時之完整性。

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

表 1.5.1-3 海域水質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
清洗採樣設備	▶洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	▶須用試劑水清洗採樣器。
採樣	▶自水體採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	▶在採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧等，宜避免有氣泡殘存。
現場測定	▶為確保取出樣品為具代表性一些指標於取樣後應盡速分析。	▶pH 值、導電度及溫度應於現場立即進行分析。
樣品保存與運輸	▶樣品分析前應依樣品保存方式，予以保存，俾使化學性質變化減至最小。	▶須遵照環檢所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析。

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

1.5.2 分析工作之品保/品管

實驗室的分析流程，均依照或參考環保署公告之檢測方法，而從樣品收樣開始至報告之訂定完成，每一步驟都參照品保/品管作業流程(圖 1.5.2-1)，以確保實驗室中品保/品管正確無誤。

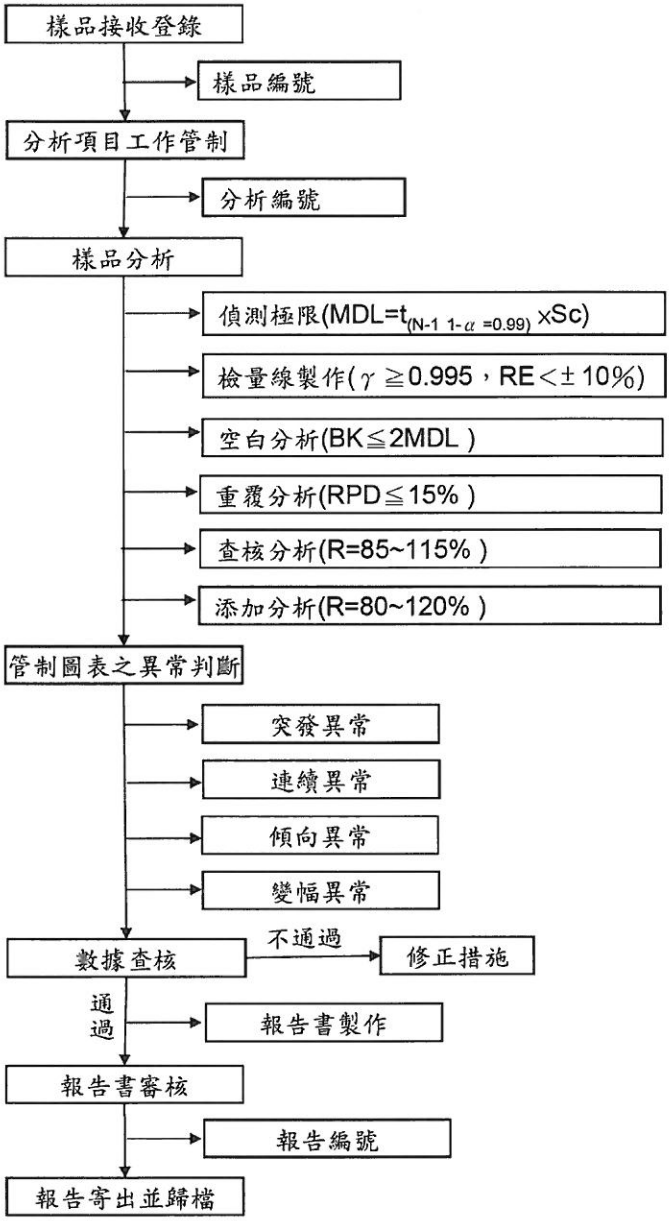

圖 1.5.2-1　品保/品管作業流程圖

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

本計畫執行監測之儀器，均定期之維修校正，維修校正之項目及頻率，如表 1.5.3-1 所示。

表 1.5.3-1 儀器維修校正情形(1/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物件	校正維護步驟與相關規定	參考資料
1	溫度計 ▶參考溫度計 (liquid-in-glass) ▶工作溫度計 (liquid-in-glass)	▶外部校正 ▶內部校正 ▶內部校正	▶每六年校正一次 ▶六個月 ▶初次使用前 ▶六個月	▶完整的校正 ▶冰點 ▶多點溫度校正 (1)冰點 (2)室溫 (3)油沸點 (4)水沸點	 ▶參考溫度計 ▶參考溫度計 ▶參考溫度計 ▶參考溫度計 ▶參考溫度計	 ▶冰點檢查 ▶用參考溫度計做溫度檢查(包含冰點及選擇足夠的檢查點以涵蓋使用範圍) ▶使用參考溫度計做冰點或使用範圍內之單點檢查	
2	▶工作熱電偶 (Working thermocouples)	▶內部校正	▶六個月	▶冰點、室溫、油沸點、水沸點	▶參考溫度計	▶使用參考溫度計做多點溫度檢查	
3	玻璃器皿 ▶玻璃器皿(含玻璃量瓶、玻璃移液管、玻璃滴定管等) ▶活塞操作定容裝置 (piston operated) (1)自動移液器(Pipettes) (2)分液器(Dispensers) (3)自動滴定管(Burettes)	▶內部校正 ▶內部校正 ▶內部校正 ▶內部校正 ▶內部校正	▶每年校正一次(附有證書之 A 級品初次使用前不需校正) ▶初次使用前(有原廠保證書即不用校正) ▶三個月 ▶同自動移液器 ▶初次使用前 ▶每六個月及當內管或外筒(barrel / plunger)換新時	▶標示體積 ▶標示體積 ▶標示體積 ▶標示體積 ▶標示體積 ▶標示體積		▶檢查器示最大值；對可調整移取體積者，至少檢查器示最大值與其他 2 個設定之移取體積。 ▶同上或至少檢查使用時所設定之移取體積 ▶同自動移液器 ▶檢查器示最大值與其他 2 個設定之移取體積 ▶同上	▶NIEA-PA 106

表 1.5.3-1　儀器維修校正情形(2/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物	校正維護步驟與相關規定	參考資料
4	瞬間與累積流量計 ▶動態稀釋器(周界) ▶小孔流量計 ▶溼式流量計及乾式流量計 ▶風速/風向計/溫度/濕度 ▶皮托管(Pitot tubes)	▶外部校正 ▶外部校正 ▶外部校正 ▶內部校正 ▶外部校正 ▶內部校正或維護	▶一年(南部監測中心) ▶一年(南部監測中心) ▶二年 ▶6 個月 ▶一年 ▶初次使用時 ▶採樣前 ▶6 個月	▶流量 ▶流量 ▶體積 ▶皮托管係數 ▶皮托管係數或確認構造特性		▶用肥皂流量計校正 ▶目視檢查是否損壞或污染 ▶檢查方向及尺寸吻合性 ▶檢查是否有損壞、堵塞等	
5	▶微量天平	▶外部校正 ▶內部校正 ▶內部校正 ▶內部校正	▶三年 ▶半年 ▶每月 ▶使用前	▶待校天平以外校砝碼校準後讀取	▶標準 E2 級砝碼 ▶一級砝碼 ▶一級砝碼		
6	▶上皿天平	▶外部校正 ▶內部校正 ▶內部校正 ▶內部校正	▶每年 ▶半年 ▶每月 ▶使用前	▶待校天平以外校砝碼校準後讀取	▶標準 E2 級砝碼 ▶一級砝碼 一級砝碼		
7	▶參考氣壓計 ▶工作氣壓計	▶外部校正 ▶內部校正	▶一年 ▶六個月(改每次攜出做比對)	▶多點壓力刻度 ▶大氣壓校正	▶參考壓力計	▶檢查、維護、比對	
8	▶BOD 培養箱 (BOD incubator) ▶BOD 瓶	▶檢查維護 ▶內部校正	▶使用期間 ▶一年	▶溫度 ▶標示體積	▶高低溫溫度計	▶檢查開始測試時 BOD 培養箱之溫度及五天培養期間之最高與最低溫度。	

表 1.5.3-1 儀器維修校正情形(3/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物件	校正維護步驟與相關規定	參考資料
9	▶培養箱	▶檢查維護	▶使用期間	▶溫度	▶專用溫度計	▶使用專用且經校正之溫度計(或適當溫度檢測器)，監視培養箱內部的溫度並記錄之，溫度需維持在±1℃或在方法中可允許之範圍。	
10	▶乾燥烘箱(Oven) ▶高溫爐	▶內部校正 ▶檢查維護	▶二年一次 ▶使用時	▶溫度 ▶溫度	▶熱電偶	▶檢查溫度變化 ▶檢查烘箱內使用位置之溫度變化 ▶以適當的檢測器(Sensor)監視溫度並記錄	
11	▶導電度計	▶內部校正	▶使用前 ▶每年	▶單點檢查 全刻度檢查			
12	▶pH 計	▶內部校正	▶使用前	▶pH 值(線性)	▶標準緩衝溶液	▶以涵蓋待測樣品 pH 值之兩種標準緩衝溶液進行校正	
13	▶溶氧計	▶內部校正	▶使用前 ▶每月	▶單點檢查 ▶與傳統滴定做比較			
14	▶分光光度計(Spectrophotometers)	▶內部校正	▶使用前 ▶三個月	▶檢量線製備 ▶波長準確度、吸光度、線性(Linearity)、迷光(Stray light)、樣品吸光槽配對(Matching of cells)之校正	▶參考標準品		▶NIEA-PA103 及各該廠牌儀器之使用手冊 ▶各該廠牌儀器之使用手冊

表 1.5.3-1 儀器維修校正情形(4/4)

序號	儀器設備名稱	校正或維護別	校正或維護週期	校正或維護項目	標準或參考物件	校正維護步驟與相關規定	參考資料
15	▶吹氣捕捉儀	▶內部校正與維護	▶每批次樣品分析前 ▶更換試劑水後	▶溫度檢視 ▶壓力檢視 ▶試劑水存量檢查(手動者免執行) ▶管路潤洗		▶檢視熱脫附 Heater 溫度 ▶檢視熱脫附表壓 ▶檢視試劑水位是否高於安全存量線 ▶H_2O/Std Prime 作動	▶各該廠牌儀器之使用手冊
16	▶自動進樣儀	▶內部校正與維護	▶每批次樣品分析前	▶壓力檢視		▶檢視 Oven Heater 溫度 ▶檢視氣體壓力	▶各該廠牌儀器之使用手冊
17	▶感應偶和電漿原子發射光譜儀	▶內部校正與維護	▶使用前	▶Cu/Pb 訊號強度比值(須符合當年度管制值) ▶Mn check：確認 ICP 感度，同心圓霧化器 300 萬以上，抗高鹽類霧化器 250 萬以上。			▶各該廠牌儀器之使用手冊
18	▶真空壓力表 ▶工作壓力表	▶外部校正	▶每年一次				
19	▶周界分析儀(CO,Nox,SO_2,O_3.THC)	▶內部校正	▶使用前後	▶檢量線多點校正 ▶單點校正			
20	▶高量採樣器(Hi-vol)	▶內部校正	▶更換碳刷或維修作多點 ▶使用前後	▶檢量線多點校正 ▶單點校正			

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

1.5.4 分析項目之檢測方法

有關本監測計畫空氣品質及海域水質各檢測項目之檢驗分析方法及偵測極限值等，請參閱表 1.5.4-1~2。

表 1.5.4-1 空氣品質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	儀器偵測極限	重複分析	添加回收率(%)
風向	—	—	0~360 度	—	—
風速	—	—	0.5~20 m/s	—	—
總懸浮微粒(TSP)	NIEA A102.12A	—	1.0 $\mu g/m^3$	—	—
粒徑≦10 μm 之懸浮微粒(PM_{10})	NIEA A206.10C	—	10 $\mu g/m^3$	—	—
二氧化氮(NO_2)	NIEA A417.11C	—	1.0 ppb	—	—
二氧化硫(SO_2)	NIEA A416.12C	—	1.0 ppb	—	—
一氧化碳(CO)	NIEA A421.12C	—	0.1 ppm	—	—

資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

表 1.5.4-2 海域水質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	重複分析(%)	添加回收率(%)	查核回收率(%)
水溫	NIEA W217.51A	—	±0.5℃	—	—
透明度	NIEA E220.50C	—	—	—	—
溶氧(DO)	NIEA W455.52C	—	0~6.1	—	—
鹽度	NIEA W447.20C	—	±1.0	—	—
生化需氧量(BOD)	NIEA W510.55B	—	0~10.0	—	85~114
pH	NIEA W424.52A	—	±0.1	—	—
銅(Cu)	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	0.00060 mg/L	0~11.5	80~115	84~112
鋅(Zn)		0.00092 mg/L	0~8.5	85~115	82~114
鉛(Pb)		0.00096 mg/L	0~7.3	85~116	82~115
鎘(Cd)		0.00066 mg/L	0~6.1	83~115	83~115
硒(Se)	NIEA W311.52C	0.0054 mg/L	0~8.8	86~120	88~112
鉻(Cr)	NIEA W311.52C	0.0125 mg/L	0~8.8	84~118	83~112
汞(Hg)	NIEA W330.52A	0.000575 mg/L	0~7.1	84~115	82~115
砷(As)	NIEA W434.53B	0.00010 mg/L	0~8.1	85~115	81~116

註：鉻(Cr)為 QDL 定量偵測極限。
資料來源：瑩諮科技股份有限公司提供。

1.5.5 數據處理原則

一、有效測值定義

空氣監測項目，數據計算處理方式，以算術平均方式處理，有效小時平均值，應至少有 3/4 以上有效值(即 45 分鐘以上)，有效日平均值，應至少有 2/3 以上有效值(即每日 16 小時以上)，有效月平均值，應至少有 2/3 以上有效值(即每月至少 20 有效日以上)方為有效值。以確保數據之有效及準確性。

二、有效位數定義

檢測人員於採樣分析過程中，各種化學物理之量度，其真實值與觀測值間多少有些差異即為誤差。通常一觀測值乃由一正確數字加上一位未確定之估計值所組成；分析所得之結果數據則於計算過程中以「有效數字法」將不準度捨去。

(一)加減：以小數點位數最少者作基準，將計算所得結果歸整為相同之小數點位數。

(二)乘除：有效位數相乘除時，計算所得之有效位數的取捨以各數值中有效位數最少者為標準。

(三)進位方法：四捨五入法。

以上加減或乘除有效位數之取捨乃檢驗數據運算之通則、檢驗室各檢驗類別之分析項目皆依照此原則決定檢測數據之有效位數。

三、方法偵測極限值之數據處理

檢測分析數據，QDL 表定量偵測極限，MDL 表方法偵測極限，ND 表小於方法偵測極限，若有檢測出低於方法偵測極限值之數據結果，則一概均以 ND(低於方法偵測極限值)記錄處理，計算平均值時則以 MDL 及 QDL 值代入計算。

第二章、監測結果數據分析

2.1 氣象及空氣品質

2.2 海域水質

第二章、監測結果數據分析

本季為施工期間第八季環境監測(含施工前環境監測)，屬 102 年之第 4 季環境監測，監測工作時程自 102 年 10 月~12 月底止。監測項目包含空氣品質及海域水質等，監測結果，分述於下列各節。品保/品管記錄、相關監測原始數據及現場照片等請參閱附錄三~附錄四。

2.1 氣象及空氣品質

本季氣象及空氣品質之監測時間為 102 年 10 月 13 日~102 年 10 月 14 日，監測地點為線西西 3 區填築作業區(海巡署崗哨)，有關本季氣象及空氣品質之監測結果彙整如表 2.1-1 所示，茲分述如下：

一、氣象

(一)風向：本季監測日之盛行風向為北風。

(二)風速：本季監測日之日平均風速為 5.3 m/s。

二、空氣品質

本季空氣品質監測之監測項目包括：總懸浮微粒(TSP)、粒徑≦10μm 之懸浮微粒(PM_{10})、二氧化氮(NO_2)、二氧化硫(SO_2)及一氧化碳(CO)，監測結果皆符合環保署公告之空氣品質標準值(101 年環署空字第 1010038913 號令修正發布)，監測結果分述如下：

(一)總懸浮微粒(TSP)

本季調查結果，測站之總懸浮微粒(TSP)之 24 小時值為 125 μg/m^3，符合空氣品質 250 μg/m^3 之標準值。

(二)懸浮微粒(PM_{10})

本季調查結果，測站之粒徑≦10 μm 懸浮微粒(PM_{10})之 24 小時值為 62 μg/m^3，符合空氣品質 125 μg/m^3 之標準值。

(三)二氧化氮(NO_2)

本季調查結果，測站之二氧化氮(NO_2)之小時平均最大值為 0.005 ppm，符合空氣品質 0.25 ppm 之標準值。

(四)二氧化硫(SO_2)

本季調查結果，測站之二氧化硫(SO_2)之小時平均最大值為 0.003 ppm，日平均值為 0.002 ppm，符合空氣品質小時平均最大值 0.25 ppm 及日平均值 0.1 ppm 之標準值。

(五)一氧化碳(CO)

本季調查結果，測站之一氧化碳(CO)之小時平均最大值為 0.2 ppm，最大八小時平均值為 0.1 ppm，均符合空氣品質小時平均值 35 ppm 及八小時平均值 9 ppm 之標準值。

表 2.1-1 空氣品質監測調查綜合成果

項目	最頻風向	平均風速 (m/s)	總懸浮微粒 (TSP) ($\mu g/m^3$)	粒徑≦10μm 之懸浮微粒(PM_{10}) ($\mu g/m^3$)	二氧化氮 (NO_2) (ppm)	二氧化硫 (SO_2) (ppm)		一氧化碳 (CO) (ppm)	
			24 小時值	24 小時值	小時平均最大值	日平均值	小時平均最大值	小時平均最大值	最大 8 小時平均值
101/1/10~11	東風	12.6	122	41	0.007	0.002	0.002	0.4	0.4
101/5/13~14	東南風	3.8	70	49	0.015	0.002	0.005	0.4	0.3
101/7/24~25	北北東風	3.2	50	21	0.018	0.002	0.005	0.4	0.6
101/10/8~9	北北東風	7.9	95	42	0.013	0.002	0.005	0.2	0.2
102/1/15~16	北北西風	5.5	126	67	0.020	0.002	0.005	0.5	0.5
102/4/2~3	西風	8.0	182	87	0.013	0.001	0.002	0.7	0.7
102/7/29~30	西北西/西北	4.3	168	79	0.006	0.002	0.004	0.2	0.1
102/10/13~14	北風	5.3	125	62	0.005	0.002	0.003	0.2	0.1
法規標準	--	--	250	125	0.25	0.1	0.25	35	9

註：1.監測單位：瑩諮科技股份有限公司(行政院環保署認可証字號第 012 號)。
2.空氣品質標準，行政院環境保護署，101.05.14 環署空字第 1010038913 號令修正發布。

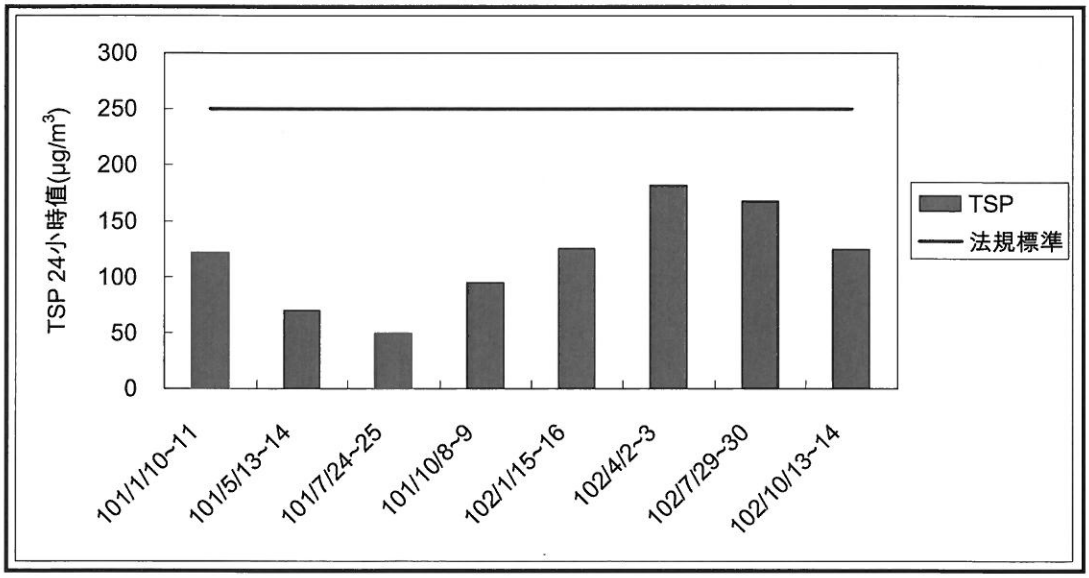

圖 2.1-1　總懸浮微粒 24 小時值監測成果彙整

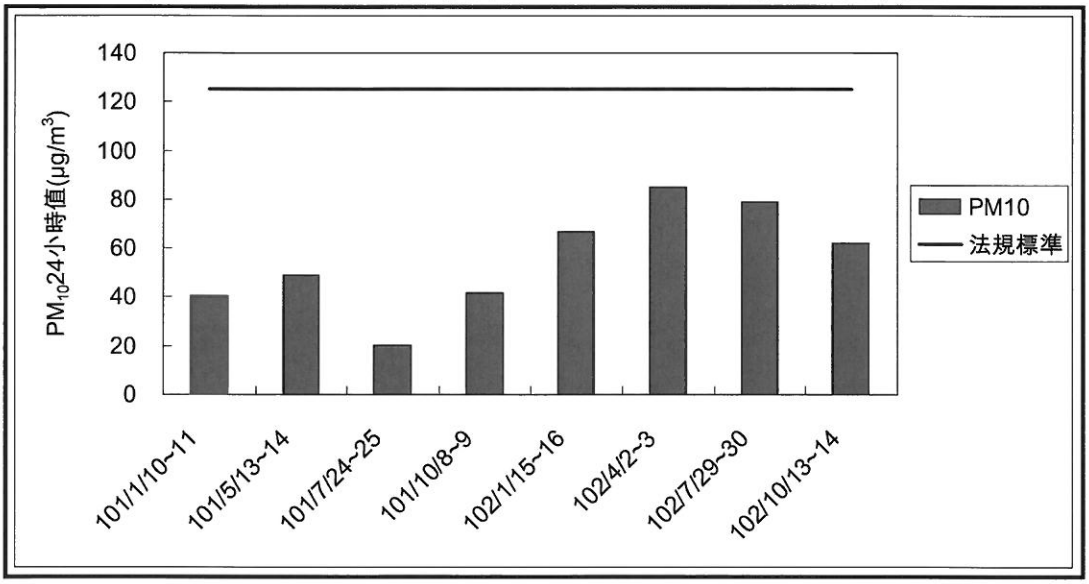

圖 2.1-2　粒徑≦10μm 之懸浮微粒 24 小時值監測成果彙整

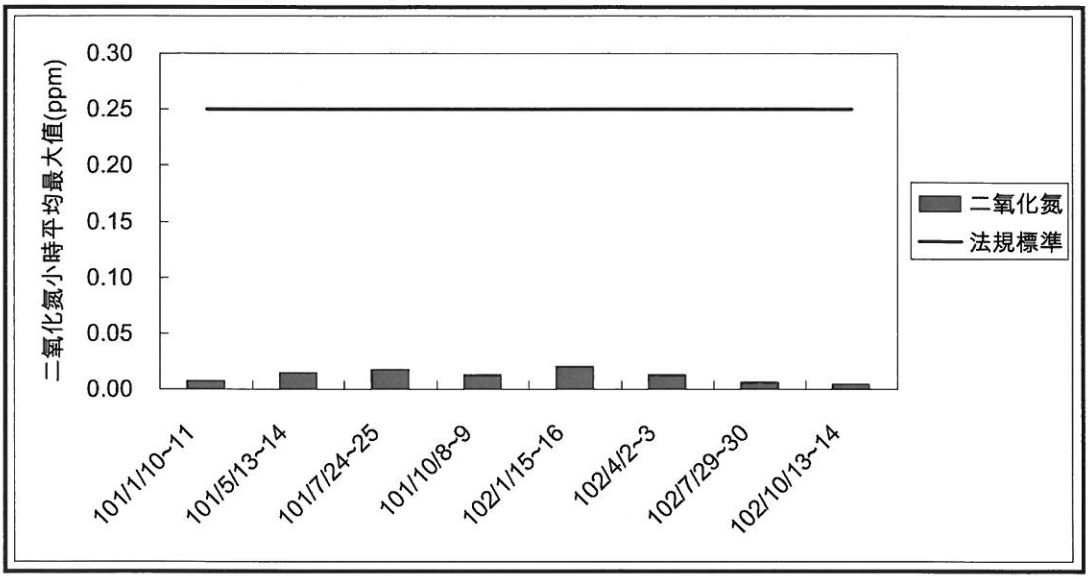

圖 2.1-3　二氧化氮小時平均最大值監測成果彙整

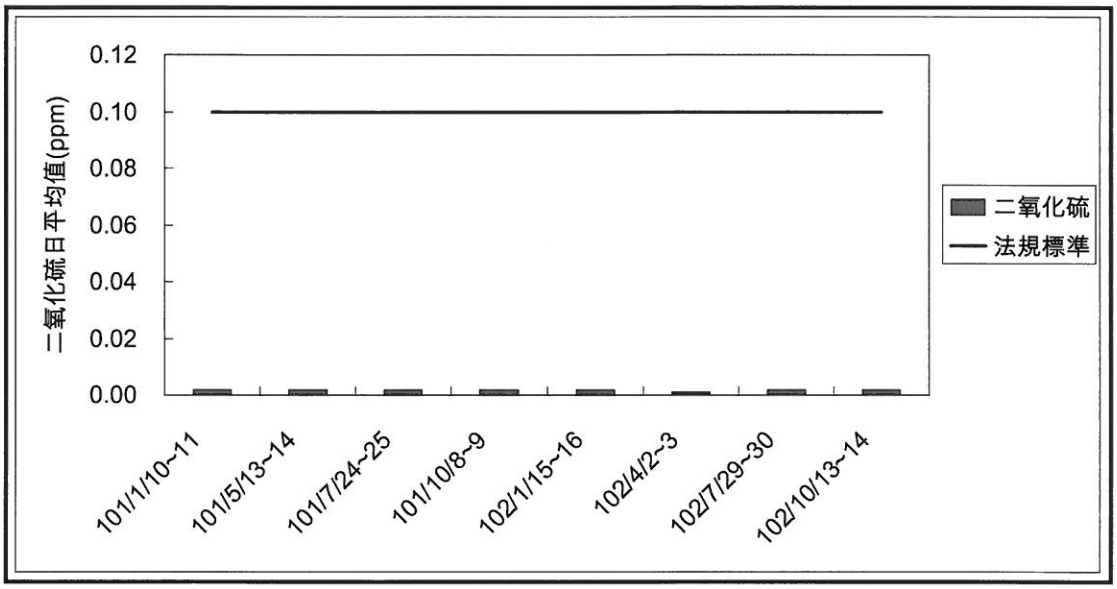

圖 2.1-4　二氧化硫日平均值監測成果彙整

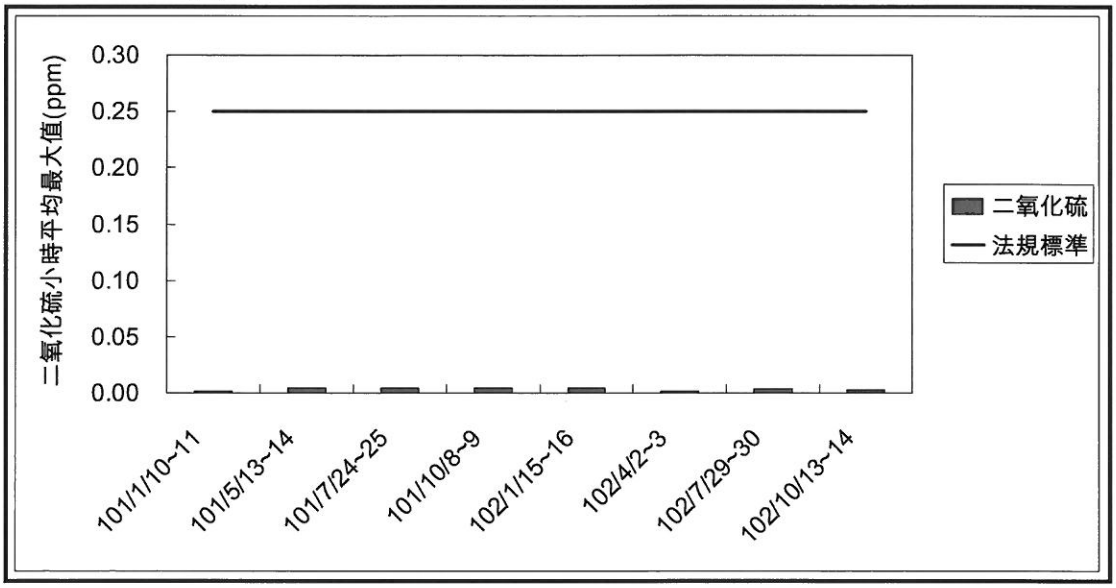

圖 2.1-5　二氧化硫小時平均最大值監測成果彙整

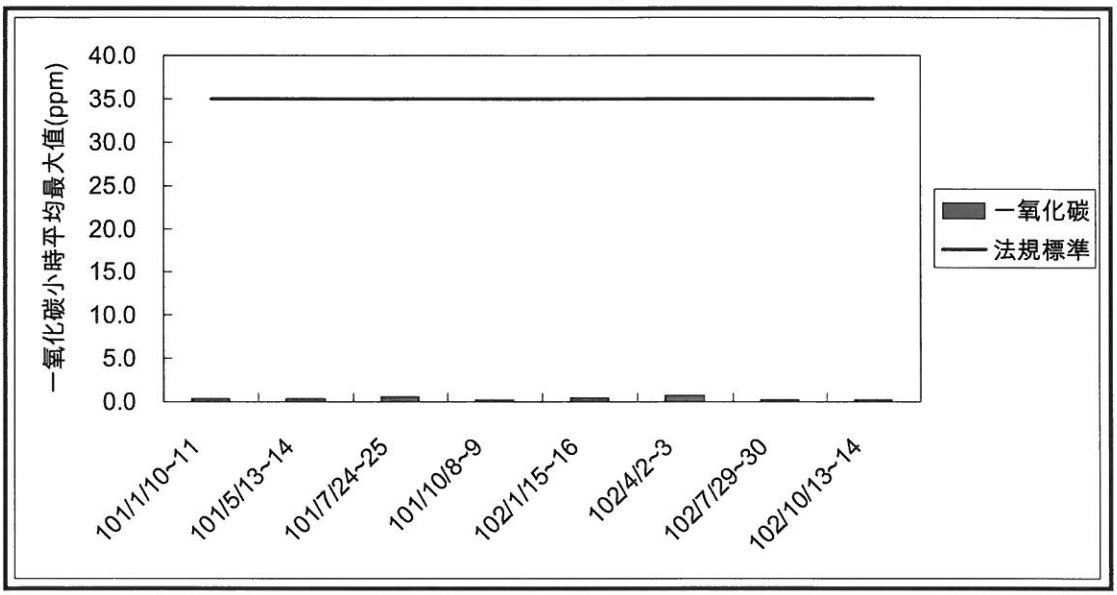

圖 2.1-6　一氧化碳小時平均最大值監測成果彙整

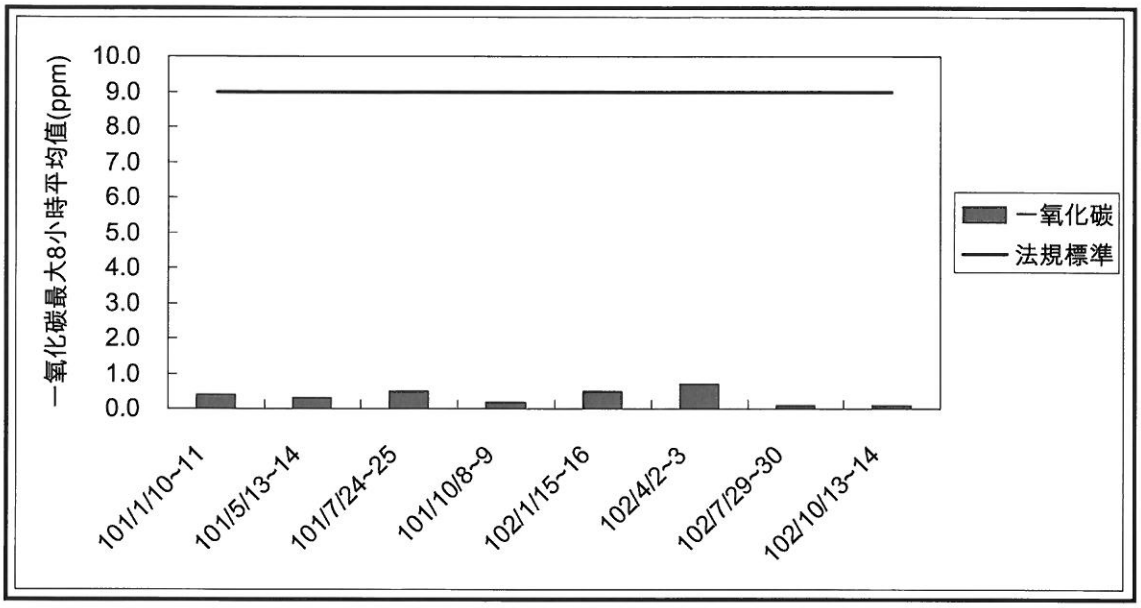

圖 2.1-7　一氧化碳 8 小時平均最大值監測成果彙整

2.2 海域水質

本季海域水質之監測時間為 102 年 10 月 13 日，監測地點為線西西 3 區填築作業區北側、西側及南側海域，本季海域水質之監測項目包括：水溫、透明度、溶氧量(DO)、鹽度、生化需氧量(BOD)、pH 值、重金屬(銅(Cu)、硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)、砷(As))，各測站之監測結果皆符合乙類海域環境標準值((90)環署水字第 0081750 號)，有關本季海域水質之監測結果彙整如表 2.2-1 所示，茲分述如下：

一、水溫

本季調查結果，各測站水溫之測值介於 27.3~27.6 ℃之間，各測站之差異變化不明顯。

二、透明度

本季調查結果，各測站透明度之測值介於 70~80 cm 之間，各測站之差異變化不明顯。

三、溶氧量(DO)

本季調查結果，各測站溶氧量(DO)之測值介於 6.3~6.5 mg/L 之間，符合乙類海域環境標準 5.0 mg/L 以上標準值。

四、鹽度

本季調查結果，各測站鹽度之測值介於 34.0~34.1 psu。

五、生化需氧量(BOD)

本季調查結果，各測站生化需氧量(BOD)之測值介於 0.8~0.9 mg/L 之間，符合乙類海域環境標準 3 mg/L 以下標準值。

六、pH 值

本季調查結果，各測站 pH 值之測值介於 8.0~8.1，符合乙類海域環境標準 7.5~8.5 標準值。

七、重金屬

本季調查結果，各測站重金屬(1)砷(As)之測值介於 0.0013~0.0037 mg/L 之間，符合乙類海域環境標準 0.05 mg/L；(2)銅(Cu)、硒(Se)、鋅(Zn)、鉛(Pb)、鎘(Cd)、鉻(Cr)、汞(Hg)之測值均小於方法偵測極限。

表 2.2-1 海域水質監測成果

監測項目		水溫	透明度	溶氧量	鹽度	生化需氧量	pH 值	重金屬							
監測日期		(℃)	(cm)	(mg/L)	(psu)	(mg/L)		銅 (mg/L)	硒 (mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	汞 (mg/L)	砷 (mg/L)
101/2/21	北側	14.4	80	6.4	34.0	0.9	8.2	N.D.	N.D.	0.0015	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
	西側	14.6	80	6.5	33.0	0.8	8.1	N.D.	N.D.	0.0026	0.0012	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	南側	14.5	60	6.5	34.0	0.7	8.1	N.D.	N.D.	0.0035	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
101/4/18	北側	23.4	80	6.8	34.0	0.7	8.1	0.0034	N.D.	0.0147	0.0036	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	西側	23.5	80	6.8	34.1	0.7	8.1	0.0015	N.D.	0.0089	0.0014	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
	南側	23.5	90	6.8	34.4	0.8	8.1	0.0014	N.D.	0.0060	0.0011	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009
101/7/24	北側	31.7	60	6.8	33.6	0.9	8.1	0.0027	N.D.	0.018	0.001	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	西側	31.6	60	6.8	33.2	0.9	8.2	N.D.	N.D.	0.011	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	南側	31.2	70	6.8	33.5	1.8	8.1	N.D.	N.D.	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
101/10/9	北側	25.7	80	6.7	34.0	0.9	8.2	0.0092	N.D.	0.014	0.004	N.D.	N.D.	N.D.	0.0020
	西側	25.8	70	6.6	34.2	0.9	8.2	0.0114	N.D.	0.014	0.005	N.D.	N.D.	N.D.	0.0021
	南側	25.6	80	6.6	34.4	1.5	8.2	0.0153	N.D.	0.009	0.003	N.D.	N.D.	N.D.	0.0019
102/1/16	北側	19.1	80	6.7	34.2	1.2	8.1	0.0009	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0018
	西側	19.0	70	6.7	34.2	1.3	8.0	0.0009	N.D.	0.008	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0017
	南側	19.2	70	6.7	34.3	1.1	8.0	0.0015	N.D.	0.009	0.011	N.D.	N.D.	N.D.	0.0016
102/4/2	北側	23.8	90	5.3	33.5	0.9	8.0	0.0009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0009	0.0014
	西側	23.6	70	5.3	33.7	0.7	7.9	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
	南側	23.8	80	5.3	33.6	0.7	8.0	N.D	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
102/7/29	北側	29.3	80	6.4	33.0	0.8	7.9	0.001	N.D.	0.007	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	西側	29.3	90	6.4	33.0	0.7	7.9	0.001	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0011
	南側	29.4	80	6.3	33.0	0.7	7.9	0.001	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
102/10/13	北側	27.3	70	6.5	34.1	0.9	8.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0013
	西側	27.6	80	6.4	34.0	0.8	8.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D	0.0015
	南側	27.5	80	6.3	34.1	0.8	8.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0037
101 年方法偵測極限		--	--	--	--	--	--	0.00069	0.0059	0.00091	0.00101	0.00062	0.0006	0.000638	0.000075
102 年方法偵測極限		--	--	--	--	--	--	0.00060	0.0054	0.00092	0.00096	0.00066	0.0125 註3	0.000575	0.00010
乙類海域環境標準		--	--	5.0 以上	--	3 以下	7.5~8.5	0.03	0.05	0.5	0.1	0.01	0.05	0.002	0.05

註：1.監測單位：瑩諮科技股份有限公司(行政院環保署認可証字號第 012 號)。
2.海域環境分類及海洋環境標準，行政院環境保護署，90.10.26(90)環署水字第 0081750 號。
3.QDL 定量偵測極限。

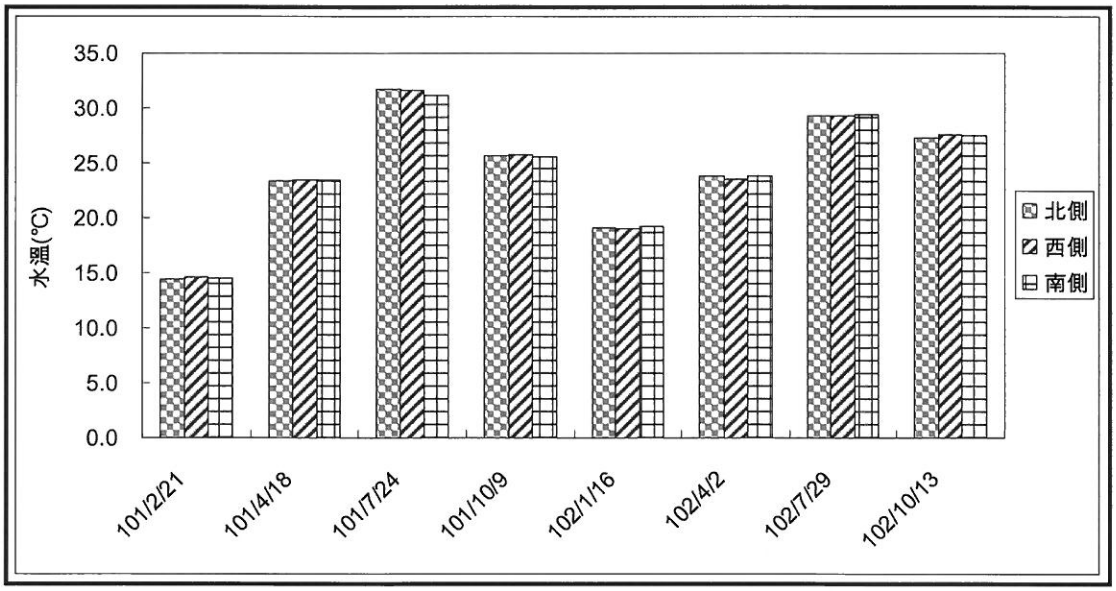

圖 2.2-1　各測站水溫監測成果彙整

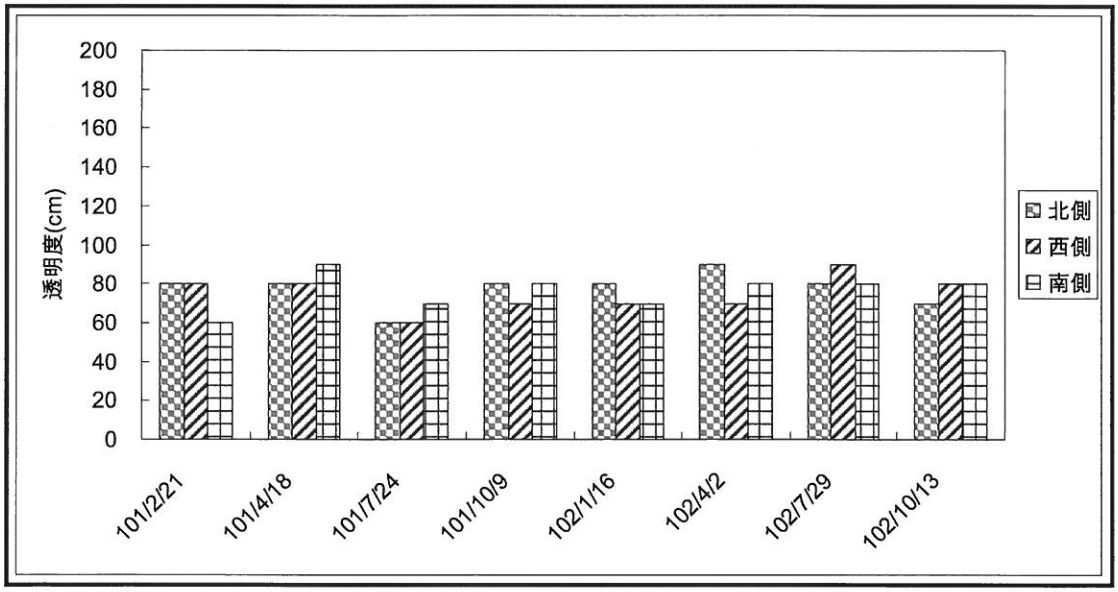

圖 2.2-2　各測站透明度監測成果彙整

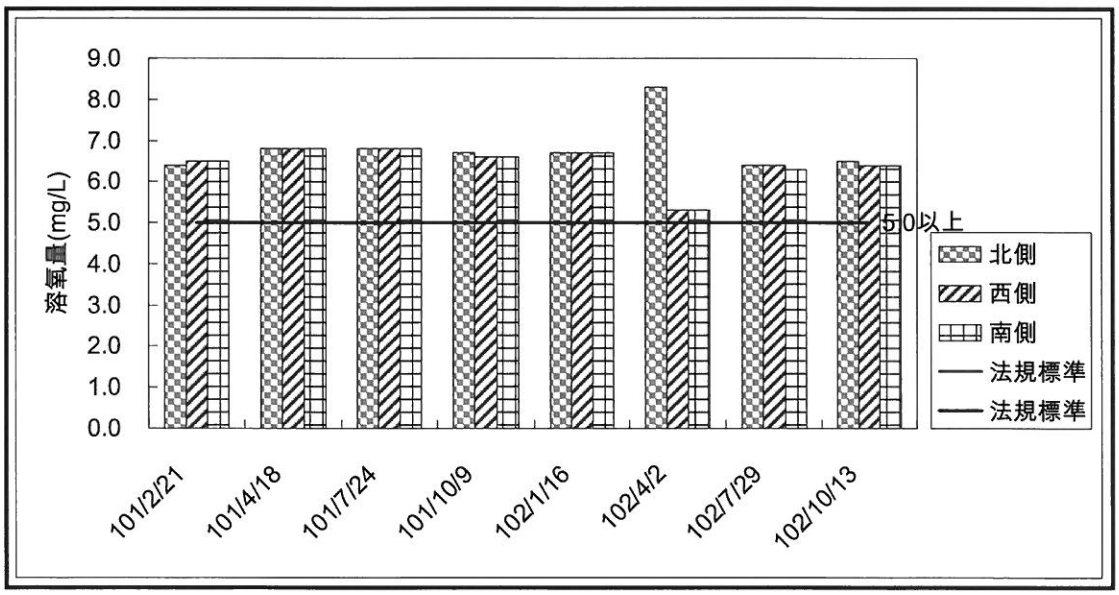

圖 2.2-3　各測站溶氧量監測成果彙整

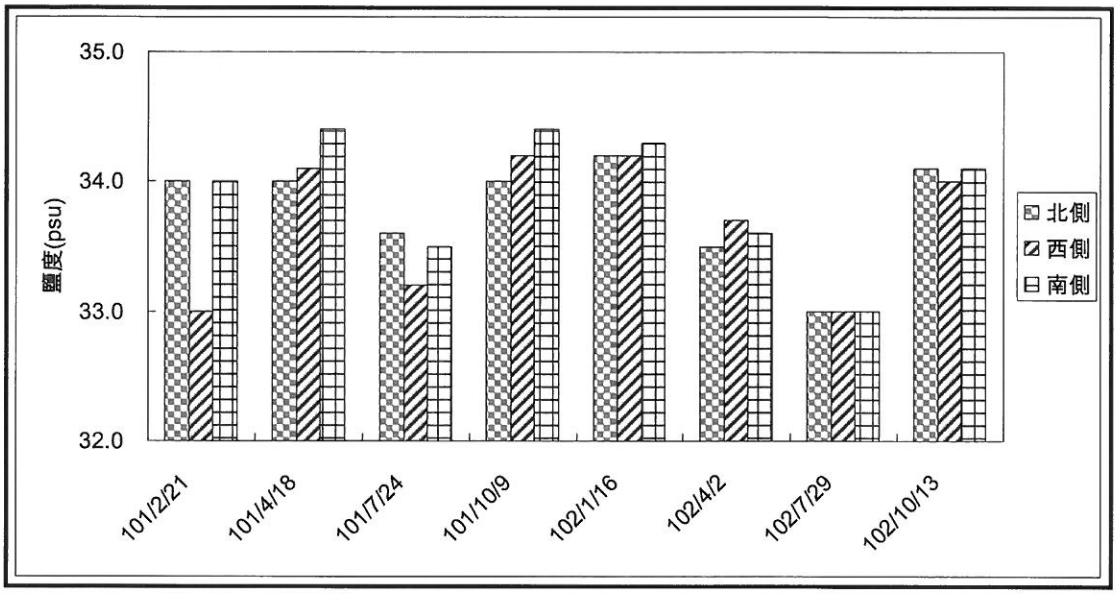

圖 2.2-4　各測站鹽度監測成果彙整

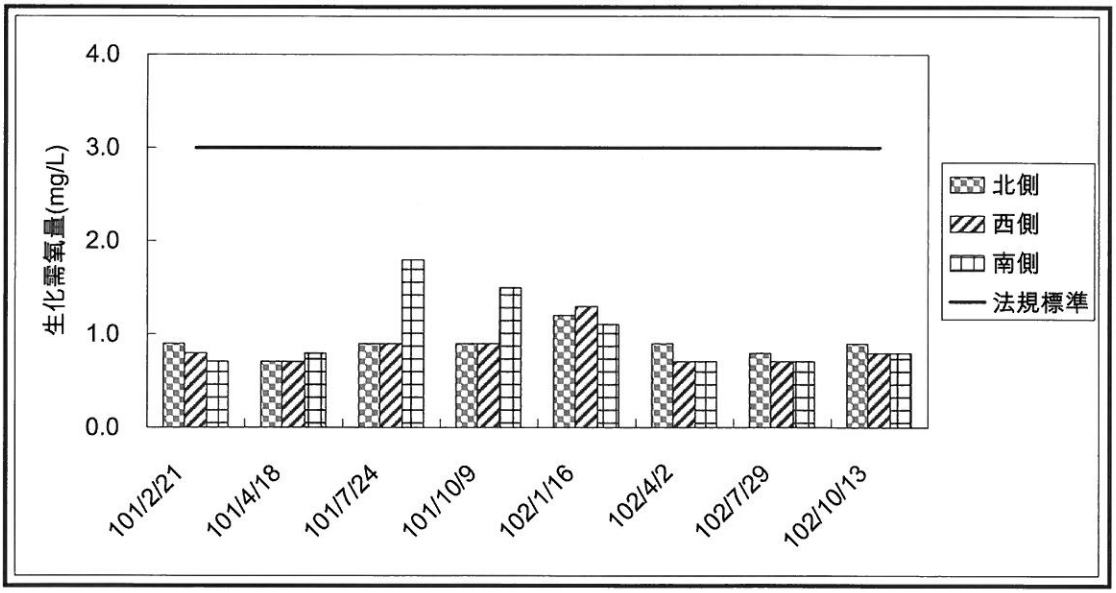

圖 2.2-5　各測站生化需氧量監測成果彙整

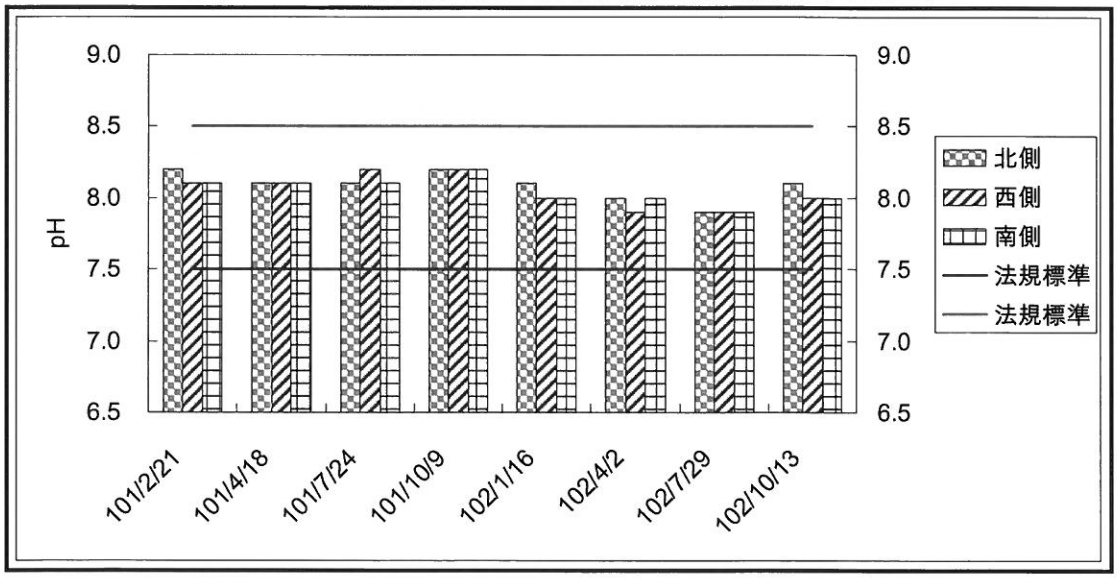

圖 2.2-6　各測站 pH 監測成果彙整

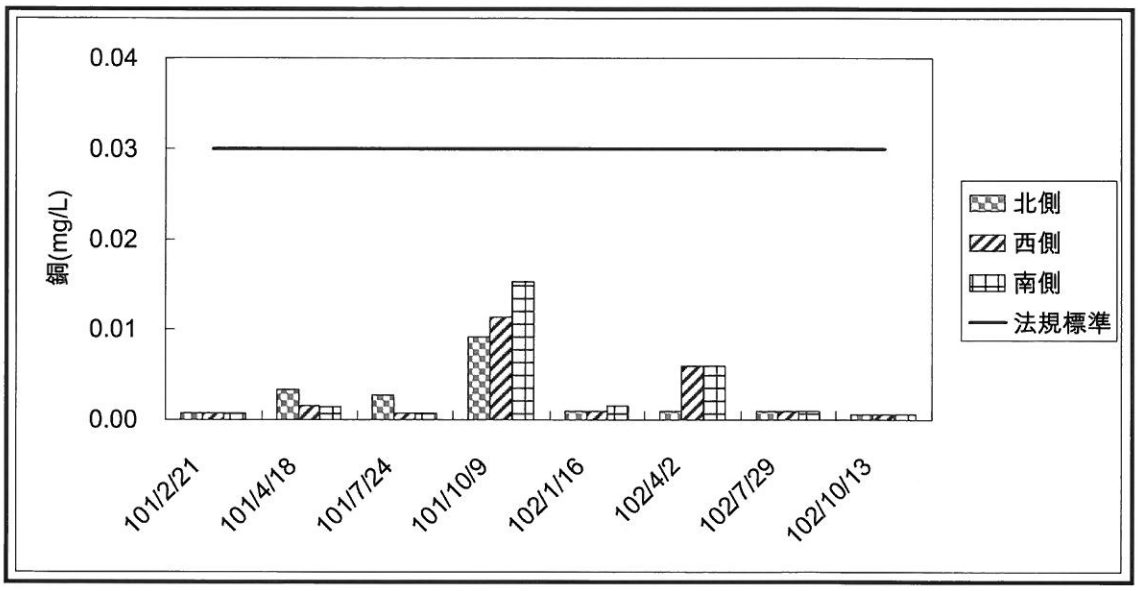

圖 2.2-7　各測站銅監測成果彙整

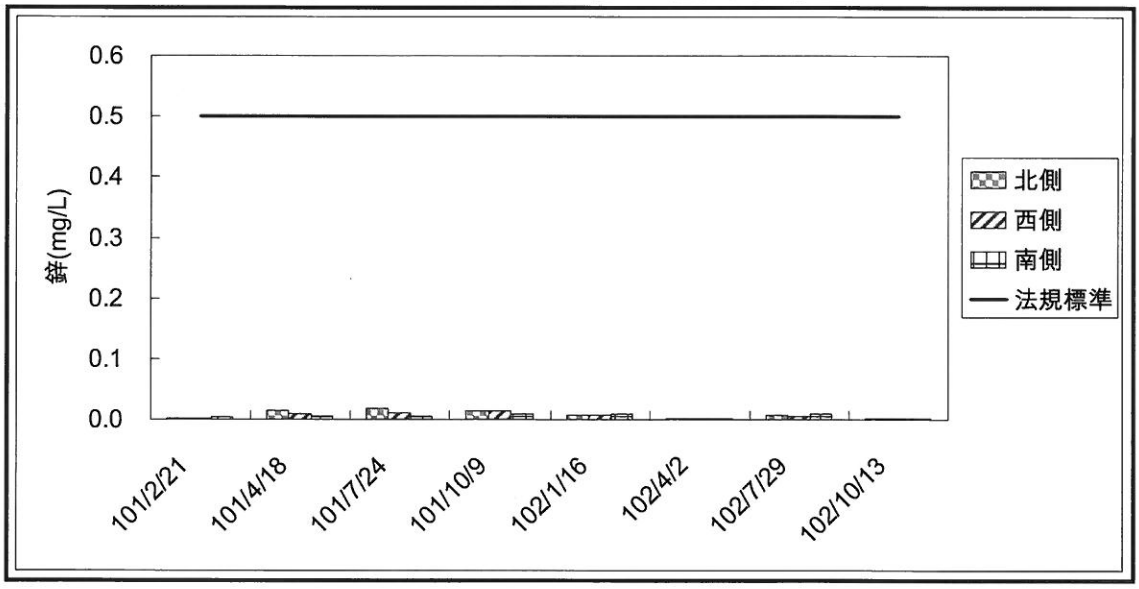

圖 2.2-8　各測站鋅監測成果彙整

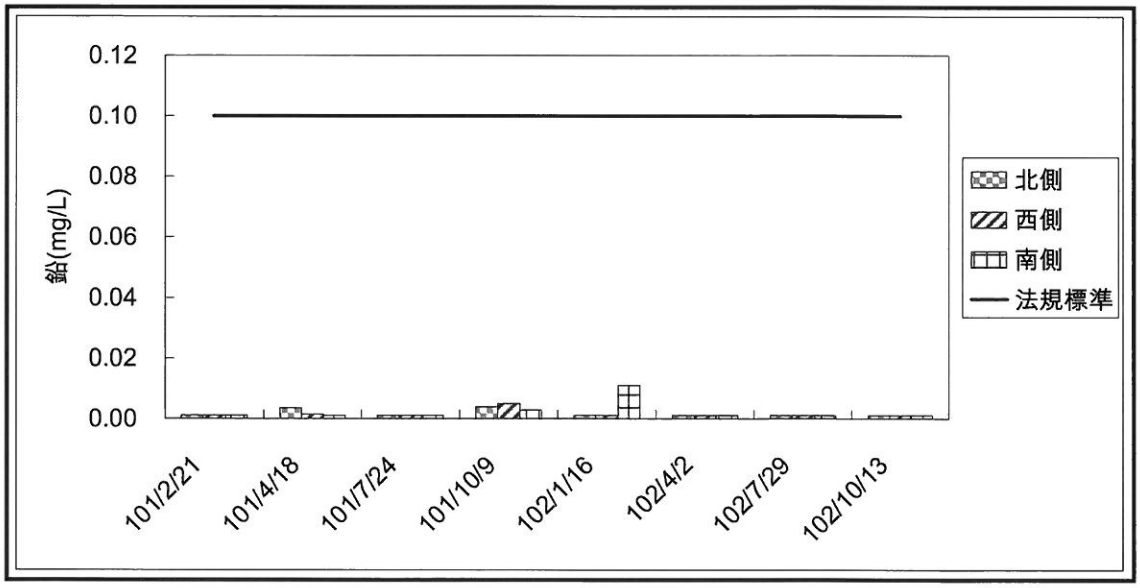

圖 2.2-9　各測站鉛監測成果彙整

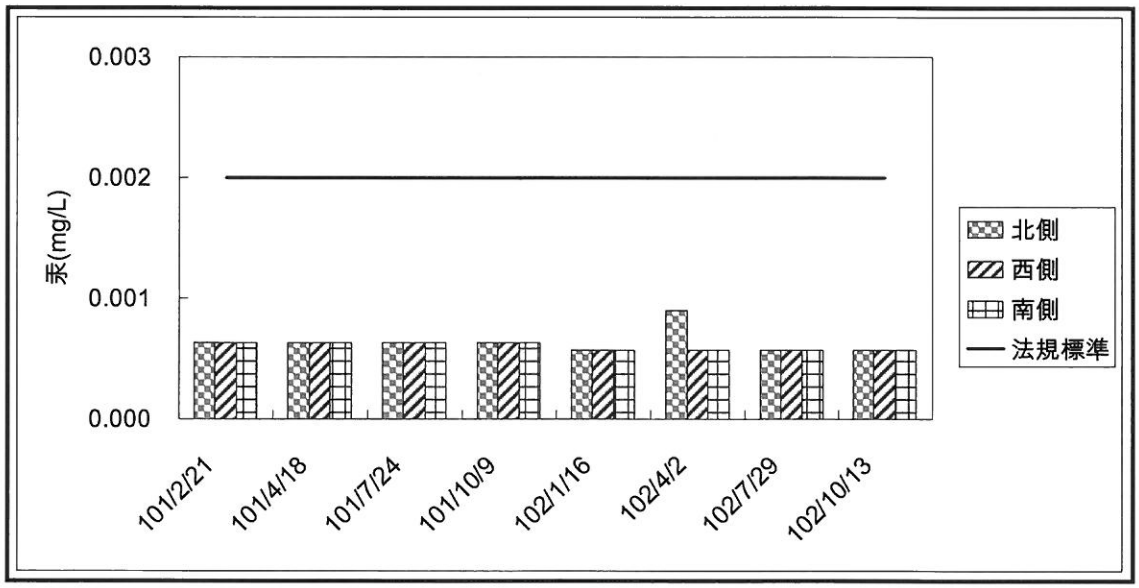

圖 2.2-10　各測站汞監測成果彙整

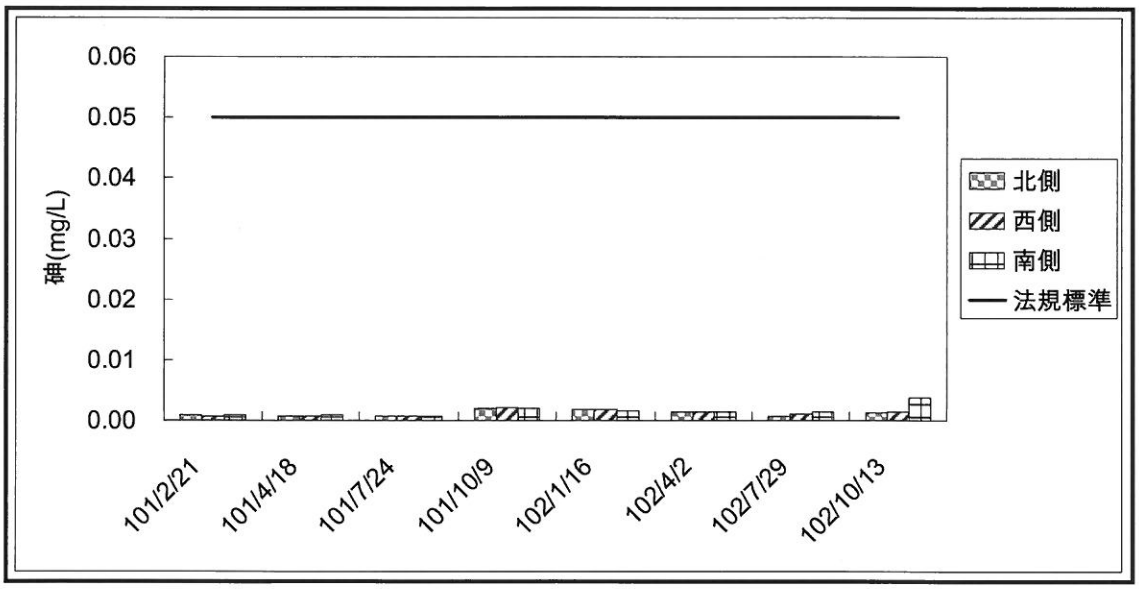

圖 2.2-11　各測站砷監測成果彙整

第三章、檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策
3.2 建議事項

第三章、檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

一、監測結果綜合檢討、分析

有關本季(102 年第 4 季)與上季(102 年第 3 季)之空氣品質及海域水質監測成果如表 3.1-1~2 所示，分述如下：

(一)空氣品質

1.氣象

(1)風向：本季監測日之盛行風向為北風，上季為西北西及西北風。

(2)風速：本季監測日之之日平均風速為 5.3 m/s，上季為 4.3 m/s，風速之差異主要係受季節變化之影響。

2.空氣品質

(1)總懸浮微粒(TSP)

本季調查結果，總懸浮微粒(TSP)之 24 小時值為 125 μg/m^3，上季為 168 μg/m^3，本季測值較上季減少 43 μg/m^3，監測結果符合空氣品質 250 μg/m^{3}之標準值。

(2)懸浮微粒(PM_{10})

本季調查結果，粒徑≦10μm 懸浮微粒(PM_{10})之 24 小時值為 62 μg/m^3，上季為 79 μg/m^3，本季測值較上季減少 17 μg/m^3，監測結果符合空氣品質 125 μg/m^{3}之標準值。

(3)二氧化氮(NO_2)

本季調查結果，二氧化氮(NO_2)之小時平均最大值為 0.005 ppm，上季為 0.006 ppm，本季測值較上季減少 0.001 ppm，監測結果符合空氣品質 0.25 ppm。

(4)二氧化硫(SO_2)

本季調查結果，二氧化硫(SO_2)之小時平均最大值為 0.003 ppm，上季為 0.004 ppm，本季測值較上季減少 0.001 ppm，另於日平均值方面，本季與上季皆為 0.002 ppm，監測結果均符合空氣品質小時平均值 0.25 ppm 及日平均值 0.1 ppm。

(5)一氧化碳(CO)

本季調查結果，一氧化碳(CO)之小時平均最大值與八小時平均最大值皆與上季相同為 0.2 ppm 及 0.1 ppm，監測結果均符合空氣品質小時平均值 35 ppm 及八小時平均值 9 ppm。

表 3.1-1 空氣品質本季與上季監測成果比較

項目	最頻風向 (deg)	平均風速 (m/s)	總懸浮微粒 (TSP) ($\mu g/m^3$) 24 小時值	粒徑≦10 μm 之懸浮微粒(PM_{10}) ($\mu g/m^3$) 24 小時值	二氧化氮 (NO_2) (ppm) 小時平均最大值	二氧化硫 (SO_2) (ppm) 日平均值	二氧化硫 (SO_2) (ppm) 小時平均最大值	一氧化碳 (CO) (ppm) 小時平均最大值	一氧化碳 (CO) (ppm) 最大 8 小時平均值
本季 (102 年第 4 季) 102/10/13~14	北風	5.3	125	62	0.005	0.002	0.003	0.2	0.1
上季 (102 年第 3 季) 102/7/29~30	西北西/西北	4.3	168	79	0.006	0.002	0.004	0.2	0.1
差異	--	+1.0	-43.0	-17.0	-0.001	0.0	-0.001	0	0
法規標準	--	--	250	125	0.25	0.1	0.25	35	9

註：1.監測單位：瑩諮科技股份有限公司(行政院環保署認可証字號第 012 號)。
2.空氣品質標準，行政院環境保護署，101.05.14 環署空字第 1010038913 號令修正發布。

(二)海域水質

1.水溫

本季調查結果，各測站水溫之測值介於 27.3~27.6 ℃之間，上季測值介於 29.3~29.4 ℃，本季較上季減少 1.7~2.0 ℃；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 29.7 ℃，與本計畫之測值差異變化不大。

2.透明度

本季調查結果，各測站透明度之測值介於 70~80 cm 之間，上季測值介於 80~90 cm，本季較上季減少測值減少 10 cm；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 210 cm，略高於本計畫之測值。

3.溶氧量(DO)

本季調查結果，各測站溶氧量(DO)之測值介於 6.3~6.5 mg/L，上季測值介於 6.3~6.4 mg/L，測值差異變化不大；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 6.7 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 5.0 mg/L 以上標準值。

4.鹽度

本季調查結果，各測站鹽度之測值介於 34.0~34.1 psu，上季測值均為 33.0 psu，測值差異變化不大；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 32.9 psu，與本計畫之測值差異變化不大。

5.生化需氧量(BOD)

本季調查結果，各測站生化需氧量(BOD)之測值介於 0.8~0.9 mg/L 之間，上季測值介於 0.7~0.8 mg/L，測值差異變化不大；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為小於 2.0 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 3 mg/L 以下標準值。

6.pH 值

本季調查結果，各測站 pH 值之測值介於 8.0~8.1，上季測值均為 7.9，測值差異變化不大；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 8.3，上述測值均符合乙類海域環境標準 7.5~8.5 標準值

7.重金屬

(1)銅(Cu)：本季調查結果，各測站銅(Cu)之測值均小於方法偵測極限(0.00060 mg/L)，上季測值均為 0.001 mg/L，測值差異變化不大；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 0.0034 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.03 mg/L。

表 3.1-2 海域水質各測站本季、上季與彰濱工業區監測成果比較

監測項目		水溫	透明度	溶氧量	鹽度	生化需氧量	pH 值	重金屬							
監測日期		(℃)	(cm)	(mg/L)	(psu)	(mg/L)		銅 (mg/L)	硒 (mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鉻 (mg/L)	汞 (mg/L)	砷 (mg/L)
本季 (102 年第 4 季) 102/10/13	北側	27.3	70	6.5	34.1	0.9	8.1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0013
	西側	27.6	80	6.4	34.0	0.8	8.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D	0.0015
	南側	27.5	80	6.3	34.1	0.8	8.0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0037
上季 (102 年第 3 季) 102/7/29	北側	29.3	80	6.4	33.0	0.8	7.9	0.001	N.D.	0.007	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0008
	西側	29.3	90	6.4	33.0	0.7	7.9	0.001	N.D.	0.006	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0011
	南側	29.4	80	6.3	33.0	0.7	7.9	0.001	N.D.	0.009	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	0.0015
差異 (本季-上季)	北側	-2.0	-10	0.1	1.1	0.1	0.2	-0.0004	0	-0.00608	0	0	0	0	+0.0005
	西側	-1.7	-10	0	1.0	0.1	0.1	-0.0004	0	-0.00508	0	0	0	0	+0.0004
	南側	-1.9	0	0	1.1	0.1	0.1	-0.0004	0	-0.00808	0	0	0	0	+0.0022
101 年方法偵測極限		–	–	–	–	–	–	0.00069	0.0059	0.00091	0.00101	0.00062	0.0006	0.000638	0.000075
102 年方法偵測極限		–	–	–	–	–	–	0.00060	0.0054	0.00092	0.00096	0.00066	0.0125 [3]	0.000575	0.00010
彰濱工業區 102 年第 3 季 (7~9 月)	最大值	31.1	450	7.7	33.7	<2.0	8.3	0.0081	<0.0002	0.0158	<0.0060	<0.0006	<0.0010	<0.0003	0.0015
	最小值	28.9	110	6.4	27.4	<2.0	8.2	<0.0030	<0.0002	<0.0020	<0.0020	<0.0003	<0.0004	<0.0001	<0.0010
	平均值	29.7	210	6.7	32.9	<2.0	8.3	0.0034	<0.0002	0.0064	0.0037	0.0004	0.0009	0.0001	0.0011
乙類海域環境標準		–	–	5.0 以上	–	3 以下	7.5~8.5	0.03	0.05	0.5	0.1	0.01	0.05	0.002	0.05

註：1.監測單位：瑩諮科技股份有限公司(行政院環保署認可証字號第 012 號)。
2.海域環境分類及海洋環境標準，行政院環境保護署，90.10.26(90)環署水字第 0081750 號。
3.QDL 定量偵測極限。

(2)硒(Se)：本季調查結果與上季調查結果相同，各測站硒(Se)之測值均小於方法偵測極限(0.0054 mg/L)，測值未產生差異；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為小於 0.0002 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.05 mg/L。

(3)鋅(Zn)：本季調查結果，各測站鋅(Zn)之測值均小於方法偵測極限(0.00092 mg/L)，上季測值介於 0.006~0.009 mg/L，測值差異變化不大，另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 0.0064 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.5 mg/L。

(4)鉛(Pb)：本季調查結果與上季調查結果相同，各測站鉛(Pb)之測值均小於方法偵測極限(0.00096 mg/L)，測值未產生差異；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 0.0037 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.1 mg/L。

(5)鎘(Cd)：本季調查結果與上季調查結果相同，各測站鎘(Cd)之測值均小於方法偵測極限(0.00066 mg/L)，測值未產生差異；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 0.0004 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.01 mg/L。

(6)鉻(Cr)：本季調查結果與上季調查結果相同，各測站鉻(Cr)之測值均小於 QDL 定量偵測極限(0.0125 mg/L)，測值未產生差異；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 0.0009 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.05 mg/L。

(7)汞(Hg)：本季調查結果，各測站汞(Hg)之測值均小於方法偵測極限(0.000575 mg/L)，上季測值介於小於方法偵側極限(0.000575 mg/L)~0.0009 mg/L，測值差異變化不大；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 0.0001 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.02 mg/L。

(8)砷(As)：本季調查結果，各測站砷(As)之測值介於 0.0013~0.0037 mg/L，上季測值介於 0.0008~0.0015 mg/L，測值差異變化不大；另參考彰濱工業區 102 年第 3 季(7~9 月)之平均測值為 0.0011 mg/L，上述測值均符合乙類海域環境標準 0.05 mg/L。

二、監測結果異常現象因應對策

本案之環境監測執行計畫，自民國 101 年 1 月開始執行，累計至 102 年 12 月，共計完成八季環境監測報告(包含施工前環境監測)，監測執行迄今，監測項目包括：空氣品質及海域水質，監測結果皆符合相關法令標準，期間並未有任何異常值之情況發生，無環境品質惡化之情況發生。

表 3.1-3　上次之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
無異常狀況發生	持續進行監測	本季空氣品質及海域水質監測結果，各監測項目之測值差異變化不大，均符合空氣品質及乙類海域水質標準。

表 3.1-4　本次監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策與效果
無異常狀況發生	持續進行監測

3.2 建議事項

一、運輸卡車裝載易飛散物，均以黑網或帆布覆蓋，防止飛散。

二、預鑄場裸露地面每日定時灑水抑制揚塵。

三、施工機具維修廢(油)水，均責成承包廠商集中抽換，並設置回收桶收集後，不定期委託合格代處理業處理，嚴禁任意排放。

四、設置移動式廁所，定期由合法業者抽取及清理，減少水污染，達到水質保護目標。

附錄一、檢測執行單位之認證資料

監測類別	執行單位	環保署認證資料	環保署認可之檢測項目	
空氣檢測類	營諮科技股份有限公司	環署檢字第 012A 號	1.排放管道中排氣流速檢測：(NIEA A101) 2.排放管道中粒狀污染物：(NIEA A101) 3.空氣中粒狀污染物：(NIEA A102) 4.空氣中粒狀污染物(自動測定)：(NIEA A206) 5.空氣中鉛及其化合物：(NIEA A301) 6.排放管道中氨氮：(NIEA A408) 7.排放管道中總氟量：(NIEA A409) 8.排放管道中氮氧化物(自動測定)：(NIEA A411) 9.排放管道中氯化氫：(NIEA A412) 10.排放管道中二氧化硫(自動測定)：(NIEA A413) 11.排放管道中二氧化碳(自動測定)：(NIEA A415) 12.空氣中二氧化硫(自動測定)：(NIEA A416) 13.空氣中氮氧化物(自動測定)：(NIEA A417) 14.空氣中臭氣(自動測定)：(NIEA A420) 15.空氣中一氧化碳(自動測定)：(NIEA A421) 16.空氣中氯氣：(NIEA A425)	17.空氣中溴氣(NIEA A425) 18.空氣中氨氣(NIEA A426) 19.排放管道中氧氣(自動測定)：(NIEA A432) 20.空氣中氟化氫(氫氟酸)：(NIEA A435) 21.空氣中硫酸：(NIEA A435) 22.空氣中氯化氫(鹽酸)：(NIEA A435) 23.空氣中硝酸：(NIEA A435) 24.空氣中溴化氫(氫溴酸)：(NIEA A435) 25.空氣中磷酸 NIEA A435) 26.排放管道中氫氟酸：(NIEA A452) 27.排放管道中硫酸：(NIEA A452) 28.排放管道中硝酸：(NIEA A452) 29.排放管道中磷酸：(NIEA A452) 30.排放管道中鹽酸：(NIEA A452) 31.排放管道中一氧化碳(自動測定)：(NIEA A704) 32.排放管道中非甲烷總碳氫化合物(自動測定)：(NIEA A723) 33.排放管道中總碳氫化合物(自動測定)：(MEA A723)

監測類別	執行單位	環保署認證資料	環保署認可之檢測項目	
水質水量檢測類	營諮科技股份有限公司	環署檢字第 012A 號	1.大腸稈菌群：(NIEA E202) 2.水量：(NIEA W022) 3.事業放流水採樣(不含自動混樣採水設備)：(NIEA Wl09) 4.導電度：(NIEA W203) 5.總溶解固體物:(NIEA W210) 6.懸浮固體：(NIEA W210) 7.水溫：(NIEA W217) 8.真色色度：(NIEA W223) 9.溶解性鐵；(NIEA W305) 10.鉛：(NIEA W306) 11.銀：(NIEA W306) 12.銅：(NIEA W306) 13.鋅：(NIEA W306) 14.錳：(NIEA W306) 15.總鉻：(NIEA W306) 16.鎳：(NIEA W306) 17.鎘：(NIEA W306) 18.鐵：(NIEA W306) 19.硒：(NIEA W311) 20.鉛：(NIEA W311) 21.鉬：(NIEA W311) 22.銀：(NIEA W311) 23.銅：(NIEA W311) 24.銦：(NIEA W311) 25.鋅：(NIEA W311) 26.鋁：(NIEA W311) 27.錳：(NIEA W311) 28.總鉻：(NIEA W311) 29.鎳：(NIEA W311) 30.鎘：(NIEA W311) 31.鎵：(NIEA W311) 32.鐵：(NIEA W311) 33.海水中鉛：(NIEA W308)/(NIEA W311) 34.海水中銅：(NIEA W308)/(NIEA W311) 35.海水中鋅：(NIEA W308)/(NIEA W311) 36.海水中錳：(NIEA W308)/(NIEA W311)	37.海水中鎘：(NIEA W308)/(NIEA W311) 38.六價鉻：(NIEA W320) 39.六價鉻：(NIEA W321) 40.汞：(NIEA W330) 41.硼：(NIEA W404) 42.氯鹽：(NIEA W406) 43.總餘氯：(NIEA W408) 44.氟鹽：(NIEA W413) 45.正磷酸鹽：(NIEA W415) 46.亞硝酸鹽氫(NIEA W415) 47.硫酸鹽：(NIEA W415) 48.氯鹽：(NIEA W415) 49.硝酸鹽氮：(NIEA W415) 50.亞硝酸鹽氣：(NIEA W418) 51.溶氧量：(NIEA W422) 52.總氮：(NIEA W423) 53.氫離子濃度指數(pH 值)：(NIEA W424) 54.正磷酸鹽：(NIEA W427) 55.總磷：(NIEA W427) 56.硫化物：(NIEA W433) 57.砷：(NIEA W434) 58.亞硝酸鹽氣：(NIEA W436) 59.硝酸鹽氮：(NIEA W436) 60.氨氮：(NIEA W437) 61.氰化物：(NIEA W441) 62.氨氮：(NIEA W448) 63.凱氏氮：(NIEA W451) 64.溶氣量：(NIEA W455) 65.油脂：(NIEA W505) 66.生化需氣量：(NIEA W510) 67.海水中化學需氧量：(NIEA W514) 68.化學需氧量：(NIEA W515) 69.含高鹵離子化學需氣量:(NIEA W516) 70.酚類：(NIEA W521) 71.陰離子界面活性劑：(NIEA W525) 72.總有機碳：(NIEA W530) 73.二甲苯：(NIEA W785)

監測類別	執行單位	環保署認證資料	環保署認可之檢測項目	
水質水量檢測類	營諮科技股份有限公司	環署檢字第 012A 號	74.1,1,1,2-四氯乙烷：(NIEA W785) 75.1,1,1-三氯乙烷：(NIEA W785) 76.1,1,2,2-四氯乙烷：(NIEA W785) 77.1,1,2-三氯乙烷：(NIEA W785) 78.1,1 二氯乙烯：(NIEA W785) 79.1,1-二氯乙烷：(NIEA W785) 80.1,1-二氯丙烷：(NIEA W785) 81.1,2,3-三氯丙烷：(NIEA W785) 82.1,2,3-三氯苯：(NIEA W785) 83.1,2,4-三甲基苯：(NIEA W785) 84.1,2,4-三氯苯：(NIEA W785) 85.1,2-二氯乙烷：(NIEA W785) 86.1,2-二氯丙烷：(NIEA W785) 87.1,2-二氯苯：(NIEA W785) 88.1,2-二溴-3-氯丙烷：(NIEA W785) 89.1,3,5-三甲基苯：(NIEA W785) 90.1,3-二氯苯：(NIEA W785) 91.2-氯甲苯：(NIEA W785) 92.4-氯甲苯：(NIEA W785) 93.乙苯：(NIEA W785) 94.二氯甲烷：(NIEA W785) 95.二溴甲烷：(NIEA W785) 96.三氯乙烯：(NIEA W785) 97.六氯丁二烯：(NIEA W785) 98.反-1,2-二氯乙烯：(NIEA W785) 99.反-1,3-二氯丙烯：(NIEA W785) 100.四氯乙烯：(NIEA W785) 101.四氯化碳：(NIEA W785) 102.甲苯：(NIEA W785) 103.苯：(NIEA W785) 104.苯乙烯：(NIEA W785) 105.氯乙烯：(NIEA W785) 106.氯乙烷：(NIEA W785) 107.氯甲烷：(NIEA W785) 108.氯苯：(NIEA W785) 109.順-1,2-二氯乙烯：(NIEA W785)	110.順-1,3-二氯丙烯：(NIEA W785) 111.溴苯：(NIEA W785) 112.溴氯甲烷：(NIEA W785) 113.對-二氯苯：(NIEA W785) 114.總三鹵甲烷-一溴二氯甲烷：(NIEA W785) 115.總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：(NIEA W785) 116.總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿)：(NIEA W785) 117.總三鹵甲烷-三氯甲烷(溴仿)：(NIEA W785) 118.萘：(NIEA W785)

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第012A號

瑩諮科技股份有限公司經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格特發此證。

本證有效期限自101年12月07日至
106年12月06日止

許可證內容詳見副頁

署長 沈世宏

中華民國102年1月9日

94.03.5000

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

檢驗室名稱：瑩諮科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：臺北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：鐘美紅

許可類別：空氣檢測類

許可項目及方法：

1、排放管道中排氣流速檢測：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（NIEA A101）
2、排放管道中粒狀污染物：排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法（NIEA A101）
3、空氣中粒狀污染物：空氣中粒狀污染物檢測法－高量採樣法（NIEA A102）
4、空氣中粒狀污染物（自動測定）：空氣中粒狀污染物自動檢測方法－貝他射線衰減法（NIEA A206）
5、空氣中鉛及其化合物：空氣中粒狀污染物之鉛、鎘含量檢驗法－火焰式、石墨式原子吸收光譜法（NIEA A301）
6、排放管道中氨氣：排放管道中氨氣之檢測方法－靛酚法（NIEA A408）
7、排放管道中總氟量：排放管道中氟化物檢測方法－鑭茜錯合劑比色法（NIEA A409）
8、排放管道中氮氧化物（自動測定）：排放管道中氮氧化物自動檢測方法－儀器分析法（NIEA A411）
9、排放管道中氯化氫：排放管道中氯化氫檢測方法－硫氰化汞比色法（NIEA A412）
10、排放管道中二氧化硫（自動測定）：排放管道中二氧化硫抽取式自動檢測方法－非分散性紅外光法、紫外光法、螢光法（非分散性紅外光法）（NIEA A413）
11、排放管道中二氧化碳（自動測定）：排放管道中二氧化碳自動檢測法－NDIR法（NIEA A415）
12、空氣中二氧化硫（自動測定）：空氣中二氧化硫自動檢驗方法－紫外光螢光法（NIEA A416）
13、空氣中氮氧化物（自動測定）：空氣中氮氧化物自動檢驗方法－化學發光法（NIEA A417）
14、空氣中臭氧（自動測定）：空氣中臭氧自動檢驗方法－紫外光吸收法（NIEA A420）

（續接空氣檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：空氣檢測類

許可項目及方法：

15、空氣中一氧化碳（自動測定）：空氣中一氧化碳自動檢測方法－紅外線法（NIEA A421）
16、空氣中氯氣：空氣中氯氣及溴氣之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A425）
17、空氣中溴氣：空氣中氯氣及溴氣之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A425）
18、空氣中氨氣：空氣中氨氣檢測方法－靛酚/分光光度法（NIEA A426）
19、排放管道中氧氣（自動測定）：排放管道中氧自動檢測方法-儀器分析法（NIEA A432）
20、空氣中氟化氫（氫氟酸）：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
21、空氣中硫酸：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
22、空氣中氯化氫（鹽酸）：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
23、空氣中硝酸：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
24、空氣中溴化氫（氫溴酸）：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
25、空氣中磷酸：空氣中無機酸類之檢測方法－離子層析電導度法（NIEA A435）
26、排放管道中氫氟酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
27、排放管道中硫酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
28、排放管道中硝酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
29、排放管道中磷酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
30、排放管道中鹽酸：排放管道氫氟酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法－等速吸引法（NIEA A452）
31、排放管道中一氧化碳（自動測定）：排放管道中一氧化碳自動檢驗法-非分散性紅外線法（NIEA A704）
32、排放管道中非甲烷總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法-線上火焰離子化偵測法（NIEA A723）

（續接空氣檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：空氣檢測類

許可項目及方法：

33、排放管道中總碳氫化合物（自動測定）：排放管道中總碳氫化合物及非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法-線上火焰離子化偵測法（NIEA A723）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署101年11月30日環署檢字第1010109727號、102年5月1日環署檢字第1020035453號、102年6月25日環署檢字第1020052943號及102年6月26日環署檢字第1020054172號函辦理。

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

檢驗室名稱：瑩諮科技股份有限公司檢驗室

檢驗室地址：臺北市瑞光路2號5樓

檢驗室主管：鐘美紅

許可類別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

1、大腸桿菌群：水中大腸桿菌群檢測方法－濾膜法（NIEA E202）
2、水量：水量測定方法-流速計法（NIEA W022）
3、事業放流水採樣（不含自動混樣採水設備）：事業放流水採樣方法（NIEA W109）
4、導電度：水中導電度測定方法-導電度計法（NIEA W203）
5、總溶解固體物：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
6、懸浮固體：水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法－103℃～105℃乾燥（NIEA W210）
7、水溫：水溫檢測方法（NIEA W217）
8、真色色度：水中真色色度檢測方法-分光光度計法（NIEA W223）
9、溶解性鐵：水中溶解性鐵、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W305）
10、鉛：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
11、銀：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
12、銅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
13、鋅：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
14、錳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
15、總鉻：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
16、鎳：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）

（續接水質水量檢測類副頁第2頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

17、鎘：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
18、鐵：水中銀、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測方法-火焰式原子吸收光譜法（NIEA W306）
19、硒：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
20、鉛：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
21、鉬：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
22、銀：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
23、銅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
24、銦：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
25、鋅：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
26、鋁：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
27、錳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
28、總鉻：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
29、鎳：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
30、鎘：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
31、鎵：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
32、鐵：水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
33、海水中鉛：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
34、海水中銅：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
35、海水中鋅：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
36、海水中錳：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）

（續接水質水量檢測類副頁第3頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

37、海水中鎘：海水中鎘、鈷、銅、鐵、錳、鎳、鉛及鋅檢測前處理方法-鉗合離子交換樹脂濃縮法（NIEA W308）／水中金屬及微量元素檢測方法－感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA W311）
38、六價鉻：水中六價鉻檢測方法－比色法（NIEA W320）
39、六價鉻：水中六價鉻檢測方法-APDC螯合MIBK萃取原子吸收光譜法（NIEA W321）
40、汞：水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA W330）
41、硼：水中硼檢測方法-薑黃素比色法（NIEA W404）
42、氯鹽：水中氯鹽檢測方法-硝酸汞滴定法（NIEA W406）
43、總餘氯：水中餘氯檢測方法-分光光度計法（NIEA W408）
44、氟鹽：水中氟鹽檢測方法-氟選擇性電極法（NIEA W413）
45、正磷酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
46、亞硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
47、硫酸鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
48、氯鹽：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
49、硝酸鹽氮：水中陰離子檢測方法-離子層析法（NIEA W415）
50、亞硝酸鹽氮：水中亞硝酸鹽氮檢測方法-分光光度計法（NIEA W418）
51、溶氧量：水中溶氧檢測方法—碘定量法（NIEA W422）
52、總氮：水中總氮檢測方法（NIEA W423）
53、氫離子濃度指數（pH值）：水中氫離子濃度指數測定方法-電極法（NIEA W424）
54、正磷酸鹽：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
55、總磷：水中磷檢測方法-分光光度計/維生素丙法（NIEA W427）
56、硫化物：水中硫化物檢測方法-甲烯藍/分光光度計法（NIEA W433）
57、砷：水中砷檢測方法-自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W434）
58、亞硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
59、硝酸鹽氮：水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮檢驗方法－鎘還原流動分析法（NIEA W436）
60、氨氮：水中氨氮之流動分析法－靛酚法（NIEA W437）
61、氰化物：水中總氰與弱酸可分解氰之流動注入分析法-比色法（NIEA W441）
62、氨氮：水中氨氮檢測方法-靛酚比色法（NIEA W448）
63、凱氏氮：水中凱氏氮檢測方法（NIEA W451）

（續接水質水量檢測類副頁第4頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

64、溶氧量：水中溶氧檢測方法－電極法（NIEA W455）
65、油脂：水中油脂檢測方法-索氏萃取重量法（NIEA W505）
66、生化需氧量：水中生化需氧量檢測方法（NIEA W510）
67、海水中化學需氧量：海水中化學需氧量檢測方法－重鉻酸鉀迴流法（NIEA W514）
68、化學需氧量：水中化學需氧量檢測方法-重鉻酸鉀迴流法（NIEA W515）
69、含高鹵離子化學需氧量：含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法—重鉻酸鉀迴流法（NIEA W516）
70、酚類：水中總酚檢測方法-分光光度計法（NIEA W521）
71、陰離子界面活性劑：水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法（NIEA W525）
72、總有機碳：水中總有機碳檢測方法-燃燒/紅外線測定法（NIEA W530）
73、二甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
74、1,1,1,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
75、1,1,1-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
76、1,1,2,2-四氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
77、1,1,2-三氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
78、1,1-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
79、1,1-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
80、1,1-二氯丙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
81、1,2,3-三氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）
82、1,2,3-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第5頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

83、1,2,4-三甲基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

84、1,2,4-三氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

85、1,2-二氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

86、1,2-二氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

87、1,2-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

88、1,2-二溴-3-氯丙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

89、1,3,5-三甲基苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

90、1,3-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

91、2-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

92、4-氯甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

93、乙苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

94、二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

95、二溴甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

96、三氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

97、六氯丁二烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第6頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

98、反-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

99、反-1,3-二氯丙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

100、四氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

101、四氯化碳：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

102、甲苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

103、苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

104、苯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

105、氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

106、氯乙烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

107、氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

108、氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

109、順-1,2-二氯乙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

110、順-1,3-二氯丙烯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

111、溴苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

112、溴氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（續接水質水量檢測類副頁第7頁，其他註記事項詳見末頁）

行政院環境保護署
環境檢驗測定機構許可證　副頁

環署環檢字第012A號

許 可 類 別：水質水量檢測類

許可項目及方法：

113、對-二氯苯：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

114、總三鹵甲烷--一溴二氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

115、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

116、總三鹵甲烷-三氯甲烷（氯仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

117、總三鹵甲烷-三溴甲烷（溴仿）：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

118、萘：水中揮發性有機化合物檢測方法－吹氣捕捉／氣相層析質譜儀法（NIEA W785）

（以下空白）

其他註記事項：

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。

2、許可事項依據本署101年11月30日環署檢字第1010109727號、102年3月5日環署檢字第1020018116號、102年5月1日環署檢字第1020035453號、102年6月25日環署檢字第1020052943號及102年8月22日環署檢字第1020072495號函辦理。

附錄二、採樣與分析方法

一、採樣方法

採樣作業準則

採樣項目	作業準則
空氣品質	▶監測站宜尋找空曠地點，附近儘可能遠離建築物及樹林。 ▶遠離交通要道，以避免受交通工具排放污染物之影響。 ▶須有便利之電源供應及容量應符合需要。 ▶測站附近不應有大型工作機具。
海域水質	▶每次採樣前由實驗室計畫負責人先行收集相關天候、漲退潮資訊。 ▶採集水質混合。以採集穩定混合均勻且具代表性水樣為主。

空氣品質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
現場記錄	▶了解採樣當天現場一些可能造成之干擾。	▶必須將氣象資料，周界環境因子詳加記載。
穩定/校正	▶確保分析所得之數據具有代表性。	▶使用儀器前必須先經流量校正
採樣	▶採樣時必須先行開機運轉，避免本身機件之誤差。	▶使用測定前預先開機運轉至流量穩定，才開始測定 24 小時之值。
運送空白	▶為確保分析結果之正確性，每次均有一組運送空白樣品。	▶以運送空白，瞭解運送過程之完整性。
儲存/運送	▶避免樣品因儲存時間過久或是運送不當，造成品質變化。	▶依照環保署所公告規定項目保存方式加以運送保存，並注意密封時之完整性。

海域水質採樣至運輸過程中注意事項

採樣程序	目的	注意事項
清洗採樣設備	▶洗淨採水器以便採取足夠代表該水層之水樣。	▶須用試劑水清洗採樣器。
採樣	▶自水體採取水樣時，應確保水樣化學性質受干擾的程度至最低。	▶在採取對氣體敏感性較高之項目時，如：溶氧等，宜避免有氣泡殘存。
現場測定	▶為確保取出樣品為具代表性一些指標於取樣後應盡速分析。	▶pH 值、導電度及溫度應於現場立即進行分析。
樣品保存與運輸	▶樣品分析前應依樣品保存方式，予以保存，俾使化學性質變化減至最小。	▶須遵照環檢所公告之樣品保存方法與時間，在限定時間內將樣品送達實驗室進行分析。

二、分析方法

空氣品質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	儀器偵測極限	重複分析	添加回收率(%)
風向	—	—	0~360 度	—	—
風速	—	—	0.5~20 m/s	—	—
總懸浮微粒(TSP)	NIEA A102.12A	—	1.0 $\mu g/m^3$	—	—
粒徑≦10μm之懸浮微粒(PM_{10})	NIEA A206.10C	—	10 $\mu g/m^3$	—	—
二氧化氮(NO_2)	NIEA A417.11C	—	1.0 ppb	—	—
二氧化硫(SO_2)	NIEA A416.12C	—	1.0 ppb	—	—
一氧化碳(CO)	NIEA A421.12C	—	0.1 ppm	—	—

海域水質檢測方法儀器偵測極限表

分析項目	檢測方法	方法偵測極限	重複分析(%)	添加回收率(%)	查核回收率(%)
水溫	NIEA W217.51A	—	±0.5℃	—	—
透明度	NIEA E220.50C	—	—	—	—
溶氧(DO)	NIEA W455.52C	—	0~6.1	—	—
鹽度	NIEA W447.20C	—	±1.0	—	—
生化需氧量(BOD)	NIEA W510.55B	—	0~10.0	—	85~114
pH	NIEA W424.52A	—	±0.1	—	—
銅(Cu)	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	0.00060 mg/L	0~11.5	80~115	84~112
鋅(Zn)		0.00092 mg/L	0~8.5	85~115	82~114
鉛(Pb)		0.00096 mg/L	0~7.3	85~116	82~115
鎘(Cd)		0.00066 mg/L	0~6.1	83~115	83~115
硒(Se)	NIEA W311.52C	0.0054 mg/L	0~8.8	86~120	88~112
鉻(Cr)	NIEA W311.52C	0.0125 mg/L	0~8.8	84~118	83~112
汞(Hg)	NIEA W330.52A	0.000575 mg/L	0~7.1	84~115	82~115
砷(As)	NIEA W434.53B	0.00010 mg/L	0~8.1	85~115	81~116

附錄三、品保/品管查核記錄與原始數據

瑩諮科技股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第012A號

地 址：台北市內湖區瑞光路2號5樓　電 話：（02）2794-8833

空氣品質監測報告（行程編號：ELAB131004AE4）

計畫名稱：彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

委託單位：創迅科技股份有限公司　　報告編號：EL02AB0558

樣 品 別：空氣　　採樣日期：102年10月13~14日

採樣單位：瑩諮科技股份有限公司　　收樣日期：102年10月15日

採樣地點：如報告　　報告日期：102年11月14日

聯 絡 人：賴 海 源

聲明書

(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：瑩諮科技股份有限公司

負 責 人（簽名或蓋章）：楊炯沛

檢驗室主管	空氣採樣類	無機檢測類	有機檢測類
（簽名）	報告簽署人（簽名）	報告簽署人（簽名）	報告簽署人（簽名）
	（ELA- 01 ）	（ELI-　　）	（ELO-　　）

備註：

1、本報告共 2 頁，不得作為法律訴訟用，報告內容不得隨意複製或作為商業廣告之用。

2、此報告格式依廠商要求出具。

空氣品質逐時監測成果

計畫名稱：彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測	報告編號：EL02AB0558
委託單位：創迅科技股份有限公司	監測日期：102.10.13~102.10.14
執行單位：瑩諮科技股份有限公司	監測人員：陳銘洲、張宇傑
監測位置：基地	天氣狀況：晴

時間 \ 項目	風向 deg	風速 m/s	PM_{10} μg/m^3	NO_2 ppm	SO_2 ppm	CO ppm	TSP μg/m3
11 :00～ 12 :00	北北西	6.3	90	0.0018	0.0015	0.2	
12 :00～ 13 :00	西北	6.6	81	0.0021	0.0016	0.2	
13 :00～ 14 :00	北北西	6.6	78	0.0040	0.0018	0.2	
14 :00～ 15 :00	北北西	6.2	76	0.0034	0.0018	0.2	
15 :00～ 16 :00	北	6.6	81	0.0032	0.0023	0.1	
16 :00～ 17 :00	北	5.9	73	0.0027	0.0025	0.2	
17 :00～ 18 :00	北	6.4	62	0.0037	0.0026	0.2	
18 :00～ 19 :00	北	5.9	63	0.0044	0.0027	0.1	
19 :00～ 20 :00	北	5.7	59	0.0053	0.0013	0.1	
20 :00～ 21 :00	北	6.1	55	0.0040	0.0031	0.2	
21 :00～ 22 :00	北	5.2	50	0.0027	0.0028	0.1	
22 :00～ 23 :00	北	3.9	45	0.0028	0.0025	0.1	
23 :00～ 24 :00	北	3.2	41	0.0032	0.0011	0.1	
00 :00～ 01 :00	西北	5.4	43	0.0032	0.0012	0.1	125
01 :00～ 02 :00	北北西	6.4	41	0.0030	0.0013	0.1	
02 :00～ 03 :00	西南西	5.3	46	0.0034	0.0015	0.1	
03 :00～ 04 :00	東南東	3.2	50	0.0040	0.0018	0.1	
04 :00～ 05 :00	北	4.7	58	0.0036	0.0020	0.1	
05 :00～ 06 :00	北	4.4	52	0.0041	0.0019	0.1	
06 :00～ 07 :00	北	4.3	65	0.0044	0.0024	0.1	
07 :00～ 08 :00	北	4.1	58	0.0045	0.0023	0.2	
08 :00～ 09 :00	北	5.2	68	0.0052	0.0019	0.2	
09 :00～ 10 :00	北北西	6.1	81	0.0030	0.0014	0.1	
10 :00～ 11 :00	北北西	4.6	82	0.0021	0.0021	0.2	
最大小時平均值	*	**6.6**	**90**	**0.0053**	**0.0031**	**0.2**	
最大8小時平均值	*	*	*	*	*	**0.2**	
日平均值	*	**5.3**	**62**	**0.0035**	**0.0020**	**0.1**	
空氣品質標準值 小時平均值	*	*	*	**0.25**	**0.25**	**35**	**250μg/m^3 24小時標準值**
空氣品質標準值 日平均值	*	*	**125**	*	**0.1**	*	
空氣品質標準值 8小時平均值	*	*	*	*	*	**9**	

檢驗室主任：鐘美紅	品保品管：何致民	記錄：陳銘洲

檢驗報告專用章
瑩諮科技(股)公司
負 責 人:楊炯浩
檢驗室主任:鐘美紅

周界儀器自動監測資料轉交表

監測日期	102.10.13~102.10.14	監測人員	黃銘河、張宇傑
計畫名稱	彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測		

委樣編號	測定點位置名稱	測定點監測日期
EL02AB0558	基地	102.10.13 ~ 102.10.14

監測項目	資料內容	監測項目	資料內容
☑NO_x	☑儀器原始數據 ☐儀器多點校正記錄 ☑儀器零點/高幅校正記錄 ☐其他 _____	☑SO_2	☑儀器原始數據 ☐儀器多點校正記錄 ☑儀器零點/高幅校正記錄 ☐其他 _____
☑CO	☑儀器原始數據 ☐儀器多點校正記錄 ☑儀器零點/高幅校正記錄 ☐其他 _____	☑HC	☑儀器原始數據 ☐儀器多點校正記錄 ☑儀器零點/高幅校正記錄 ☐其他 _____
☑O_3	☑儀器原始數據 ☐儀器多點校正記錄 ☑儀器零點/高幅校正記錄 ☐其他 _____	☑PM_{10}	☑儀器原始數據 ☑儀器校正記錄 ☐其他 _____ ☐其他 _____
☑TSP ☐Pb	☑HV採樣記錄表 ☑HV校正記錄 ☐其他 _____ ☐其他 _____	☐噪音	☐儀器原始數據 ☐儀器校正記錄 ☐其他 _____ ☐其他 _____
☐$PM_{2.5}$	☐儀器原始數據 ☐儀器校正記錄 ☐其他 _____ ☐其他 _____	☐振動	☐儀器原始數據 ☐儀器校正記錄 ☐其他 _____ ☐其他 _____

空氣品質監測計畫書

委託編號:	ZL02AB0558		
初勘日期: 101.10.8	初勘人員: 林俊秀	監測頻率 * 次/□月■季	共計 * 次
檢測目的: ■定期監測 □稽查監測 □申請許可 □改善完成□自行評鑑□其他			

一、委託單位與計畫基本資料

委託單位: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測	聯絡人:	劉治桓	聯絡電話:	02-82217666*204
計畫名稱: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測	聯絡人:	*	聯絡電話:	*
計畫位址: 彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測				

二、監測要求

監測位置	監測項目與方法				電源
基地	■ CO	NIEA A421	■ CH_4/THC		□110V■220V□發電機
	■ SO_2	NIEA A416	■ 氣象		□其他
	■ NO/NO_2	NIEA A417	■ 落塵		□110V□220V□發電機
	■ O_3	NIEA A420	□ $PM_{2.5}$	NIEA A205	□其他
	■ TSP	NIEA A102	□ ____	NIEA ____	□110V□220V□發電機
	■ PM_{10}	NIEA A206	□ ____	NIEA ____	□其他
	□ 金屬	NIEA A301	□ 金屬	NIEA A306	□110V□220V□發電機
	□ 無機酸	NIEA A435	□ ____	NIEA ____	□其他

三、儀器設備

■CO分析儀	■SO_2分析儀	■NO_X分析儀	■O_3分析儀	■PM_{10}分析儀
■THC分析儀	■氣象儀	■高量採樣器	■Hi-vol濾紙	■動態稀釋器
■標準氣體	■資料收集器	■校正流量計	■小孔校正器	■大氣壓力計
□ mini-pump	□矽膠管	□____ 吸收液	■H_2	□PM2.5分析儀
□	□	□	□	□

四、監測一般事宜

出發日期: 102.10.13	監測日期: 102.10.13~14	往返交通工具:	1370-EH、2453-UK
監測人員:	陳銘洲 張宇傑	監督人員隨行:	■ 是 □ 否

五、作業安全

■警示標誌 ■警示帶 ■警示燈 ■安全帽■手電筒■急救箱 ■反光背心

六、注意事項

監測人員注意墜落、感電、雷擊
監測人員注意行車安全
其他未盡事項以安全第一為首項

品管負責人:張宇傑　　監測小組負責人: 陳銘洲

審核人: 林敬元

空氣品質監測計畫書(續)

監測位置:基地	監測位置:
	
監測位置:	監測位置:
	

空氣品質監測儀器設備檢查表

檢查日期：102.10.13　檢查人員：[illegible]　監測車號：2453-UK

確認日期：102.10.13　確認人員：張宇傑　審核人：[illegible]

一、文件資料

	前	後	
1	☑	☑	空氣品質監測計畫書及位置圖
2	☑	☑	空氣品質校正記錄表
3	☑	☑	空氣品質監測概況說明表
4	☑	☑	高量採樣器使用前後校正表
5	☑	☑	空氣樣品監視鏈
6	☑	☑	空氣品質監測儀器設備檢查表
~~7~~	~~☐~~	~~☐~~	~~周界檢測氣狀污染物紀錄表~~
~~8~~	~~☐~~	~~☐~~	~~採樣與分析過程之樣品核對記錄表~~
9	☑	☑	周界儀器自動監測資料轉交表
10	☑	☑	空氣品質監測車執行中每日檢查表
11	☑	☑	PM10監測儀流量校正及射源強度紀錄表
~~12~~	~~☐~~	~~☐~~	~~PM2.5監測儀流量校正及射源強度紀錄表~~
~~13~~	~~☐~~	~~☐~~	~~PM2.5現場採樣執行前、後檢查表~~
14	☐	☐	
15	☐	☐	

	前	後	
31	☑	☑	照相機
32	☐	☐	發電機
33	☑	☑	針筒
34	☐	☐	冰塊
35	☐	☐	放大鏡
36	☐	☐	皮尺
37	☐	☐	無塵布
38	☐	☐	酒精
39	☐	☐	照明燈
40	☐	☐	水平儀
41	☐	☐	帳篷
42	☐	☐	25~4℃保存冰箱
43	☐	☐	冰箱
44	☐	☐	
45	☐	☐	

二、儀器設備

	前	後		
1	☑	☑	CO 分析儀(序號：D000RBSH	)
2	☑	☑	SO_2 分析儀(序號：40214320022	)
3	☑	☑	NO_X分析儀(序號：4341998001	)
4	☑	☑	O_3分析儀(序號：59288101	)
5	☑	☑	THC 分析儀(序號 ：59045051	)
6	☑	☑	PM_{10} 分析儀(序號：85116501E	)
~~7~~	~~☐~~	~~☐~~	~~$PM_{2.5}$分析儀(序號：~~	~~)~~
8	☑	☑	高量採樣器(序號：HIVOL-6	)
9	☑	☑	氣象設備(序號：33546,2903	)
10	☑	☑	電腦(包含傳輸線)	
11	☑	☑	動態稀釋器(序號：09620605	)
12	☑	☑	標準氣體(編號：CB09847	)
13	☑	☑	校正流量計(序號：129934	)
14	☑	☑	小孔校正器(序號：1243	)
15	☑	☑	大氣壓力計 (標準值：744 實際值：744)	
16	☑	☑	比對溫度計	
~~17~~	~~☐~~	~~☐~~	~~mini-pump ___ 台~~	
~~18~~	~~☐~~	~~☐~~	~~矽膠管 ___ 支~~	
19	☑	☑	Hi-vol濾紙 7 張	
20	☐	☐	活性碳管 ___ 支	
21	☐	☐	_____ 吸收液	
22	☐	☐		
23	☐	☐		
24	☐	☐		
25	☑	☑	氬氣	
26	☑	☑	三用電表	
27	☐	☐	PM2.5保存盒 ___ 盒	
28	☐	☐	無粉手套	
29	☐	☐	水柱壓差計	
30	☑	☑	指北針	

三、安全設備

	前	後	
1	☑	☑	安全帽
2	☑	☑	反光背心
3	☑	☑	警示標誌
4	☑	☑	警示燈
5	☑	☑	警示帶
6	☑	☑	急救箱
7	☐	☐	
8	☐	☐	

四、品保品管

	前	後	
1	☑	☑	運送空白 * 1 張 (TSP)
			運送空白 * ___ 組 (無機酸)
			運送空白 * ___ 組 (PM2.5)
			運送空白 * ___ 組 (_____)
			運送空白 * ___ 組 (_____)
			運送空白 * ___ 組 (_____)
2	☐	☐	設備空白 * ___ 張 (_____)
			設備空白 * ___ 組 (_____)
			設備空白 * ___ 組 (_____)
			設備空白 * ___ 組 (_____)
			設備空白 * ___ 組 (_____)
			設備空白 * ___ 組 (_____)
			設備空白 * ___ 組 (_____)
3	☑	☑	現場空白 * 1 組 (TSP)
			現場空白 * ___ 組 (無機酸)
			現場空白 * ___ 組 (PM2.5)
			現場空白 * ___ 組 (_____)
			現場空白 * ___ 組 (_____)
			現場空白 * ___ 組 (_____)
			現場空白 * ___ 組 (_____)

空氣品質監測車多點校正表

監測車車號: 2453-UK　　校正人員: 林瑞祥

校正日期: 102.08.26　　審核人: 鐘美紅

一.鋼瓶氣體數據

標準氣體鋼瓶號: CBO9847

配製日期: 101/07/16

NO 濃度: 25.74 ppm

CO 濃度: 2503 ppm

SO_2 濃度: 25.49 ppm

CH_4 濃度: 2519 ppm

二.校正器數據

廠牌/型號: SABIO 4010

序　號: 9620605

校正日期: 102.08.26

標準氣體流量校正:

斜　率(m): 0.98705

截　距(b): -0.0599

相 關 係 數(r): 1.0000

零氣體流量校正

斜　率(m): 1.002265

截　距(b): 0.0010

相 關 係 數(r): 1.0000

03校正日期: 102.8.26

斜　率(m): 1.015

截　距(b): 0.316

相 關 係 數(r): 1.0000

空氣品質監測車多點校正表(續)

校正地點: 金宏昱　　校正人員: 林瑞祥

校正日期: 102.8.26　　審核人: 鐘美紅

1.一氧化碳多點校正數據

	SPAN CONC	儀器 ppm
1	0.0	0.08
2	10.0	10.19
3	20.0	20.22
4	30.0	30.12
5	40.0	40.00

CO

斜　率(m): 0.9977 (0.880~1.120)

截　距(b): 0.1680 (≦±2% OF F.S)

相關係數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

2.二氧化硫多點校正數據

	SPAN CONC	儀器 ppb
1	0	0.3
2	100	102.1
3	200	199.8
4	300	299.8
5	396	396.6

SO_2

斜　率(m): 0.9983 (0.880~1.120)

截　距(b): 0.8647 (≦±2% OF F.S)

相關係數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

3.氮氧化物多點校正數據

	SPAN CONC SET(NO&NOx)	儀器 NO ppb	儀器 NOx ppb
1	0	0.0	0.2
2	100	99.6	99.7
3	200	198.6	198.9
4	300	302.7	304.3
5	400	401.3	402.5

NO

斜　率(m): 1.0055 (0.880~1.120)

截　距(b): -0.6798 (≦±2% OF F.S)

相關係數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

NOx

斜　率(m): 1.0090 (0.880~1.120)

截　距(b): -0.6997 (≦±2% OF F.S)

相關係數(r): 0.9999 (0.995~1.000)

4.臭氧多點校正數據

	SPAN CONC	儀器 ppb
1	0	0.7
2	100	96.4
3	200	201.7
4	300	299.9
5	400	399.0

O_3

斜　率(m): 0.9999 (0.880~1.120)

截　距(b): -0.4599 (≦±2% OF F.S)

相關係數(r): 0.9999 (0.995~1.000)

5.碳氫化合物多點校正數據

	SPAN CONC SET(CH_4&THC)	儀器 CH_4 ppmC	儀器 THC ppmC
1	0.0	0.00	0.13
2	10.0	10.05	10.25
3	20.0	20.04	20.28
4	30.0	29.99	30.22
5	40.2	39.89	40.28

CH_4

斜　率(m): 0.9932 (0.880~1.120)

截　距(b): 0.0902 (≦±2% OF F.S)

相關係數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

THC

斜　率(m): 0.9987 (0.880~1.120)

截　距(b): 0.2183 (≦±2% OF F.S)

相關係數(r): 1.0000 (0.995~1.000)

環境品質監測概況說明

工程名稱	彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測
監測站之詳細位置說明	基地
監測項目	TSP、PM10、NOx、SOx、THC/NMHC、O3、CO、溫度、溼度、風向、風速
監測日期	102.10.13~102.10.14
監測天候狀況	晴
周遭環境特點（敏感點）說明	測點位於海巡署南哨營區、附近有風力發電風車
施工作業概述	基地進行整地工程

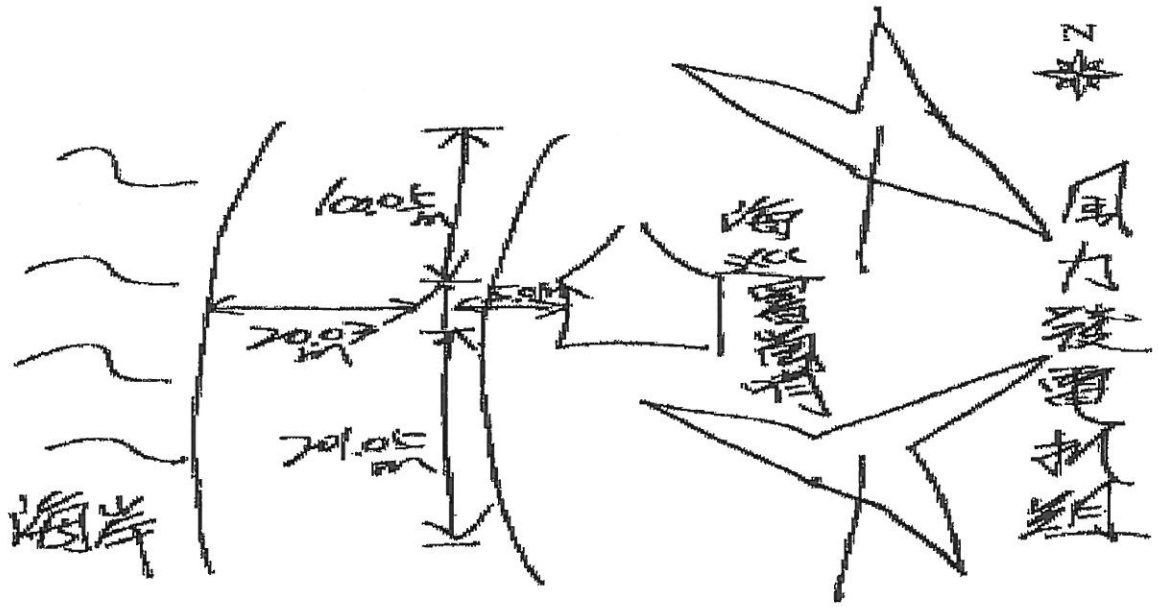

監測人員：

審核人員：

PM_{10}監測儀流量校正及射源強度記錄表

監測地點：基地　　校正人員：[illegible]

審核人：[illegible]

校正流量計廠牌：BIOS　　校正流量計型號/序號：530H/129934

監測前

日期：102.10.13　　大氣壓力Pa：755 mmHg

大氣溫度Ta：26.1 ℃　　飽和蒸氣壓 P_{H2O}：＊ mmHg

項目	校正次數	儀器流量 Q1(L/min)	換算後儀器流量Q2(L/min)	校正器流量 Qc(L/min)	換算後校正器流量Q(L/min)	誤差(%)	平均誤差 ≦±10%
流量校正	1	16.7	16.5	16.149	15.984	2.23	2.19
	2	16.7	16.5	16.156	15.991	2.18	
	3	16.7	16.5	16.157	15.992	2.18	
	4	16.7	16.5	16.165	16.000	2.13	
	5	16.7	16.5	16.149	15.984	2.23	
貝他射源強度			☑ COUNT ☐ Hz	12390			

監測後

日期：102.10.14　　大氣壓力Pa：754 mmHg

大氣溫度Ta：27.2 ℃　　飽和蒸氣壓 P_{H2O}：＊ mmHg

項目	校正次數	儀器流量 Q1(L/min)	換算後儀器流量Q2(L/min)	校正器流量 Qc(L/min)	換算後校正器流量Q(L/min)	誤差(%)	平均誤差 ≦±10%
流量校正	1	16.7	16.4	16.131	15.886	2.24	2.23
	2	16.7	16.4	16.135	15.890	2.21	
	3	16.7	16.4	16.129	15.884	2.25	
	4	16.7	16.4	16.131	15.886	2.24	
	5	16.7	16.4	16.137	15.892	2.20	
貝他射源強度			☑ COUNT ☐ Hz	12449			

換算後儀器流量計算：Q2=Q1×【（Pa/760）×（298/（Ta+273））】

換算後流量計算：Q=Qc×【（Pa-P_{H2O})/760）×（298/（Ta+273））））】

誤差計算：（（Q2-Q）/Q）×100％

使用乾式流量計校正時，無須扣除飽和蒸氣壓

若貝他射源強度COUNT小於5000或貝他射源強度小於100Hz，將儀器送修。

空氣品質監測車監測前後校正表

監測地點：基地　　檢查人員：[illegible]

審核人：[illegible]

監測前偏移檢查　　檢查日期：102.10.13

監測項目	零點偏移		偏移結果	全幅偏移		偏移結果	是否合格	
	設定值(A)	顯示值(B)	(B-A)	設定值(C)	顯示值(D)	(D-C)		
CO(ppm)	0.00	0.05	0.05	40.00	40.05	0.05	☑ 是	☐ 否
SO_2(ppb)	0.0	2.3	2.3	396.3	398.4	2.1	☑ 是	☐ 否
NO(ppb)	0.0	1.3	1.3	400.1	400.7	0.6	☑ 是	☐ 否
NO_X(ppb)	0.0	2.7	2.7	400.1	401.1	1.0	☑ 是	☐ 否
O_3(ppb)	0.0	1.7	1.7	400.0	400.1	0.1	☑ 是	☐ 否
CH_4(ppmC)	0.00	0.17	0.17	40.24	40.23	-0.01	☑ 是	☐ 否
THC(ppmC)	0.00	0.24	0.24	40.24	40.44	0.20	☑ 是	☐ 否

監測後偏移檢查　　檢查日期：102.10.14

監測項目	零點偏移		偏移結果	全幅偏移		偏移結果	是否合格	
	設定值(A)	顯示值(B)	(B-A)	設定值(C)	顯示值(D)	(D-C)		
CO(ppm)	0.00	0.08	0.08	40.00	40.04	0.04	☑ 是	☐ 否
SO_2(ppb)	0.0	0.6	0.6	396.3	398.4	2.1	☑ 是	☐ 否
NO(ppb)	0.0	0.8	0.8	400.1	402.3	2.2	☑ 是	☐ 否
NO_X(ppb)	0.0	2.6	2.6	400.1	404.1	4.0	☑ 是	☐ 否
O_3(ppb)	0.0	0.5	0.5	400.0	402.8	2.8	☑ 是	☐ 否
CH_4(ppmC)	0.00	0.28	0.28	40.24	40.31	0.07	☑ 是	☐ 否
THC(ppmC)	0.00	0.25	0.25	40.24	40.50	0.26	☑ 是	☐ 否

零點/全幅偏移品質管制範圍：

監測項目	CO	SO_2	O_3	NOx	CH_4	THC
零點偏移	±0.5ppm	±4ppb	±20ppb	±20ppb	±0.5ppmC	±0.5ppmC
全幅偏移	設定值±2%	設定值±3%	±20ppb	±20ppb	設定值±2%	設定值±2%

註：零點/全幅兩點偏移檢查，須符合零點/全幅偏移品質管制範圍方能判定合格

若零點/全幅兩點偏移檢查判定不合格，須重新執行多點校正

高量採樣器使用前後校正表

日期	小孔校正器號碼:	1247	斜率(m1):	1.4968	截距(b1):	0.0757	使用人		備註
102.10.17	高量採樣器號碼:	HV686	斜率(m2):	1.1690	截距(b2):	-0.2225	[illegible]		
測站名稱	採樣前/後	大氣壓力 P(mm-Hg)	大氣溫度 T(℃)	水柱壓差 ΔH(in-H_2O)	校正流量 Q (m^3/min)	校正流量補正 Q_0 (m^3/min)	浮子流量 Y(m^3/min)	誤差 (%)	
基地	採樣前	755	26.1	4.1	1.30	*	1.30	0.00	
	採樣開始	755	26.1	*	*	*	1.30	*	
	採樣結束	754	27.2	*	*	*	1.30	*	
	採樣後	754	27.2	4.2	1.31	*	1.30	-0.76	

日期	小孔校正器號碼:		斜率(m1):		截距(b1):		使用人		備註
	高量採樣器號碼:		斜率(m2):		截距(b2):				
測站名稱	採樣前/後	大氣壓力 P(mm-Hg)	大氣溫度 T(℃)	水柱壓差 ΔH(in-H_2O)	校正流量 Q (m^3/min)	校正流量補正 Q_0 (m^3/min)	浮子流量 Y(m^3/min)	誤差 (%)	
	採樣前								
	採樣開始			*	*	*		*	
	採樣結束			*	*	*		*	
	採樣後								

日期	小孔校正器號碼:		斜率(m1):		截距(b1):		使用人		備註
	高量採樣器號碼:		斜率(m2):		截距(b2):				
測站名稱	採樣前/後	大氣壓力 P(mm-Hg)	大氣溫度 T(℃)	水柱壓差 ΔH(in-H_2O)	校正流量 Q (m^3/min)	校正流量補正 Q_0 (m^3/min)	浮子流量 Y(m^3/min)	誤差 (%)	
	採樣前								
	採樣開始			*	*	*		*	
	採樣結束			*	*	*		*	
	採樣後								

1.校正流量Q=(((ΔH*(P/760)*(298/(273+T))))$^{1/2}$)-b1)/m1

2.當溫度、壓力變化很大時(採樣當日溫度、大氣壓力與小孔校正器追溯傳輸驗證時溫度T±15℃或大氣壓力P±60mmHg)，則小孔校正器之校正流量依下式補正：

說明: $$Q0 = Q \times \left[\frac{(273+T)}{298} \times \frac{760}{P} \right]$$

3.誤差=((浮子流量-校正流量)/校正流量)*100%

4.誤差須小於 ±7 %,否則須重作多點校正

審核人：[illegible]

Date	Time	CO	SO2	NO	NOx	NO2	CH4	THC	NMHC	O3	PM10	WD	WS	TEMP	HUM	SP
2013/10/13	10:05	0.23	9.44	3.48	7.83	4.35	1.86	3.71	1.86	50.41	-0.2	329.13	5.85	26.22	76.79	76.33
2013/10/13	10:06	0.23	43.61	77.74	94.55	16.81	1.04	2.12	1.08	51.84	-0.2	326.54	5.72	26.26	76.69	78.56
2013/10/13	10:07	0.22	75.01	68.7	103.41	34.71	1.08	2.08	1	51.19	-0.2	333.31	5.85	26.27	76.72	77.56
2013/10/13	10:08	0.22	50.8	4.53	14.59	10.06	1.18	2.05	0.87	52.43	-0.2	326.49	5.83	26.25	77.05	79.44
2013/10/13	10:09	0.19	12.64	1.23	4.2	2.97	1.3	2.05	0.75	54.18	-0.2	330.87	5.33	26.29	77.14	81.9
2013/10/13	10:10	0.16	8.5	0.33	3.56	3.23	1.41	2.06	0.65	54.53	-0.2	325.77	5.15	26.37	77.06	82.52
2013/10/13	10:11	0.17	7.72	0.29	2.8	2.51	1.47	2.07	0.61	56.04	-0.2	327.15	5.09	26.44	79.1	85.03
2013/10/13	10:12	0.17	6.64	1.11	3.21	2.11	1.52	2.08	0.56	56.09	-0.2	324.37	5.38	26.41	77.09	84.99
2013/10/13	10:13	0.19	3.54	1.15	3.55	2.4	1.56	2.08	0.52	53.29	-0.2	326.71	5.22	26.35	76.3	80.95
2013/10/13	10:14	0.19	3.44	1.05	3.46	2.41	1.6	2.08	0.48	52.99	-0.2	330.13	5.3	26.36	76.62	80.41
2013/10/13	10:15	0.17	√ 3.32	1.25	3.74 zero	2.49	1.65	2.08	0.44	57.3	-0.2	326.57	5.3	26.49	78	87.05
2013/10/13	10:16	0.18	16.88	35.7	32.88	-2.83	1.69	2.07	0.38	55.93	-0.2	323.89	5.48	26.47	76.65	84.89
2013/10/13	10:17	0.19	137.21	246.98	235.38	-11.61	1.72	2.08	0.36	57.74	-0.2	327.89	5.31	26.56	78.86	87.72
2013/10/13	10:18	0.21	301.88	388.81	383.55	-5.26	1.76	2.08	0.31	57.7	-0.2	330.47	5.37	26.6	77.07	87.56
2013/10/13	10:19	0.17	366.94	401.56	399.13	-2.42	1.76	2.05	0.29	54.21	-0.2	328.72	5.91	26.53	75.56	82.32
2013/10/13	10:20	0.18	378.66	398.27	400.64	2.37	1.83	2.03	0.2	55.98	-0.2	321.96	5.85	26.51	76.77	84.86
2013/10/13	10:21	0.17	381.28	399.84	402.94	3.1	1.93	2.04	0.11	58.7	-0.2	322.84	5.58	26.59	76.24	89.08
2013/10/13	10:22	0.12	381.48	403.71	407.29	3.59	1.97	2.05	0.08	56.3	-0.2	322.07	5.93	26.54	75.81	85.45
2013/10/13	10:23	0.15	385.95	400.1	401.97	1.87	1.96	2.06	0.09	58.22	-0.2	324.45	5.6	26.6	75.77	88.48
2013/10/13	10:24	0.17	392.29	399.78	400.85	1.07	1.96	2.06	0.09	59.04	-0.2	321.35	6.77	26.62	76.11	89.79
2013/10/13	10:25	0.17	398.47	400.79	401.36	0.57	1.96	2.06	0.1	64.13	-0.2	322.8	6.57	26.83	77.51	97.46
2013/10/13	10:26	0.17	√ 398.36	400.65	401.13 span	0.48	1.97	2.05	0.08	64.51	-0.2	328.8	5.98	26.88	77.87	98.11
2013/10/13	10:27	4.15	330.57	309.24	318.71	9.47	2.81	2.76	-0.05	60.45	-0.2	330.99	5.98	26.79	75.2	91.97
2013/10/13	10:28	4.57	146.91	72.99	84.03	11.04	4.76	5	0.24	59.12	-0.2	324.4	5.2	26.66	75.22	90.05
2013/10/13	10:29	0.76	22.52	1.71	5.44	3.73	0.95	1.1	0.15	60.94	-0.2	325.25	5.64	26.66	75.55	92.63
2013/10/13	10:30	0.17	8.89	1.81	5.94	4.14	0.33	0.36	0.02	63.96	-0.2	326.42	5.82	26.75	75.74	97.02
2013/10/13	10:31	0.05	6.17	2.03	6.01	3.98	0.24	0.26	0.02	60.14	-0.2	325.59	5.85	26.63	75.51	91.38
2013/10/13	10:32	0.04	5.25	2.44	6.59	4.15	0.18	0.26	0.07	62.4	-0.2	326.8	5.19	26.67	76.2	94.82
2013/10/13	10:33	√ 0.05 zero	4.72	2.32	6.14	3.82	√ 0.17	0.24 zero	0.07	64.72	-0.2	327.58	5.79	26.72	76.43	98.32
2013/10/13	10:34	13.42	4.43	1.87	6.29	4.42	8.67	8.01	-0.66	63.63	-0.2	326.07	5.55	26.73	76.63	96.79
2013/10/13	10:35	37.81	3.87	2.42	7.12	4.7	35.48	35.69	0.21	64.3	-0.2	321.8	5.71	26.77	76.75	97.85
2013/10/13	10:36	40.06	3.46	1.97	5.6	3.63	39.21	39.88	0.67	62.08	-0.2	328.78	6.29	26.8	75.69	94.48
2013/10/13	10:37	40.05	3.45	1.98	5.39	3.41	40.16	40.31	0.15	62.42	-0.2	329.6	6.28	26.84	74.91	95.01
2013/10/13	10:38	40.07	3.18	1.65	4.92	3.27	40.27	40.39	0.13	63.06	-0.2	329.99	6.02	26.9	76.55	95.92
2013/10/13	10:39	40.07	2.85	1.09	4.16	3.07	40.24	40.39	0.15	65.92	-0.2	329.08	6.12	27.04	75.82	100.22
2013/10/13	10:40	√ 40.05 span	2.79	1.68	4.58	2.9	√ 40.23	40.44 span	0.22	60.73	-0.2	324.39	6.85	26.96	76.07	92.59

Date	Time	CO	SO_2	NO	NO_x	NO_2	CH_4	THC	NMHC	O_3	PM_{10}	WD	WS	TEMP	HUM	狀
2013/10/13	10:41	14.75	2.96	2.04	5.41	3.37	25.66	27.07	1.41	15.12	-0.2	325.97	6.11	27.05	76	23.23
2013/10/13	10:42	0.15	2.87	2.17	5.61	3.44	2.16	2.16	0	-3.24	-0.2	321.78	5.53	26.94	75.73	32.34
2013/10/13	10:43	0.17	2.65	3.39	6.78	3.39	2.11	2.09	-0.02	0.81	-0.2	323.6	5.59	26.93	76.15	21.71
2013/10/13	10:44	0.16	2.62	3.84	8.55	4.71	2.1	2.07	-0.03	1.23	-0.2	328.13	5.74	26.89	76.59	32.47
2013/10/13	10:45	0.16	2.58	1.12	5.3	4.18	2.09	2.08	-0.02	1.59	-0.2	331.02	5.52	26.85	77.44	43.02
2013/10/13	10:46	0.16	2.5	0.94	4.88	3.94	2.08	2.07	-0.01	V 1.7 zero	-0.2	329.77	5.78	26.87	77.98	53.08
2013/10/13	10:47	0.18	2.37	0.77	4.76	3.98	2.06	2.07	0.01	10	-0.2	320.53	6.9	26.98	78.12	75.85
2013/10/13	10:48	0.18	2.16	1.04	5.01	3.97	2.06	2.09	0.03	168.43	-0.2	324.66	6.45	26.96	77.05	255.71
2013/10/13	10:49	0.18	2.15	1.74	5.43	3.69	2.05	2.12	0.06	343.1	-0.2	326.57	6.08	26.88	76.19	517.88
2013/10/13	10:50	0.17	2.14	1.54	4.85	3.31	2.05	2.12	0.06	387.31	-0.2	329.45	6.02	26.92	78.1	584.32
2013/10/13	10:51	0.16	1.91	1.92	5.51	3.59	2.04	2.12	0.08	399.12	-0.2	326.99	5.96	26.95	76.38	601.82
2013/10/13	10:52	0.17	1.8	1.63	5.97	4.34	2.04	2.11	0.07	400.17	-0.2	325.43	6.09	26.91	76.02	603.44
2013/10/13	10:53	0.16	1.84	1.3	5.88	4.58	2.04	2.12	0.08	V 400.07 span	-0.2	324.95	6.91	26.95	77.76	603.78
2013/10/13	11:00	0.16	1.51	4.87	6.66	1.79	2.06	2.13	0.07	63.56	89.7	326.57	6.28	26.86	81.74	102.15
2013/10/13	12:00	0.15	1.61	4.69	6.83	2.14	2.06	2.09	0.03	61.23	80.7	325.69	6.64	26.85	80.51	98.28
2013/10/13	13:00	0.18	1.82	3.35	7.3	3.95	2.02	2.09	0.07	59.46	77.8	335.61	6.62	26.74	79.85	95.63
2013/10/13	14:00	0.19	1.78	3.54	6.95	3.41	2.04	2.07	0.03	58.18	75.8	348.59	6.2	26.47	80.42	94.47
2013/10/13	15:00	0.14	2.33	2.74	5.91	3.17	2.05	2.08	0.03	58.21	80.7	354.16	6.6	26.4	81.28	93.9
2013/10/13	16:00	0.16	2.45	1.47	4.19	2.72	2.06	2.07	0.01	56.35	72.9	354.5	5.91	26.19	82.64	91.15
2013/10/13	17:00	0.15	2.58	1.07	4.72	3.65	2.08	2.1	0.02	53.65	61.7	354.55	6.39	26.21	82.81	88.29
2013/10/13	18:00	0.14	2.73	1.09	5.46	4.37	2.09	2.1	0.01	48.21	62.9	355.19	5.92	26.28	81.31	79.07
2013/10/13	19:00	0.13	1.26	1.01	6.32	5.31	2.08	2.12	0.04	42.04	58.7	357.8	5.72	26.28	78.1	69.12
2013/10/13	20:00	0.15	3.14	0.96	4.98	4.02	2.08	2.12	0.04	38.39	54.8	3.34	6.12	26.16	74.82	62.2
2013/10/13	21:00	0.14	2.83	0.99	3.73	2.74	2.09	2.15	0.07	30.88	49.7	8.2	5.18	25.78	75.28	51.52
2013/10/13	22:00	0.11	2.51	1.01	3.76	2.75	2.1	2.17	0.07	26.15	44.8	8.51	3.93	25.48	78.23	45.08
2013/10/13	23:00	0.09	1.07	0.74	3.9	3.16	2.12	2.21	0.09	17.25	40.7	9.32	3.16	24.99	80.1	31.21
2013/10/14	00:00	0.08	1.24	1.18	4.4	3.22	2.15	2.25	0.1	10.85	42.8	317.22	5.44	24.53	79.07	21.22
2013/10/14	01:00	0.09	1.26	1.02	4.01	2.99	2.19	2.3	0.12	11.54	40.6	337.93	6.41	24.41	79.78	20.76
2013/10/14	02:00	0.11	1.54	1.21	4.56	3.35	2.33	2.48	0.15	8.08	45.8	251.45	5.33	24.46	82.64	17.15
2013/10/14	03:00	0.12	1.76	1.17	5.14	3.97	2.41	2.63	0.22	11.8	49.7	117.17	3.18	25.05	83.68	22.66
2013/10/14	04:00	0.14	1.97	1.46	5.01	3.55	2.42	2.58	0.17	15.71	57.9	359.47	4.65	25.23	86.19	31.1
2013/10/14	05:00	0.12	1.92	1.91	5.98	4.07	2.36	2.46	0.1	21.24	51.6	2.19	4.38	25.49	86.99	42.6
2013/10/14	06:00	0.13	2.38	1.76	6.17	4.41	2.29	2.41	0.12	19.85	64.9	4.02	4.32	25.67	83.79	22.85
2013/10/14	07:00	0.15	2.29	2.16	6.7	4.54	2.24	2.38	0.14	15.2	57.8	356.72	4.11	25.88	81.62	29.67
2013/10/14	08:00	0.15	1.91	2.02	7.19	5.17	2.16	2.22	0.05	24.81	68.3	356.01	5.18	25.9	82.14	43.34
2013/10/14	09:00	0.13	1.35	3.8	6.84	3.04	2.12	2.14	0.03	39.72	80.6	330.47	6.12	26.16	80.63	48.9
2013/10/14	10:00	0.16	2.12	4.35	6.44	2.09	2.1	2.12	0.02	44.09	81.8	327.68	4.56	26.4	80.32	72.05

監測中

Date	Time	CO	SO_2	NO	NO_x	NO_2	CH_4	THC	NMHC	O_3	PM_{10}	WD	WS	TEMP	HUM	SP
2013/10/14	11:05	0.12	-3.9	1.17	2.62	1.45	2.06	2.07	0.01	64.23	-0.2	340.63	6.27	27.5	84.19	100.87
2013/10/14	11:06	0.12	-2.96	2.35	2.46	0.11	2.02	2.07	0.05	61.75	-0.2	327.83	6.24	27.31	85.73	96.65
2013/10/14	11:07	0.14	-1.07	1.92	3.29	1.37	2.01	2.06	0.05	60.36	-0.2	341.89	6.64	27.23	85.4	92.41
2013/10/14	11:08	0.1	-0.07	0.78	3.81	3.03	2.03	2.05	0.01	58.98	-0.2	335.49	6.18	27.07	85.75	90.39
2013/10/14	11:09	0.12	0.21	0.51	2.87	2.36	2.01	2.08	0.08	61.04	-0.2	325.4	4.82	27.16	86.85	93.33
2013/10/14	11:10	0.1	0.74	0.69	2.56	1.87	2.04	2.06	0.02	62.71	-0.2	355.08	5.45	27.28	86.99	95.85
2013/10/14	11:11	0.09	✓ 0.56	0.78	2.61 zero	1.83	2.06	2.06	-0.01	62.35	-0.2	330.36	6.85	27.28	86.16	95.28
2013/10/14	11:12	0.1	1.35	1.07	2.42	1.35	2.09	2.05	-0.05	61.08	-0.2	315.11	5.05	27.25	86.14	93.32
2013/10/14	11:13	0.07	17.4	35.37	33.87	-1.49	2.13	2.08	-0.05	59.97	-0.2	2.9	4.71	27.73	87.85	91.1
2013/10/14	11:14	0.06	97.04	161.15	159.11	-2.04	2.14	2.07	-0.07	58.95	-0.2	32.39	3.34	27.89	87.32	90
2013/10/14	11:15	0.08	178.47	268.75	268	-0.75	2.06	2.09	0.03	58.73	-0.2	31.64	3.32	27.11	87.85	89.59
2013/10/14	11:16	0.07	251.81	343.92	347.58	3.66	2.07	2.1	0.04	58.97	-0.2	31.38	3.35	27.43	87.7	89.92
2013/10/14	11:17	0.07	339.84	386.84	392.81	5.97	2.09	2.09	0	60.51	-0.2	31.59	3.43	27.23	87.62	92.5
2013/10/14	11:18	0.08	385.08	394.26	399.56	5.3	2.08	2.09	0.01	60.41	-0.2	31.32	3.44	27.58	87.48	92.33
2013/10/14	11:19	0.1	398.41	399.62	402.87	3.25	2.08	2.07	-0.01	60.15	-0.2	30.93	3.42	27.49	87.51	92.09
2013/10/14	11:20	0.1	399.85	401.58	403.74	2.16	2.08	2.08	0	60.16	-0.2	30.77	3.41	27.75	87.8	91.88
2013/10/14	11:21	0.42	✓ 398.44	402.33	404.11 span	1.78	2.06	2.06	0	60.16	-0.2	30.57	3.42	27.93	87.14	91.83
2013/10/14	11:22	14.12	358.91	295.43	308.13	12.7	12.92	12.07	-0.85	61.22	-0.2	30.56	3.47	27.97	87.99	104.04
2013/10/14	11:23	3.36	195.94	82.09	92.17	10.08	7.39	8.06	0.68	60.47	-0.2	29.87	3.43	27.18	88.7	92.51
2013/10/14	11:24	0.24	59.27	0.68	2.05	1.37	1.25	1.87	0.62	58.76	-0.2	28.59	3.32	27.62	89.1	89.86
2013/10/14	11:25	0.11	15.75	0.36	2.08	1.71	0.83	1.13	0.3	58.61	-0.2	28.19	3.31	27.72	89.06	89.63
2013/10/14	11:26	0.09	7.72	0.59	2.22	1.64	0.44	0.56	0.12	60.15	-0.2	29.06	3.39	27.7	89.01	92.01
2013/10/14	11:27	0.08	4.76	0.88	2.31	1.43	0.31	0.4	0.09	60.83	-0.2	29.1	3.43	27.65	89	93.16
2013/10/14	11:28	✓ 0.08 zero	-0.52	1.32	2.49	1.18	0.28	0.35 zero	0.07	61.99	-0.2	29.3	3.48	27.72	88.79	94.94
2013/10/14	11:29	13.4	-0.52	0.37	0.28	-0.09	10.75	10.54	-0.21	59.34	-0.2	27.44	3.26	27.23	88.3	90.76
2013/10/14	11:30	37.68	-0.52	0.37	0.27	-0.09	38.81	39.34	0.53	59.72	-0.2	25.63	3.14	27.8	87.49	91.28
2013/10/14	11:31	39.91	-0.52	0.39	0.27	-0.12	40.31	40.46	0.15	59.32	-0.2	25.23	3.11	27.99	87.4	90.72
2013/10/14	11:32	40.01	-0.53	0.36	0.27	-0.09	40.34	40.45	0.11	60.92	-0.2	26.75	3.25	27.79	87.88	93.04
2013/10/14	11:33	40.02	-0.53	0.39	0.29	-0.1	40.32	40.47	0.15	62.36	-0.2	26.76	3.41	27.58	88.04	95.2
2013/10/14	11:34	✓ 40.04 span	-0.52	0.38	0.28	-0.11	40.31	40.5 span	0.19	54.97	-0.2	25.17	3.08	27.97	87.65	84.2
2013/10/14	11:35	14.44	-0.52	0.38	0.28	-0.1	27.15	29.42	2.27	-5.38	-0.1	173.79	3.42	27.09	87.33	83.32
2013/10/14	11:36	0.25	-0.5	0.4	0.25	-0.15	0.06	0.18	0.12	0.9	-0.2	186.48	3.11	27.69	88.19	91.2
2013/10/14	11:37	-3.2	-0.5	0.38	0.28	-0.1	0.07	0.19	0.12	0.74	-0.2	186.65	4.08	27.18	87.53	91.8
2013/10/14	11:38	-4.14	-0.52	0.38	0.27	-0.11	0.07	0.19	0.13	0.65	-0.2	186.6	4.18	26.79	88.54	102.02
2013/10/14	11:39	-1.66	-0.51	0.37	0.26	-0.11	0.05	0.18	0.13	✓ 0.53 zero	-0.2	186.59	4.22	26.64	87.33	112.01
2013/10/14	11:40	-2.19	-0.53	0.37	0.29	-0.08	0	0.18	0.19	18.65	-0.2	19.84	4.93	26.6	87.91	129.26
2013/10/14	11:41	-1.65	-0.53	0.38	0.28	-0.09	-0.16	0.2	0.36	173.54	-0.2	42.51	4.64	26.68	88.91	153.38

Date	time	CO	SO_2	NO	NO_x	NO_2	CH_4	THC	NMHC	O_3	PM_{10}	WD	WS	TEMP	HUM	SP
2013/10/14	11:42	-1.66	-0.53	0.38	0.26	-0.13	0.02	0.05	0.03	282.47	-0.2	71.57	4.5	27.04	87.73	179.37
2013/10/14	11:43	-1.07	-0.52	0.4	0.3	-0.1	0.02	0.05	0.03	367.92	-0.2	101.66	4.59	27.71	88.19	107.15
2013/10/14	11:44	-0.57	-0.51	0.39	0.29	-0.1	0.02	0.05	0.03	388.93	-0.2	122.03	4.01	27.59	88.6	195.28
2013/10/14	11:45	-1.78	-0.54	0.38	0.28	-0.1	0.02	0.05	0.03	399.57	-0.2	131.17	4.52	27.83	87.41	135.23
2013/10/14	11:46	0.9	-0.53	0.36	0.28	-0.07	0.02	0.05	0.03	402.53	-0.2	136.12	4.29	27.46	87.56	153.42
2013/10/14	11:47	0.71	-0.53	0.39	0.29	-0.1	0.02	0.05	0.03	403.84 span	-0.2	123.17	4.15	27.46	87.19	197.3

SCOTT-MARRIN, INC.
6531 BOX SPRINGS BLVD. • RIVERSIDE, CA 92507
TELEPHONE (951) 653-6780 • FAX (951) 653-2430

Report Of Analysis
NIST-Traceable Gas Mixtures

ENMC01
TO: Envirmac Technology & Consultants Corp
Attn: Yvonne Nieh
5th Floor, No 2, Rueiguang Road
Taipei 114 Taiwan, ROC
(886) 227-948833

REPORT NO: 61522-07
REPORT DATE: July 16, 2012
CUSTOMER PO NO: SCO/120501

CYLINDER NUMBER: CB09847

COMPONENT	CONCENTRATION (v/v)	NIST TRACEABLE REFERENCE STANDARD
Carbon monoxide	2503 ± 25 ppmv	SRM 2637a
Methane	2519 ± 25 ppmv	Volumetric
Nitric oxide	25.74 ± 0.26 ppmv	SRM 2629a
NOx	25.74 ppmv	
Nitrogen dioxide	< 0.13 ppmv	
Sulfur dioxide	25.49 ± 0.25 ppmv	SRM 1693a
O2-free Nitrogen	Balance	

Cylinder Size: 150A (141 std cu ft)
Cylinder Pressure: 2000 psig
Shelf Life: 18 months

ppm = umole/mole % = mole-%

The above analyses are traceable to the National Institute of Standards and Technology by intercomparison with the reference standard listed herein. Where indicated, volumetric and gravimetric reference standards are traceable thru use of our analytical balance. NIST Certificate Numbers 822/272801-6 and 822/274081-06.

ANALYST: Mark Monson APPROVED:
M.J.Monson J. T. Marrin

The only liability of this company for gas which fails to comply with this analysis shall be replacement or reanalysis thereof by the company without extra cost.

STANDARD CALIBRATION GASES IN ALUMINUM CYLINDERS

瑩諮科技股份有限公司

行政院環境保護署許可證字號：環署環檢字第012A號
地 址：台北市內湖區瑞光路2號5樓　電 話：（02）2794-8833

水質水量樣品檢驗報告（行程編號：ELWA131004AE8）

計畫名稱：彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測
委託單位：創迅科技股份有限公司　　報告編號： EL02B1088
樣 品 別：海水　　採樣日期： 102 年10月13日
採樣單位：瑩諮科技股份有限公司　　收樣日期： 102 年10月14日
採樣地點：彰濱工業區外海　　報告日期： 102 年11月04日
連 絡 人： 賴 海 源

是否經認可	檢測項目	單位	樣品編號			檢驗方法	備註欄
			1088B01	1088B02	1088B03		
			南側（表層、底層混樣）	西側（表層、底層混樣）	北側（表層、底層混樣）		
			102.10.13 (14:10)	102.10.13 (15:30)	102.10.13 (16:10)		
			檢測值				
○	水溫	℃	27.5	27.6	27.3	NIEA W217.51A	—
	透明度	cm	80	80	70	NIEA E220.50C	—
○	溶氧	mg/L	6.3	6.4	6.5	NIEA W455.52C	—
	鹽度	psu	34.1	34.0	34.1	NIEA W447.20C	—
○	生化需氧量註6	mg/L	0.8	0.8	0.9	NIEA W510.55B	—
○	pH	—	8.0	8.0	8.1	NIEA W424.52A	—
○	銅	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	NIEA W308.22B/ NIEA W311.52C	0.00060
○	鋅	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.		0.00092
○	鉛	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.		0.00096
○	鎘	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.		0.00066
○	硒	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	NIEA W311.52C	0.0054
	鉻註5	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	NIEA W311.52C	0.0125
○	汞	mg/L	N.D.	N.D.	N.D.	NIEA W330.52A	0.000575
○	砷	mg/L	0.0037	0.0015	0.0013	NIEA W434.53B	0.00010

備註：
1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，簽署人：范玉瑋（ELI- 03 ）。
2、本報告共　頁，不得作為法律訴訟用，報告內容不得隨意複製或作為商業廣告之用。
3、檢測項目有標示"○"者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
4、低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
5、備註欄為QDL。
6、生化需氧量樣品經培養5天後，氧氣消耗量<2mg/L。

聲明書：
(一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：瑩諮科技股份有限公司
負責人(簽章)：楊炯浩
檢驗室主任(簽名蓋章)：

檢驗報告專用章
瑩諮科技(股)公司
負 責 人:楊炯浩
檢驗室主任:鐘美紅

水質採樣計畫書

委託編號:	ZL02B1088
檢測目的:	■定期檢測 □稽查檢測□申請許可□改善完成 □自行評鑑□ 其他

一、污染源基本資料

委託單位:創訊科技股份有限公司	聯絡人:	劉治桓	聯絡電話:	02-82217666#204
場所名稱:彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測	聯絡人:	張小姐	聯絡電話:	02-82217666#322
場所地址:彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測				

二、委託要求

採樣位置: 1 2 3

檢測項目: 所有檢測項目須置於4±2℃冷藏箱冷藏運送	保存方法:	容量與容器:
pH Temp 透明度 鹽度 DO	現場測定	
Cr Zn Cd Cu Se Pb	H	4LPE瓶
BOD	A	2LPE瓶
Hg As	H	1LPE瓶
保存液	A	100mLPE瓶

報告書 3 份		初勘日期:	102.10.13	採樣頻率: 1 次/月

註:(A)原樣品,(S)加硫酸pH<2,(H)加硝酸pH<2,(X)加1:1鹽酸pH<2,(P)加磷酸pH<2,(K)滅菌袋,(N)加NaOH,pH>12(B)抗壞血酸=維他命C (C)加鹽酸pH<2,(E)加去氯試劑,(G)加0.7mL濃硫酸及1mL疊氮化鈉溶液,(D)加1mL硫酸亞錳及1mL疊氮化鈉試劑

三、採樣一般事宜

出發日期:	102.10.13	採樣日期	102.10.13	樣品送達檢驗室日期:	102.10.13
參與採樣人員:	陳銘洲 張宇傑				
往返交通工具:	1370-EH			監督人員隨行:	■是 □否

四、採樣方法與器材

■採樣杓 ■定深(甘末爾)採水器 ■DO計 ■溫度計 ■pH計 ■導電度計 □氧化還原電位計
□濁度計 □沉水幫浦 □水位計 □延長線 ■清潔劑(刷) ■水桶 □繩子 ■手套
□塑膠布 □發電機 ■GPS □救生衣 □過濾裝置 □橡皮艇 □透視度計 ■透明度板
□濾紙 □貝勒管 □空壓機 □控制器 □_____ □_____ □_____ □_____ □_____

五、採樣順序

揮發性有機物 → 大腸桿菌群 → 溶解性氣體 → 半揮發性有機物 → 金屬 → 主要項目
溶氧 總有機碳 氰化物

品管負責人: 張宇傑 採樣小組負責人: 陳銘洲

瑩諮科技股份有限公司台北檢驗室 QR-BA-71

一般水質採樣前後準備工作檢查表

檢查日期: 102.10.13　　準備人員: [illegible]　　確認人員: 張[illegible]

一、文件資料

	前	後	
1	☑	☑	水質計畫書
2	☑	☑	水質現場採樣記錄表
3	☑	☑	一般水質採樣前後準備工作檢查表
4	☑	☑	現場採樣位置表
5	☑	☐	河川水質流速流量紀錄表
6	☑	☑	樣品及保存方式標籤
7	☑	☑	油性及水性筆
8	☑	☑	照相機
9	☑	☑	書寫板
10	☐	☐	_____

二、儀器設備

1 ☑ ☑ pH計 (7.0校正液編號: B14-600)
(4.0校正液編號: B15-600)
(10.0校正液編號: B13-600)
(7.0確認液編號: B14-601)
pH7.0校正時溫度℃為 27
pH4.0校正時溫度℃為 27
零點電位(m V)值為 -8.5 (應介於 -25～25之間)
斜率(m V/p H)為 -59.2 (應介於 -56～-61之間)
pH7.0確認值/溫度℃為 7.0/7.0 / 27.1/27.1
(確認值須符合7.0± 0.05)

☑ ☑ 功能確認正常

2 ☑ ☑ 溶氧計之滿點校正
空氣校正值為 7.80 mg/L
校正時溫度 27.5 ℃
飽和度 101.7 % (須符合101.7±1%)
斜率 0.71 (應介於0.6~1.25之間)

☑ ☑ 功能確認正常

3 ☑ ☑ 導電度計 (校正液編號: 1021013020)
0.01N氯化鉀溶液於25°C時值為
1413 μmho/cm，溫度為 27.0 ℃
(應介於1343~1483之間)

☑ ☑ 功能確認正常

4 ☑ ☑ 溫度計*1

5 ☐ ☐ 氧化還原電位計
ORP標準液校正讀值 _____ mV
標準液之氧化還原電位值 _____ mV
☐ ☐ 功能確認正常(誤差須符合ORP標準液校正讀值±3%)

6 ☑ ☑ 量杯 * 1 個

7 ☐ ☐ 流速計 * ___ 支
型號序號 _____ _____

8 ☐ ☐ 涉水裝 * ___ 件

9 ☑ ☑ 救生衣 * 2 件

10 ☑ ☑ 水桶 15 L * 1 桶
45 L * 1 桶
___ L * _____ 桶

11 ☐ ☑ 自來水 20L * 1 桶

12 ☑ ☑ 去離子水 20L * 1 桶

13 ☑ ☑ 廢液桶 20L * 1 桶

14 ☑ ☑ 帆布 5*5 1 件

15 ☐ ☑ 皮尺 * ___ 捲

16 ☑ ☑ 繩子 * 2 捲

17 ☑ ☑ 指北針與GPS * 1個

18 ☑ ☑ 拋棄式滴管

19 ☐ ☑ 測距槍 * 1組

20 ☑ ☑ 攪拌棒及擦拭紙

21 ☑ ☑ 廣用試紙

	前	後	
22	☐	☑	透視度計
23	☐	☐	透明度板
24	☐	☐	過濾裝置*1組
25	☑	☑	電磁攪拌器+磁石
26	☑	☑	12電池+110V轉換器
27	☐	☐	橡皮艇 * ___ 台
28	☐	☐	碼錶 * ___ 個
29	☐	☐	延長桿* * ___ 支
30	☐	☐	量筒 ___ mL* ___ 個
			量筒 ___ mL* ___ 個
31	☐	☐	_____
32	☐	☐	_____

三、採樣用具及容器

1	☑	☑	採樣杓 * 1 支
2	☑	☑	定深採樣器 * 1 瓶
3	☑	☑	4LPE瓶 * 2 瓶
4	☑	☑	2LPE瓶 * 2 瓶
5	☑	☑	1LPE瓶 * 2 瓶
6	☐	☐	___ L不透光PE瓶 * ___ 瓶
7	☐	☐	Oil瓶1L * ___ 瓶
8	☐	☐	TOC瓶100mL * ___ 瓶
9	☐	☐	大腸滅菌袋 * ___ 袋
10	☐	☐	VOC瓶40mL * ___ 瓶
11	☐	☐	褐色玻璃瓶(Svoc)1L* ___ 瓶
12	☐	☑	褐色玻璃瓶(酚)1L* ___ 瓶
13	☐	☐	BOD瓶300mL * ___ 瓶
14	☐	☐	0.5 LPE瓶 * ___ 瓶
15	☐	☐	0.3 LPE瓶 * ___ 瓶
16	☐	☐	0.25 LPE瓶 * ___ 瓶
17	☑	☑	0.1 LPE瓶 * 2 瓶
18	☐	☐	_____ * ___ 瓶

四、樣品保存劑

1	☐	☐	H_2SO_4
2	☑	☑	HNO_3
3	☐	☐	HCl
4	☐	☐	1:1 HCl
5	☐	☐	H_3PO_4
6	☐	☐	NaOH
7	☐	☐	去氯試劑
8	☐	☐	疊氮化鈉
9	☐	☐	抗壞血酸(維他命C)
10	☑	☑	冰塊
11	☑	☑	冰箱
12	☑	☐	餘氯試紙

五、安全設備

1	☑	☑	安全帽
2	☑	☑	工作服及安全鞋
3	☑	☑	警示標誌
4	☑	☑	尼龍手套
5	☑	☑	防酸手套
6	☑	☑	急救箱

六、品保與品管

1	☑	☑	設備空白 * 1 組
2	☑	☑	現場空白 * 1 組
3	☑	☑	運送空白 * 1 組
4	☐	☐	重複樣品 * ___ 組
5	☐	☐	_____

文件標題	水質現場採樣記錄表						
使用單位	瑩諮科技股份有限公司台北檢驗室			核准人	賴海源	頁次	1/1
資料類別	採樣記錄表			審核人	胡　欣	文件編號	QR-BA-56
修訂日期	100.03.04	生效日期	100.05.23	撰寫人	何致民	版次	1.6

水質現場採樣記錄表

委託廠商	創訊科技股份有限公司	採樣日期	102.10.13
採樣位置	如下所示	採樣人員	李銘洲、張宇深
大氣溫度℃	28.4	濕度%	77
天氣狀況	☑晴 ☐陰 ☐雨	大氣壓力mmHg	758

採樣點	現場編號	採樣時間	採樣體積(mL)	pH	Temp (℃)	DO (mg/L)	大氣壓力(mbar) / 飽和度(%)	鹽度(PSU)	透明度(m)	透視度(cm)	EC	採樣深度(m)	備註
設自	1088B 05-E	1740	7000 ml								☐μmho/cm ☐mmho/cm		1m以下採樣 ~~0.5m~~ and 底+1.0m
點1 (南側)	1088B 01	1410	7100 ml	8.03 / 8.03	27.5 / 27.5	6.57	1010 / 104.3	24.1	0.8		☐μmho/cm ☐mmho/cm		
點2 (西側)	1088B 02	1530	7100 ml	7.98 / 7.98	27.6 / 27.6	6.50	1010 / 103.8	24.0	0.8		☐μmho/cm ☐mmho/cm		
點3 (北側)	1088B 03	1610	7100 ml	8.06 / 8.06	27.7 / 27.7	6.52	1010 / 104.0	24.1	0.7		☐μmho/cm ☐mmho/cm		
現自	1088B 04-F	1610	7000 ml								☐μmho/cm ☐mmho/cm		
運自	1088B 06-T		7000 ml								☐μmho/cm ☐mmho/cm		
											☐μmho/cm ☐mmho/cm		
											☐μmho/cm ☐mmho/cm		
											☐μmho/cm ☐mmho/cm		
											☐μmho/cm ☐mmho/cm		

水質採樣現場儀器使用校正記錄表

使用校正日期: 102.10.13　　使用人員: [illegible]

儀器序號: pH計 09909275　導電度計 09260602　溶氧計 10031211　ORP計 *

pH校正液編號: 4.0校正液: B15-600　7.0校正液: B14-600　10.0校正液: B13-600　7.0確認液: B14-601

0.01N 氯化鉀編號: 10210130201

採樣點: 點1 (南側)

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 28.4　零點電位(mV) -8.9 (應介於-25~25之間) pH4.0溫度℃為 28.4　斜率(mV/pH) -59.2 (應介於-56~-61之間) pH10.0溫度℃為 28.4 pH7.0確認值/溫度℃為 7.0/7.0 / 28.4/28.4 (確認值須符合7.0±0.05)
導電度計	儀器校正值為 1413 (應介於1343~1483之間)　溫度(℃)為 28.4
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 7.93　校正時溫度(℃)為 28.1 飽和度(%) 101.8 (須符合101.7±1%)　斜率 0.7 (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 ___ mV　儀器校正值為 ___ mV 溫度(℃)為 ___ (誤差須符合ORP標準液校正讀值±3%)

採樣點: 點2 (西側)

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 28.3　零點電位(mV) -8.7 (應介於-25~25之間) pH4.0溫度℃為 28.3　斜率(mV/pH) -59.3 (應介於-56~-61之間) pH10.0溫度℃為 28.3 pH7.0確認值/溫度℃為 7.0/7.0 / 28.3/28.3 (確認值須符合7.0±0.05)
導電度計	儀器校正值為 1413 (應介於1343~1483之間)　溫度(℃)為 28.3
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 7.92　校正時溫度(℃)為 28.2 飽和度(%) 101.9 (須符合101.7±1%)　斜率 0.7 (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 ___ mV　儀器校正值為 ___ mV 溫度(℃)為 ___ (誤差須符合ORP標準液校正讀值±3%)

採樣點: 點3 (北側)

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 28.2　零點電位(mV) -8.8 (應介於-25~25之間) pH4.0溫度℃為 28.2　斜率(mV/pH) -59.5 (應介於-56~-61之間) pH10.0溫度℃為 28.2 pH7.0確認值/溫度℃為 7.0/7.0 / 28.2/28.2 (確認值須符合7.0±0.05)
導電度計	儀器校正值為 1413 (應介於1343~1483之間)　溫度(℃)為 28.2
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 7.90　校正時溫度(℃)為 28.1 飽和度(%) 102.0 (須符合101.7±1%)　斜率 0.7 (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 ___ mV　儀器校正值為 ___ mV 溫度(℃)為 ___ (誤差須符合ORP標準液校正讀值±3%)

採樣點: ___

儀器名稱	儀器校正
pH計	pH7.0溫度℃為 ___　零點電位(mV) ___ (應介於-25~25之間) pH4.0溫度℃為 ___　斜率(mV/pH) ___ (應介於-56~-61之間) pH10.0溫度℃為 ___ pH7.0確認值/溫度℃為 ___ / ___ (確認值須符合7.0±0.05)
導電度計	儀器校正值為 ___ (應介於1343~1483之間)　溫度(℃)為 ___
DO計	溶氧計之滿點校正空氣校正值為 ___　校正時溫度(℃)為 ___ 飽和度(%) ___ (須符合101.7±1%)　斜率 ___ (應介於0.6~1.25之間)
ORP計	ORP標準液值 ___ mV　儀器校正值為 ___ mV 溫度(℃)為 ___ (誤差須符合ORP標準液校正讀值±3%)

附錄四、監測照片

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年十月份監測作業現場照片(空氣)

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

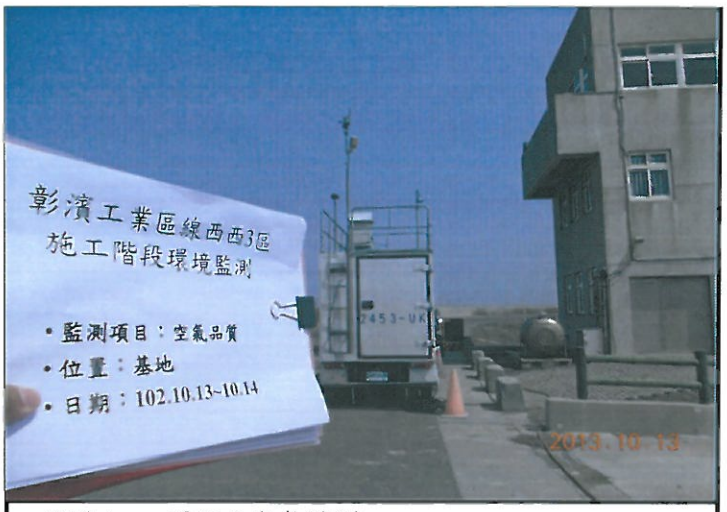

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年十月份監測作業現場照片(空氣)

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

說明：　項目：空氣監測
日期：102.10.13~10.14
地點：基地

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年十月份監測作業現場照片(海水)

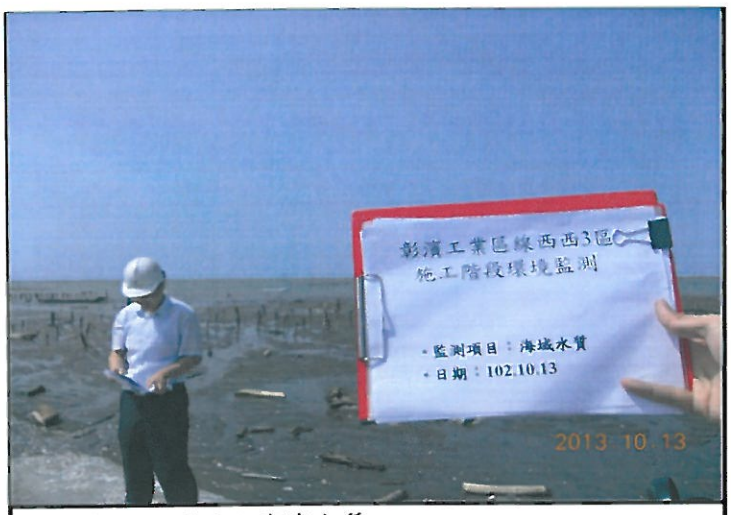

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13
地點：測站1

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13
地點：測站1

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13
地點：測站2

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13
地點：測站2

彰濱工業區線西西3區施工階段環境監測

一〇二年十月份監測作業現場照片(海水)

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13
地點：測站3

說明：　項目：海域水質
日期：102.10.13
地點：測站3

附錄五、歷次環保機關審查意見及辦理情形說明對照表

A5.1 101 年第 2~4 季彰化縣環境保護局審查意見暨回覆辦理情說明(102.03.27)

A5.2 102 年第 1 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理情說明(102.06.05)

A5.3 102 年第 2 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理情說明(102.08.30)

A5.4 102 年第 3 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理情說明(102.11.25)

A5.1 101 年第 2~4 季彰化縣環境保護局審查意見暨回覆辦理情説明

(102.03.27)

電子公文　檔　號：
保存年限：

彰化縣環境保護局 函

地址：50057彰化市健興路1號2樓
承辦人：何奇?
電話：04-7115655-112
傳真：04-7119828
電子信箱：paperiso@chcpb.gov.tw

受文者：經濟部工業局
發文日期：中華民國102年3月27日
發文字號：彰環綜字第1020011761號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：檢送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析施工期間（101年第2季至第4季）環境監測報告」相關意見，請 查照。

說明：

一、依據 大局102年3月6日工地字第10200203890號函辦理。

二、所送101年第2-4季環境監測報告，附錄一所附之環境檢驗測定機構許可證已逾期，請於下一季提送報告時一併更新。

正本：經濟部工業局
副本：行政院環境保護署、本局綜合計畫科
電子公文交換戳記

102.03.27 一般公文
1020203120

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告
101年度第2季~第4季報告(101年4月~101年12月)

環保局審查意見	開發單位辦理情形說明
1.所送101年第2~4季環境監測報告，附錄一之環境檢驗測定機構許可証已逾期，請於下一季提送報告時一併更新。	1.遵照辦理，相關資料請參閱附錄一。

A5.2 102 年第 1 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理情説明

(102.06.05)

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告
102年第1季監測報告(102年1月~102年3月)

行政院環境保護署審查意見	開發單位辦理情形說明
1.報告附錄三、品保/品管查核紀錄與原始數據之空氣檢測項目部份缺TSP的採樣及校正紀錄；另採樣過程中使用之儀器設備(如風速風向計、校正流量計等)之校正紀錄未附，請補正說明。	1.遵照辦理，相關資料已補充於附錄三。
2.建議第1-10頁表1.5.3-1增列「感應耦合電漿原子發射光譜儀」之校正維護項目及頻率。	3.遵照辦理，相關資料已補充於CH1.5.3；表1.5.3-2(P.1-12)。

電子公文　檔　號：
保存年限：

行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：涂邑靜
電話：(04)2252-1718 #123
傳真：(04)22591636
電子郵件：mitui@epa.gov.tw

受文者：經濟部工業局
發文日期：中華民國102年5月28日
發文字號：環署督字第1020044676號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：(　　)
附件：

主旨：貴局所送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間102年第1季監測報告」，本署審核意見，請 查照辦理。

說明：

一、依據 貴公司102年5月8日工地字第10200390060號函辦理。

二、本署審核意見如下：

(一)報告附錄三、品保/品管查核紀錄與原始數據之空氣檢測項目部分缺TSP的採樣及校正紀錄；另採樣過程中使用之儀器設備（如風速風向計、校正流量計等）之校正紀錄未附，請補正說明。

(二)第1-57頁（三）儀器維修校正項目及頻率1.多點校正即零點及3?5點高濃度校正，不符合本署公告之檢測方法。

(三)建議第1-10頁表1.5.3-1增列「感應偶和電漿園子發射光譜儀」之校正維護項目與頻率。

三、上開意見，請 貴局於本案下次監測報告中說明辦理情形。

正本：經濟部工業局
副本：

??? 2013/5/31
10200462270

經濟部工業局　函

地址：106臺北市信義路三段41-3號
聯絡人：　洪豪男
聯絡電話：02-27541255 分機2567
電子郵件：hnhorng@moeaidb.gov.tw
傳真：02-23255455

受文者：台灣電力股份有限公司
發文日期：中華民國102年6月5日
發文字號：工地字第10200462330號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：有關行政院環境保護署函送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間102年第1季監測報告審查意見勘誤表一案，請配合更正，請 查照。

說明：

一、依據行政院環境保護署102年5月30日環署督字第1020045190號函辦理。

二、隨文檢附上開來函及勘誤表各1份。

正本：台灣電力股份有限公司
副本：經濟部工業局彰濱工業區服務中心、中華工程股份有限公司、中興工程顧問股份有限公司、本局產業園區發展推動辦公室(合美)(均含附件)

行政院環境保護署公文勘誤表

日期	102 年 5 月 28 日
文別	函
發文字號	環署督字第 1020044676 號函（「彰化濱海工業區開發計畫線西西 3 區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間 102 年第 1 季監測報告審查意見）
原文	**說明：二、本署審核意見如下：** （一）報告附錄三、…。 （二）第 1-57 頁（三）儀器維修項目及頻率 1.多點校正及零點及 3～5 點高濃度校正，不符本署公告之檢測方法。 （三）建議第 1-10 頁…。
更正內容	**說明：二、本署審核意見如下：** （一）報告附錄三、…。 （二）建議第 1-10 頁…。
備註	

請　查照惠予更正

此致

A5.3 102 年第 2 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理情説明

(102.08.30)

檔　　號：
保存年限：

行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：涂邑靜
電話：(04)2252-1718 #123
傳真：(04)22591636
電子郵件：mltui@epa.gov.tw

受文者：經濟部工業局

發文日期：中華民國102年8月30日
發文字號：環署督字第1020075200號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：(　　)
附件：

主旨：貴局所送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析報告」施工期間102年第2季監測報告，本署審核意見，請 查照辦理。

說明：

一、依據 貴局102年7月23日工地字第10200602430號函辦理。

二、本署審核意見為：請依NIEA W447.20C增列第1-13頁表1.5.4-2鹽度分析項目的重複分析品管範圍。

三、上開意見，請 貴局於本案下次監測報告中說明辦理情形。

正本：經濟部工業局
副本：

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告
102年第2季監測報告(102年4月~102年6月)

行政院環境保護署審查意見	開發單位辦理情形說明
1.請依 NIEA W447.20C 增列第 1-13 項表 1.5.4-2 鹽度分析項目的重複分析範圍。	1.遵照辦理，相關資料已補充於 CH1.5.4；表 1.5.4-2(P.1-13)。
2.上開意見，請 貴局於本案下次監測報告中說明辦理情形。	2.遵照辦理，相關資料已補充於 CH1.5.4；表 1.5.4-2(P.1-13)。

A5.4 102 年第 3 季行政院環境保護署審查意見暨回覆辦理情説明

(102.11.25)

檔　　號：
保存年限：

行政院環境保護署 函

地址：10042 臺北市中正區中華路1段83號
聯絡人：涂邑靜
電話：(04)2252-1718 #123
傳真：(04)22591636
電子郵件：mltui@epa.gov.tw

受文者：經濟部工業局

發文日期：中華民國102年11月25日
發文字號：環署督字第1020101964號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：(　　)
附件：

主旨：貴局所送「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間（102年第3季），本署審核意見，請 查照辦理。

說明：

一、依據 貴局102年10月30日工地字第10200882940號函辦理。

二、本署審核意見如下：

(一)表1.3-1、表1.5.1-1及附錄二分析方法標註為SO2：NIEA A416.11C及CO：NIEA A421.11C，惟其監測日期為102年7月29至30日，請確認。

三、上開意見，請 貴局於本案下次監測報告中說明辦理情形。

正本：經濟部工業局
副本：

??? 102/11/28

「彰化濱海工業區開發計畫線西西3區部分土地新增工程填地料源環境影響差異分析」施工期間環境監測報告
102年第3季監測報告(102年7月~102年9月)

行政院環境保護署審查意見	開發單位辦理情形說明
1.表 1.3-1、表 1.5.1-1 及附錄二分析方法標註為 SO_2：NIEA A416 11C 及 CO：NIEA A521.11C，惟其間測日期為 102 年 7 月 29 日至 30 日，請確認。	1.謝謝指導，二氧化硫(SO_2)及一氧化碳檢測方法已修正為 NIEA A416.12C 及 NIEA A421.12C，相關資料請參閱 CH1.3；表 1.3-1(P.1-4)、CH1.5.4；表 1.5.4-1(P.1-13)及附錄二。
